

2.2. Darbų atlikimo terminai	2.2.1. Darbų pradžia	Nuo sutarties pasirašymo datos
	2.2.2. Darbų atlikimo terminas	Ne vėliau kaip per 6 (šešias) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
	2.2.3. Termino pratęsimas	<i>Iki 2(dviejų) savaičių; papildomų darbų atsiradimo atveju – pagrįstam, abiejų Šalių suderintam terminui.</i>
	2.2.4. Nepriklausančios nuo Vykdytojo termino pratęsimo aplinkybės	- klimato sąlygos, dėl kurių neįmanoma tęsti darbų; - dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas; - Užsakovo, Užsakovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Vykdytojas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; - papildomų darbų, be kurių neįmanoma užbaigti Sutarties būtinybė Vykdytojas turi teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymai pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Vykdytojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti. Kiekvienu tokiu atveju, Vykdytojas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aplinkybių atsiradimo apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas.
2.3. Darbų apimtis	2.3.1. Darbų apimtis ir reikalavimai	Nurodyta Sutarties 1 priede Vykdytojas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui įkainotą Kiekių žiniaraštį.
	2.3.2. Papildomi/atsisakomi darbai	Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridėdant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą. Šalys įformins tokių darbų pirkimą/atsisakymą Sutarties rašytiniu susitarimu. Papildomi (atsisakomi) darbų kiekiai, neviršijantys 5(penkių) proc. nuo Kiekio žiniaraštyje nurodytų kiekių nebus laikomi papildomais (atsisakomais) darbais.
2.4. Kaina ir apmokėjimas	2.4.1. Kainodara	Fiksuota kaina.
	2.4.2. Pradinės sutarties vertė, Eur be PVM	79 059,46 (septyniasdešimt devyni tūkstančiai penkiasdešimt devyni eurai 46 ct)
	2.4.3. Sutarties kaina, Eur su PVM	95 661,95 (devyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras 95 ct)
	2.4.4. PVM, 21%	16 602,49 (šešiolika tūkstančių šeši šimtai du eurai 49 ct)
	2.4.5. Darbų įkainiai	Vykdytojas pateikia įkainotą darbų sąrašą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
	2.4.6. Papildomos išlaidos	Į sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir Vykdytojas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio susitarimo.
	2.4.7. Kainos peržiūros taisyklės ne dėl PVM keitimo.	Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.
	2.4.8. Išankstinis mokėjimas	NETAIKOMA
	2.4.9. Atvirkštinis PVM mokėjimo būdas	Taip

2.5. Kitos sąlygos	2.5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas	NETAIKOMA
	Subtiekimas	Nėra. Subtiekėjų pasitelkimas ar keitimas tik su Pirkėjo rašytiniu suderinimu
	2.5.2. Delspinigiai	0,05 proc. nuo pradinės sutarties vertės (arba nuo sutarties kainos be PVM, priklausomai nuo to, kuri yra didesnė) už kiekvieną pavėluotą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus dieną, neviršijant 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos be PVM.
	2.5.3. Specialieji reikalavimai (aplinkosauginiai, personalo apmokymas ir kt.)	Vykdytojas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Prieš darbų pradžią Vykdytojas pateikia atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas arba kitus Vykdytojo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad Vykdytojo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
2.6. Sutarties priedai	Priedas Nr. 1 – UAB „Progresyvūs projektai“ supaprastintas statinio projektas 24.02.23-SPP, byla II (Statinio projekto dalis: drenažo tinklai); Kiekių žiniaraštis Priedas Nr. 2 –Vykdytojo pasiūlymas Pirkimui Nr.728719; Priedas Nr. – 3 Įkainotas Kiekių žiniaraštis.	

BENDROJI DALIS

I. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

- 1.1. Darbai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir apimtį (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas).
- 1.2. Vykdytojas suteikia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir CK numatytą atliktų Darbų garantiją.
- 1.3. Vykdytojas privalo atlikti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.
- 1.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Vykdytojas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Vykdytojas atlieka savo sąskaita.
- 1.5. Darbai laikomi baigtais, kai Vykdytojas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo.
- 1.6. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Vykdytojas prieš 3 (tris) darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Vykdytojo pranešimo gavimo dienos ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

II. APMOKĖJIMO TVARKA

- 2.1. Vykdytojas sąskaitą-faktūrą ir darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktą pateikia naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).
- 2.2. Užsakovas už laiku ir kokybiškai atliktus Darbus sumoka Vykdytojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo abiejų Šalių atliktų darbų akto pasirašymo dienos pagtal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą

III. ŠALIŲ PAREIGOS

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.1.2. Iki Darbų pradžios pranešti Užsakovui subtiečių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat apie naujus subtiečius, jei jie bus pasitelkti vėliau.

3.1.3. Atliekant darbus naudoti savo medžiagas, darbo įrankius ir mechanizmus bei vadovautis darbų darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimais, atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei savo sąskaita išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

3.1.4. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje ar kitoje dokumentacijoje, bei teikti siūlymus jiems išvengti.

3.1.5. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės laiku atlikti Darbų, raštiškai informuoti Užsakovą, nurodant konkrečias priežastis bei Darbų atlikimo terminų pažeidimo priemones.

3.1.6. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų perdavimo-priėmimo datą bei pateikti darbų atlikimo dokumentaciją.

3.1.7. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.1.8. Pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties neatitinkančią statomo (remontuojamo) objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę.

3.1.9. Užtikrinti saugų Darbų vykdymą.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Perduoti Vykdytojui patalpas (statybvię) bei informaciją ir/ar dokumentus Darbams atlikti bei bendradarbiauti Sutarties vykdymo metu.

3.2.2. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Vykdytojui pašalinti defektus.

3.2.3 Po darbų atlikimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo sumokėti Vykdytojui už Darbus.

3.3. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

3.4. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

IV. ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Jei Tiekėjas vėluoja atlikti darbus ar ištaisyti jų trūkumus / defektus per Sutartyje nustatytus terminus, nuo kitos kalendorinės dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai (dydis nurodytas Sutarties Specialiojoje dalyje) nuo sutarties kainos su PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
- 4.2. Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą sąskaitą faktūrą, neatsiskaito už visiškai atitinkančias Sutartyje nurodytus reikalavimus, kokybiškas ir laiku pristatytas bei priimtas Prekes per Sutartyje nustatytą terminą, nuo kitos kalendorinės dienos skaičiuojami delspinigiai (dydis nurodytas Specialiojoje dalyje) nuo nesumokėtos sumos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
- 4.3. Nustatoma Šalies maksimali mokėtinų netesybų, nustatytų Sutarties Specialios dalies 4 skyriuje, riba – 10 % (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos be PVM. Nurodyta suma neapima nuostolių atlyginimo ir trečiųjų šalių pritaikytų sankcijų

vertės. Šalies delspinigių sumą išskaičiuojama iš kitos Šalies mokėtinų sumų ir (ar) priskaičiuoti nuostoliai turi būti sumokėti kitai Šaliai per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Ribos pasiekimas yra pagrindas vienašališkam Sutarties nutraukimui.

- 4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
- 4.5. Jei Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Pirkėjui, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.
- 4.6. Tiekėjas visais atvejais atsako už Prekių pristatymo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Pirkėjui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.
- 4.7. Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimą Tiekėjui, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti.

V. KITOS SĄLYGOS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalių visų įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
- 5.3. Sutarties keitimai įforminami raštišku Šalių susitarimu vadovaujantis VPI 89 str. nuostatomis.
- 5.4. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.
- 5.5. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus kai konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai pareikalauja Valdžios institucija.
- 5.6. Sutartis gali būti nutraukta:
 - 5.6.1 abipusiu šalių susitarimu;
 - 5.6.2. vienašališkai dėl kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymo, įspėjus kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų.
- 5.7. Vykdytojas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Vykdytojas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.8. Dėl šios sutarties kilę ginčai sprendžiami abiejų Šalių derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.9. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

VI. ŠALIŲ PARAŠAI

Užsakovas
Klaipėdos E.Galvanausko PMC
Direktorė Dalia Martišauskienė

Vykdytojas
Projektų vadovas Arminas Ivanauskas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

Įmonės registracijos adresas: Turgaus a.2, Klaipėda. Buveinės adresas: Šilutės pl.103-219, Klaipėda
Įm. kodas 140216537. PVM kodas LT402165314. Tel. +370 46 344659; el. paštas info@ivro.lt

Klaipėdos E. Galvanausko PMC

PASIŪLYMAS

DĖL DRENAŽO TINKLŲ REMONTO DARBŲ

2024-07-12 Nr. IVRO 24/07-12-02

Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas	UAB „IVRO“
Tiekėjo adresas	Šilutės pl. 103 – 219, Klaipėda
Tiekėjo juridinio asmens kodas	140216537
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (jei taikoma)	LT402165314
Tiekėjo asmens, kuris pasirašys sutartį, pareigos, vardas ir pavardė (jei sutartį pasirašo ne Tiekėjo vadovas, įgaliojimo data ir Nr. , jei taikoma)	Projektų vadovas Arminas Ivanauskas Įgaliojimas 2023-12-29 Nr. 23/12-29-01 (pridedamas)
Tiekėjo atsiskaitomos sąskaitos Nr., Banko rekvizitai	LT20 7300 0100 3819 3834, AB SWEDBANK, Banko kodas 73000
El. pašto adresas	info@ivro.lt
Tiekėjo atsakingo už sutarties vykdymą asmens vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas	Statybos darbų vadovas Kęstutis Vaitkus +370 657 98631, kestutis@ivro.lt Projektų vadovas Arminas Ivanauskas +370 699 86011, arminas@ivro.lt

Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija:	Projektų vadovas Arminas Ivanauskas
Telefono numeris	+370 699 86011
El. pašto adresas	arminas@ivro.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą (ar kvietime pateikti pasiūlymą);
- 2) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti.

Teikiame savo pasiūlymą:

	Darbų pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
1.	Drenažo tinklų remontas	79059,46
	Iš viso	79059,46
	PVM, 21 %	16602,49
	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM	95661,95

Pasiūlymo kaina su PVM: Devyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras 95 ct., PVM sudaro Šešiolika tūkstančių šeši šimtai du eurai 49 ct.

ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 2229/1

Išduotas

UAB „IVRO“

Šilutės pl. 103-320, LT-95112 Klaipėda

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės kokybės vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.


Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Ivro“ direktoriaus įsakymas 2016-02-08/Nr.1
„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;
Pirminis atitikties įvertinimas 2016-02-15;
UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2022-02-14 Nr. 1
Sertifikatas galioja iki 2025-03-02
Išdavimo data 2022-03-02

Isolita ISO 9001

Direktorius

Marius Tamoševičius



UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

. Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2229/2

Išduotas

UAB „IVRO“

Šilutės pl. 103-320, LT-95112 Klaipėda

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Ivro“ direktoriaus įsakymas 2016-02-08/Nr.1
„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;
Pirminis atitikties įvertinimas 2016-02-15;
UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2022-02-14 Nr. 1
Sertifikatas galioja iki 2025-03-02
Išdavimo data 2022-03-02

Isolita ISO 14001

Direktorius
Marius Tamoševičius



UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

. Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2229/3

Išduotas

UAB „IVRO“

Šilutės pl. 103–320, LT-95112 Klaipėda

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai.


Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Ivro“ direktoriaus įsakymas 2016-02-08/Nr.1
„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;
Pirminis atitikties įvertinimas 2016-02-15;
UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2022-02-14 Nr. 1
Sertifikatas galioja iki 2025-03-02
Išdavimo data 2022-03-02

Isolita ISO 45001

Direktorius

Marius Tamoševičius



UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61–806, Kaunas.

. Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

Drenažo tinklų remonto darbų
DARBŲ APIMTIES KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Grindų ardymas, drenažo įrengimas	Mato vnt.	Kiekis
Grindų ardymas	m ²	230
Lentinių grindų ardymas	m ²	30.68
Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m ³	140.71
I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100 m ³	0.692
Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 3 kartus k9=1.15	m ²	128.89
Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m ³	80.74
Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais	m ³	23.068
I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis / smėlį, skaldą / k8=1.14, k9=1.15	100 m ³	1.1903
Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 50.00 mm	100 m ²	2.3068
Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.8535
Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę / garo izoliacija /	100 m ²	2.3068
Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 160.00 mm	100 m ²	2.3068
Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS)	m ³	38,016
Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m ²	2.3068
Armuotų betoninių grindų įrengimas šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 120.00 mm	100 m ²	2.3068


Smulkioms sudėtingoms monolit. k-joms klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų, kai išskleisto klojinio plotas iki 2m ² k ₉ =1.15	m ²	35.0
Betoninių grindų armavimas tinklais k ₈ =1.12	t	3.414
Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm 100m ² storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m ²	2.3068
Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 3 kartus k ₉ =1.15	m ²	22.66
Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100 m	0.3852
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	271.5
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k ₄ =10.0	t	271.5
Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m ² uždengto ploto) / esama įranga, langai, durys, kt.	100 m ²	3.0
Drenažas		
II grupės grunto kasimas 0.25m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k ₉ =1.15	m ³	0.0839
II grupės grunto kasimas 0.25m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k ₉ =1.15	m ³	0.061
Grunto kasimas rankiniu būdu k ₉ =1.15	m ³	16.1
Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m ³	4.0
I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k ₈ =1.14, k ₉ =1.15	100 m ³	0.05
Geotekstilės paklojimas k ₉ =1.15	100 m ²	1.21

Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k3=0.0, k9=1.15	m	121.0
PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su m geotekstilės filtru 113/126	m	122.21
110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100 m	0.2
PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 vnt (išor. nuotek.)	vnt.	20.0
Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	56.0
PVC alkūnės d 110x 45` (vid. nuotek. Optima)	vnt.	24.0
PVC trišakiai d 110/110x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt.	4.0
PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt.	12.0
Drenažinio vamzdžio perėjimas į lygias. vamzdį 128/110mm (dren. vamz.sist.)	vnt.	16.0
Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m ³	14.0
Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m ³	43.0
I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis / žvyras, skalda /	100 m ³	0.7082
Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m ³	16.1
Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m ³	0.839
I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100 m ³	1.0
Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (Šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600mm)	vnt.	2

SKELBIAMA APKLAUSA
PASTATO LELIJŲ G. 5, KLAIPĖDA DRENAŽO TINKLŲ REMONTO DARBAI
PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS
2024-07-08

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina/patikslina pirkimo sąlygas:

Nr .	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos paaiškinimas
1.	ar teisingai nurodyti mato vienetai / kiekiai šiose žiniaraščio "Drenažas" eilutėse? Drenažas II grupės grunto kasimas 0.25m3 m 0.08 kaušo talpos ekskavatoriais, 3 39 suverčiant į sankasą k9=1.15 II grupės grunto m 0.0 kasimas 0.25m3 3 61 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9 =1.15 Jeigu gruntas pakraunamas į savivarčius, tai jis turėtų būti išvežamas. Nurodykite atstumą.	Patiksliname: mato vieneta t. m³. Kiekiai nurodyti teisingi 1 Drenažas 1 N1-25 II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo t. m3 talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15 2 N1-75 II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo t. m3 talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 Netinkamo grunto išvežimu rūpinasi ir apskaičiuoja pats tiekėjas.
2.	1) pirkimo sąlygų p. 2.1 nurodote, kad perkami drenažo tinklų remonto darbai (be apdailos darbų). Pateiktame darbų apimties žiniaraštyje pateikti ir apdailos darbų kiekiai, ir drenažo kiekiai. Paaiškinkite, kurių iš žiniaraščio 1 skyriuje "Grindų ardymas, drenažo įrengimas" pateiktų apdailos darbų tiekėjas turėtų nevertinti savo pasiūlyme. 2) Konkurso sąlygose nurodyta, kad darbus vertinti pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį (pirkimo sąlygos 2.2 punktą). Pateiktame žiniaraštyje nėra įvertinta grindų apdailos kiekiai.	Pateiktame kartu su Pirkimo sąlygomis Projekte yra 2 dalis: DRMC apdailos darbai ir DRMC drenažo tinklai. Didžioji dalis apdailos darbų, nurodytų faile DRMC apdailos darbai neperkama šiuo pirkimu. Pasiūlyme turi būti įvertinti apdailos darbai, kurie nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje. Taip pat Tiekėjai turi apskaičiuoti pasiūlymo kainoje ir tuos atstatomus apdailos darbus, kurie gali atsirasti drenažo tinklų įrengimo metu. <i>Pvz. jei bus reikalinga išgriauti dalį sienos (grindų), numatyti jų atstatymo apdailos darbus toje apimtyje, kuri bus pažeista įrengimo metu.</i>

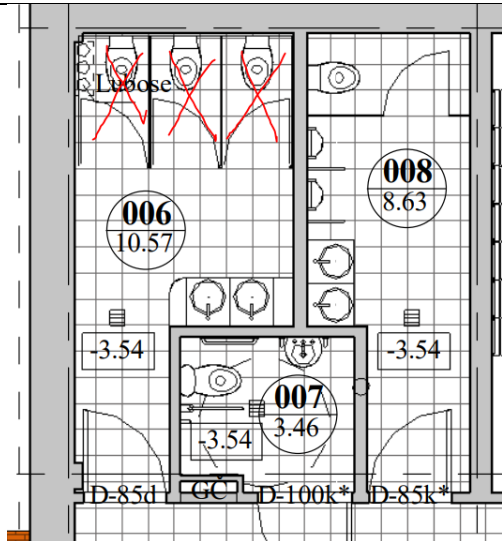	Patikslinkite ar reikia vertinti apdailą, ir jeigu taip, kokią ir kiek m2.	
3.	1. Eilutėje neteisingai nurodytas mato vienetas - turėtų būti 100 m3. I-II grupės grunto tankinimas 100 0.05 vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15 m²	Taip, taisoma techninė klaida. 8 N1-381-1 I-II grupės grunto tankinimas 100m3 vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15
4	Supaprastinto projekto DRMC drenažo tinklai žiniaraštyje poz. Nr. 9 nurodoma, kad tranšėjos užpilamos gamtiniu smėliu (161 m3), o konkursiniame žiniaraštyje užpylimo medžiaga nepaminėta (ir užpylimo kiekis tik 100 m3): Tranšėjų ir duobių užpylimas m³ 16.1 rankiniu būdu k9=1.15 Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15 100 0.839 m³ Paišykite neatitikimus.	Pasiūlyme turi būti apskaičiuoti visi DRMC drenažo tinklai projekte nurodyti medžiagų kiekiai.
5	Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje poz. Nr. 12 nurodoma nuimti ir atstatyti esamus sanitarinius prietaisus (1 kompl.). Detalizuokite, kiek ir kokių sanitarinių prietaisų reikės nuimti ir atstatyti.	 Pridedamas patalpų planas. Raudona spalva perbraukti klozetai yra jau demontuoti.

SKELBIAMA APKLAUSA
PASTATO LELIJŲ G. 5, KLAIPĖDA DRENAŽO TINKLŲ REMONTO DARBAI
PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS-2

2024-07-08

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina/patikslina pirkimo sąlygas:

Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos paaiškinimas
1.	Darbų apimtys žiniaraštyje nurodyta: Grindų ardymas 230 m ² , Lentinių grindų ardymas 30,68 m ² , o projekto kiekių žiniaraštyje ardomas grindų kiekis nurodytas 230,68 m ² . Prašome patikslinti kiek m ² grindų išardyti.	Ardomos grindys: 230 m ² – betoninių grindų ardymas 30,68 m ² – lentinių grindų (scena) ardymas
2.	Projekto medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodyta rostverko teptinė hidroizoliacija 128,89 m ² , darbų apimtys kiekių žiniaraštyje 5 eilutė teptinės hidroizoliacijos įrengimas nurodyta 128,89 m ² . Pagal pateiktą brėžinį įrengiamos izoliacijos aukštis gaunasi apie 1,2 m ² , o pagal pateiktą kiekį žiniaraščiuose gaunasi 1 m ² . Prašome patikslinti kiekį.	Aukštis skaičiuojamas pagal brėžinį.
3.	Projekto medžiagų kiekių žiniaraštyje numatytos grindų dangos, tačiau darbų apimtys kiekių žiniaraštyje jų numatyta nėra. Ar tikrai nevertinti grindų dangų įrengimo?	Grindų dangų įrengimo vertinti nereikia.
