

Priedas Nr.2 prie 202_ m.
_____d. statybos
rangos sutarties Nr. _____

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.
už 20.. m. mėn.

Rangovas:
Užsakovas:
Sutarties Nr.:
Statybos pavadinimas:
Darbų pavadinimas (žiniaraštis):

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios			Per ataskaitini mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kieks	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Vnt. kaina	Viso
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
Iš viso be PVM											
PVM 21%											
Iš viso su PVM											

Priėmė:
Užsakovas:
Pareigos, V. Pavardė, parašas
20.. m. _____ mėn. ____ d.

A. V.

Perdavė:
Rangovas:
Pareigos, V.
20.. m. _____ mėn. ____ d.

A. V.

Suderinta:
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)
20.. m. _____ mėn. ____ d.

Atliktų Statybos darbų aktas pasirašomas išimtinai tik apmokėjimo tikslais ir tokio akto pasirašymas nelaikomas galutiniu kokybės patikrinimu ar atitinkamų Statybos darbų perdavimu Užsakovui

Priedas Nr.3 prie 202_ m.
_____d. statybos rangos
sutarties Nr. _____

UŽSAKOVAS: _____
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS: _____
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
PAŽYMA Nr. ____
20.. m. _____ mėn.

STATYBOS PAVADINIMAS: _____
(Statybos pavadinimas, adresas)

RANGOS SUTARTIS: _____
(Sutarties Nr., sudarymo data)

RANGOS SUTARTIES TERMINAI: _____
(Darbų pradžia, darbų pabaiga)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina (Eur)	Įvykdymas %	Įvykdytų darbų vertė nuo statybų pradžios			Įvykdytų darbų vertė nuo metų pradžios			Per ataskaitinį mėnesį		
				Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)	Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)	Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
	IS VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Viso apmokėti (suma žodžiais):

UŽSAKOVAS: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
20.. m. _____ mėn. ____ d.
A.V.

RANGOVAS: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
20.. m. _____ mėn. ____ d.
A.V.

SUDERINTA:
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)
20.. m. _____ mėn. ____ d.
A.V.

Skvero Jeruzalėje, Maumedžių g. rangos darbai su darbo projekto parengimu

Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas)

Šiuo pirkimu bus siekiama įrengti naują viešąją erdvę pagal parengtą UAB „Vilniaus planas“ bei UAB „Atamis“ techninį projektą Nr. VP-21-233 (toliau – Projektas) tenkinančią gyventojų poreikius ir atnaujinti esamą takų bei gatvių infrastruktūrą. Be paminėtų darbų reikės parengti statinio darbo projektą (toliau – Darbo projektas) bei atlikti kitus statybos darbus (toliau – Darbai) pagal statybą leidžiantį dokumentą ir Projektą. **Darbus numatoma vykdyti dviem etapais. Šiuo pirkimu perkami tik I etapo darbai. Detalius darbų etapų atskyrimus žiūrėti projekto dalyse ir pateikiamuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose bei bendrųjų statinio rodiklių lentelėje. 1 etapu numatoma: Maumedžių gatvės su sankryžomis rekonstravimas, lietaus nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas, apšvietimo įrengimas. Privažiavimo prie transformatorinės ir prie pastato Kviečių g. 4 įrengimas, takų, žaidimų aikštelės įrengimas bei teritorijos sutvarkymas.**

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9.p., Darbo projektą rengia Projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali rengti Darbo projektą, jei statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal Statytojo parengtą techninį Projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Jei Darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio Projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, Darbo projekte nurodyti techninį Projektą parengusį Projektuotoją, informuoti techninį Projektą parengusį Projektuotoją apie techninio Projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio Projekto sprendiniams.

Rangovui (laimėjusiam konkurse) bus pateikta laikmena, kurioje patalpinti Techninio projekto visų dalių failai (.dwg, .docx, .pdf).

1. Bendrieji statomo objekto duomenys

- 1.1. **Statytojas (Užsakovas):** Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Statytojas).
- 1.2. **Projekto valdytojas:** UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Projekto valdytojas).
- 1.3. **Rangovas:** Darbų su paslaugomis viešojo pirkimo laimėtojas (toliau – Rangovas).
- 1.4. **Statinių paskirtis:** Susisieikimo komunikacijos; Gatvės; Kiti inžineriniai statiniai; inžineriniai tinklai.
- 1.5. **Statinių kategorija:** Nesudėtingieji, neypatingieji statiniai.
- 1.6. **Statybos rūšis:** Naujų statinių statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas.

2. Reikalavimai

2.1. Bendrieji reikalavimai

2.1.1. Rangovas turi parengti Darbo projektą. Vadovaujantis parengtu Darbo projektu, atlikti statybos darbus, numatytus Projekte. Rangovas Darbo projektą turi parengti Projekto pagrindu, atsižvelgiant į papildomus reikalavimus, nurodytus šiame aiškinamajame rašte.

2.1.2. Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo segmentų įrengimą, tentų (apie 250 vnt.) gamybą, pristatymą ir įrengimą pagal Užsakovo pateiktą maketą (vizualizaciją) atsižvelgiant į pridedamą tentų ruošimo gidą (priedas Nr. 2). Rangovas įpareigojamas imtis papildomų priemonių aptvėrimo stabilumui užtikrinti, esant vėjo apkrovai į tentą.

2.1.3. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti ardymo darbus tvarkomos teritorijos ribose, pagal realų, pirkimo procedūrų metu teritorijoje esantį, ardomų objektų kiekį ir būklę.

2.1.4. Rangovas nuo statinio statybos pradžios iki darbų pabaigos, turės pildyti elektroninį statybos žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Projekto valdytojas.

2.1.5. Darbo projektas ir vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei privalomųjų Projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

2.1.6. Rangovas, esant jo paties poreikiui, privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus darbo projekto parengimui. Statytojo pavedimu Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, Statytojo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, Komisijai, kt.), gauti pažymą, gauti statybos užbaigimo aktą (deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir jį apmokėti. Statytojo vardu įregistruoti statinius VĮ Registrų centras.

2.1.7. Rangovui pavedama užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylas, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratorinių matavimų programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimui.

2.1.8. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

2.1.9. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetą turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

2.1.10. Darbo projekto sprendiniuose ir statybos darbuose turi būti taikomi pažangūs energiją taupantys konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai.

2.1.11. Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę.

2.1.12. Jeigu techninėse specifikacijose nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė.

2.1.13. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms, įrangai bei darbams (jei taikoma).

2.1.14. Teikdamas pasiūlymą rangovas turi vertinti medžių kirtimą, tačiau į pasiūlymą traukti medžių atkuriamosios vertės nereikia. Leidimą medžių šalinimui išims užsakovas.

2.1.15. Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant:

2.1.25.1. geodezinių koordinačių, reperų, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų

schemas;

2.1.25.2. suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;

2.1.25.3. esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

2.1.16. Rangos darbų terminas 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant DP ir statybos užbaigimo procedūras.


Pridedama: 1 priedas. Techninis projektas;

2 priedas. Tentų ruošimo gidas.

TENTŲ RUOŠIMO GIDAS



VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA



VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA

Plėtodami ir vystydami sostinės viešosios socialinės infrastruktūros objektus, kuriame miesto veidą, o kartu – patirtį čia gyvenantiems žmonėms, miesto svečiams ir verslui. Šis tentų standartas skirtas užtikrinti plėtojimų projektų ir objektų tvarką ir švarą bei gražų miesto veidą, net ir vykstant statybos ar remonto darbams. Kviečiame laikytis nurodytų taisyklių ir rekomendacijų bei kartu auginti gražų ir tvarkingą savo miestą – Vilnių.



Turinys

Tentų maketavimas

Tento paraščių nustatymas	5
Tento maketo kompozicija	8
Rangovų logotipų kompozicija	12
Nuotraukų naudojimas tentuose	14
Nuotraukų naudojimo pavyzdys	16
Firminio stiliaus spalvos	17

Tentų montavimas

Tentų montavimo reikalavimai	20
Blogi tentų montavimo pavyzdžiai	24

Priedai:

Teisinė dalis: Sankcijos, jei rangovas pažeidžia susitarimo taisykles.

TENTŲ MARKET AVIMAS



VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Tento paraščių nustatymas




Tento paraščių
dydis nustatomas
naudojant 4 % formato
įstrižainės.



Standartiniai VVK maketuojamų tentų matmenys 3360 x 1700 mm, galima paklaida +/-30 mm kiekvienai kraštinei arba priekyčiai prie tvoros segmento matmenų, kad tentas dengtų visą segmento plotą.

Tento paraščių nustatymas

Tento paraščių
dydis nustatomas
naudojant 4 % formato
įstrižainės.

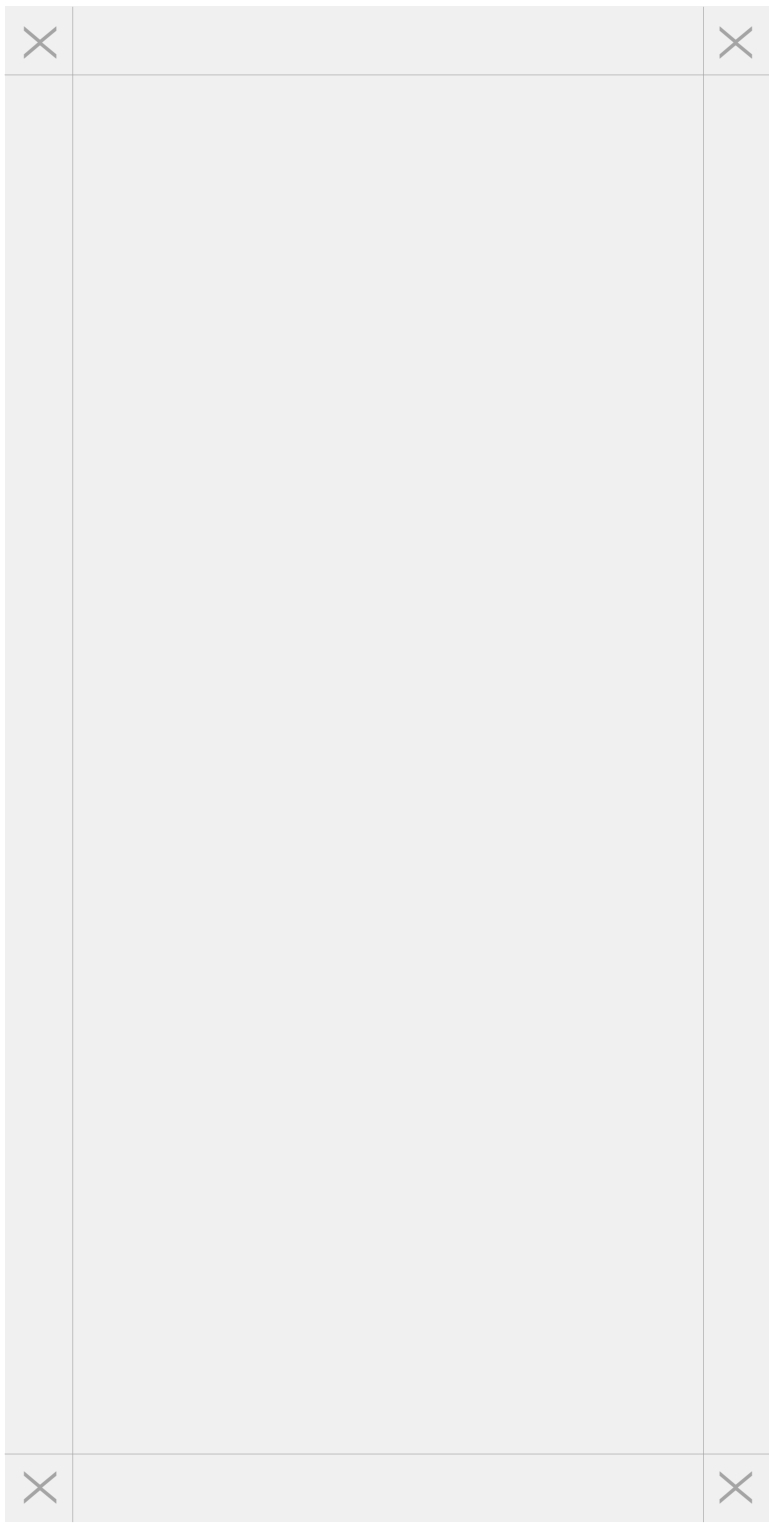


Standartiniai VVK maketuojamų tentų matmenys 3360 x 1700 mm, galima paklaida +/-30 mm kiekvienai kraštinei arba pritaikytas prie tvoros segmento matmenų, kad tentas dengtų visą segmento plotą.

Tento paraščių nustatymas

Paraštėse galima naudoti tik makete esančius grafinius elementus, arba nuotraukas.

Paraštėse negalima naudoti jokių papildomų elementų, teksto blokų ar logotipų.

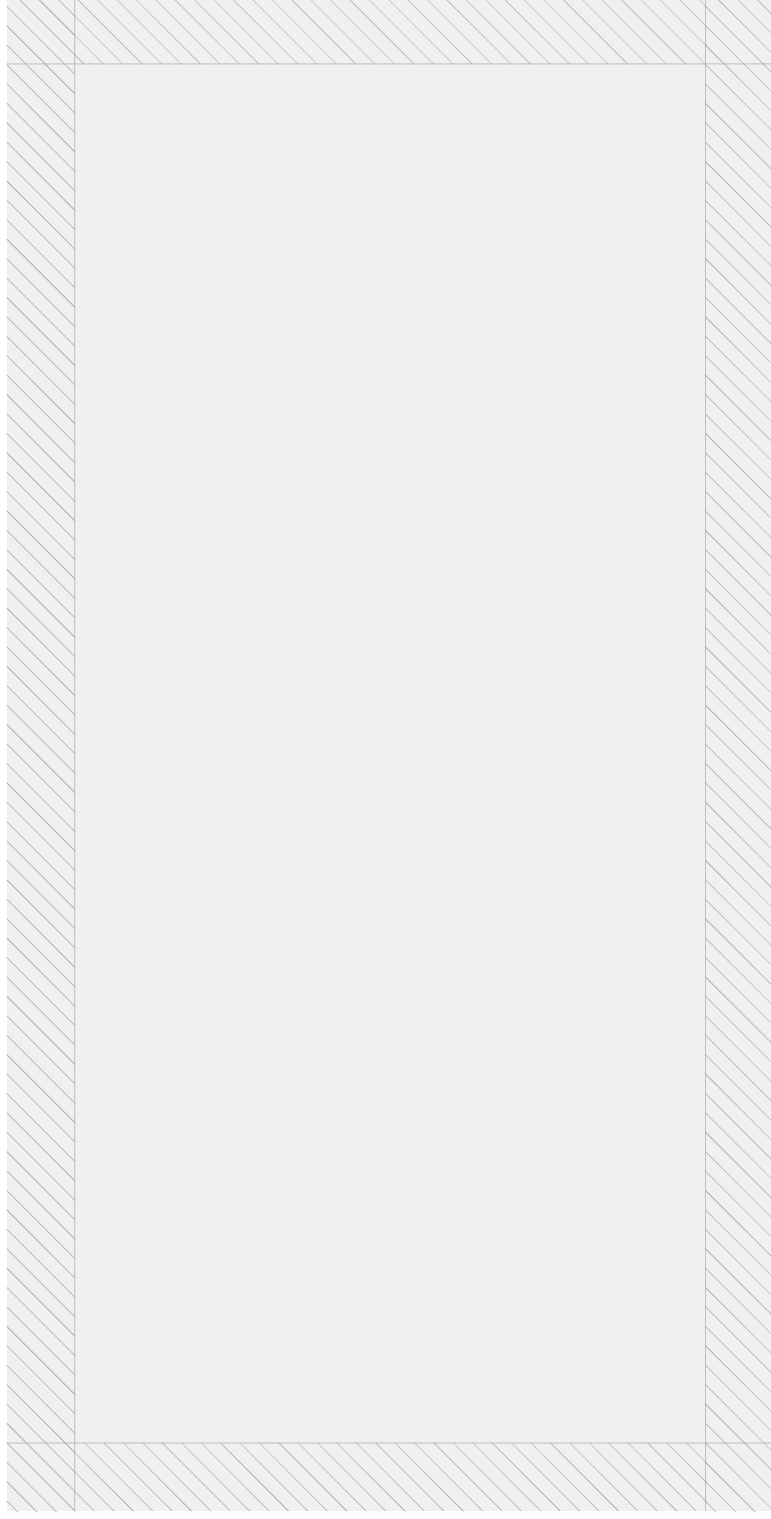

Standartiniai VVK maketuojamų tentų matmenys 3360 x 1700 mm, galima paklaida +/-30 mm kiekvienai kraštinei arba priekyktas prie tvoros segmento matmenų, kad tentas dengtų visą segmento plotą.


00

Tento maketo kompozicija

Siekiant užtikrinti medijų vientisumą, grafinis elementas komponuojamas pagal 12 stulpelių tinklėlio sistemą.

Siekiant išlaikyti švnią kompoziciją, elementams atskirti naudojamas paraščių atstumas.

Išcentruojami grafiniai objektai.

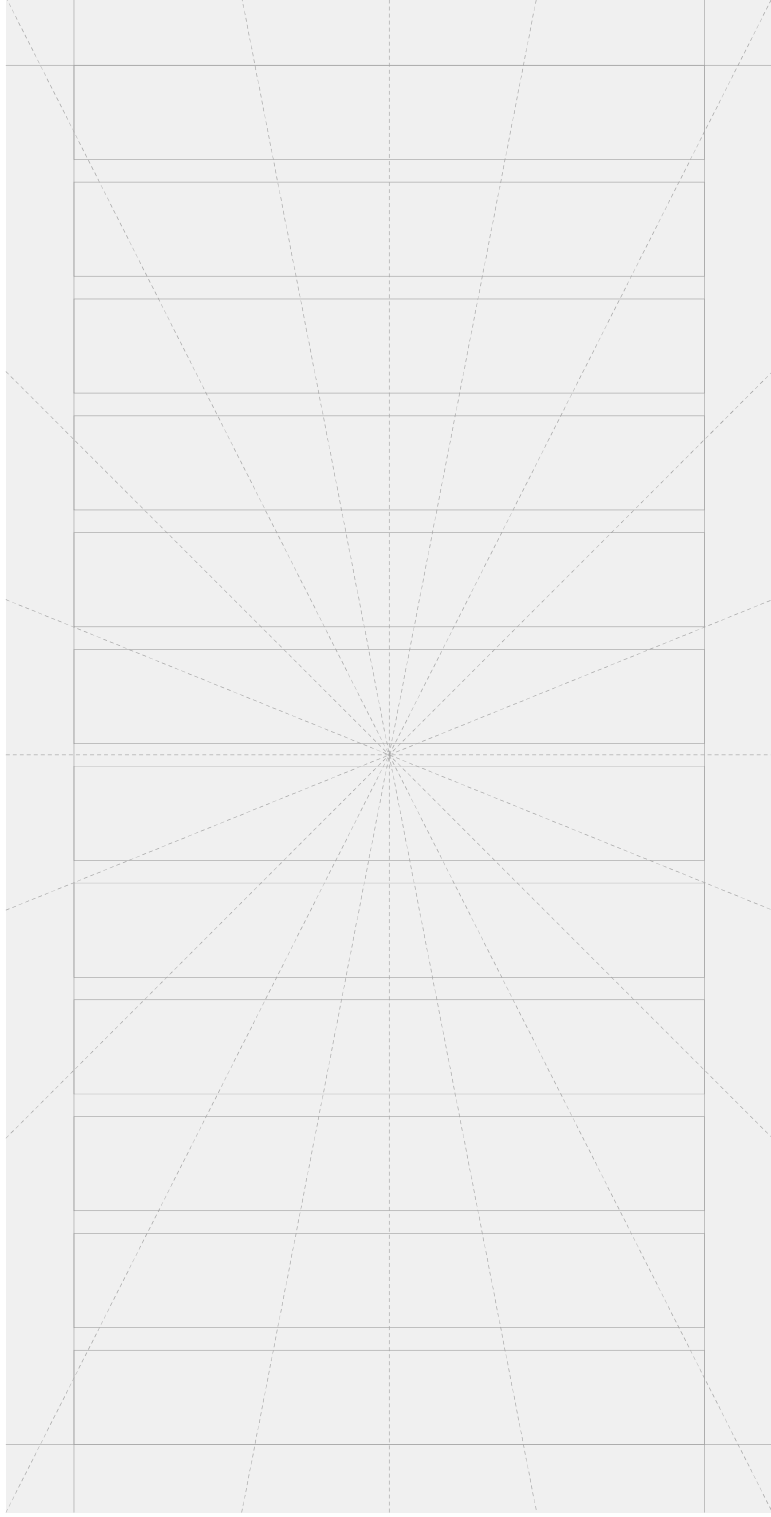


Standartiniai VVK maketuojamų tentų matmenys 3360 x 1700 mm, galima paklaida +30 mm kiekvienai kraštinei arba priekyktas prie tvoros segmento matmenų, kad tentas dengtų visą segmento plotą.

Tento maketo kompozicija

Siekiant užtikrinti medijų vientisumą, grafinis elementas komponuojamas pagal 12 stulpelių tinklėlio sistemą.

Siekiant išlaikyti švairią kompoziciją, elementams atskirti naudojamas paraščių atstumas.

Išcentruojami grafiniai objektai.

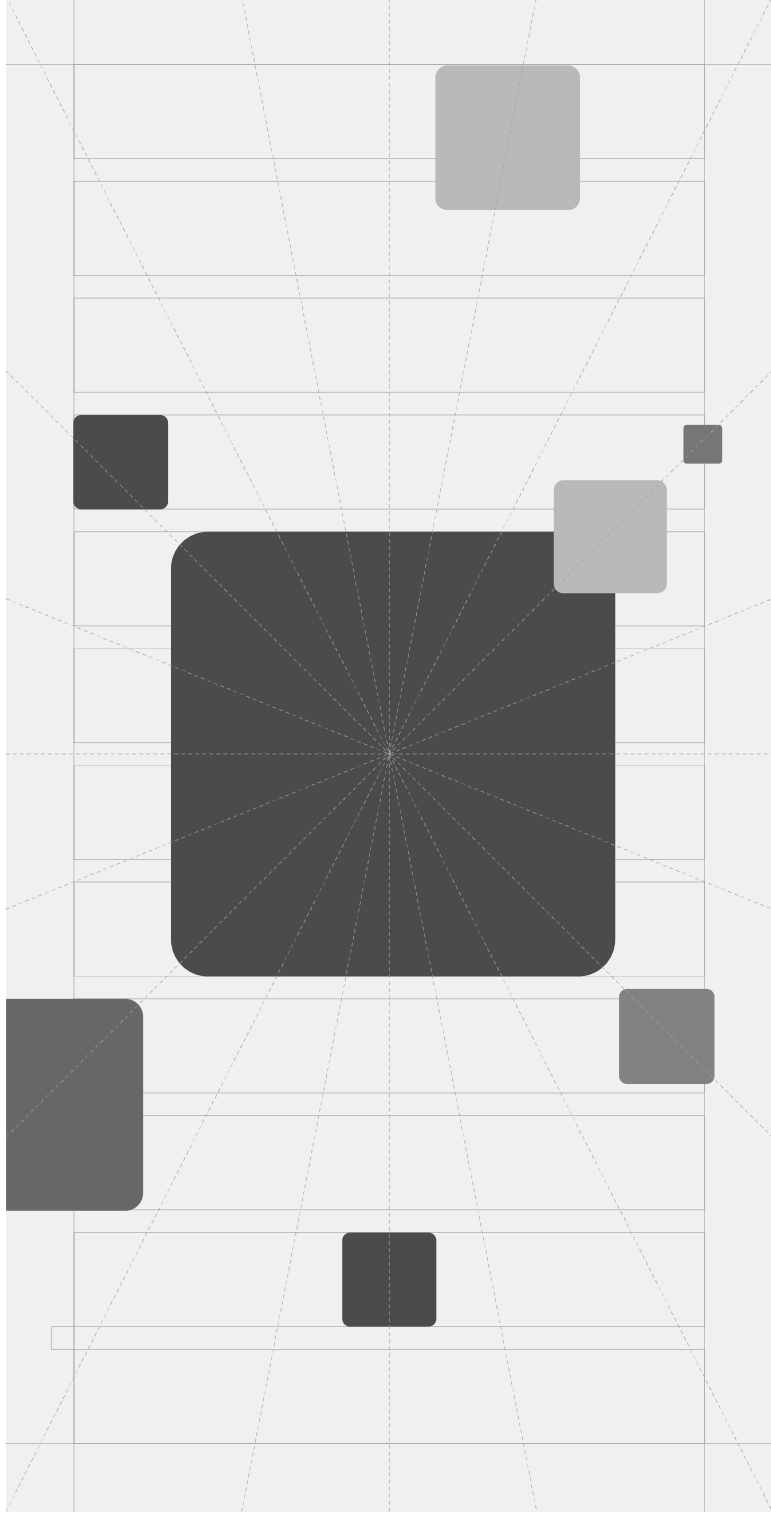




Standartiniai VVK maketuojamų tentų matmenys 3360 x 1700 mm, galima paklaida +30 mm kiekvienai kraštinei arba priekyčiai, kad tentas dengtų visą segmento plotą.

Tento maketo kompozicija

Siekiant užtikrinti medijų vientisumą, grafinis elementas komponuojamas pagal 12 stulpelių tinklėlio sistemą.

Siekiant išlaikyti šviesią kompoziciją, elementams atskirti naudojamas paraščių atstumas.

Konstruojant kompoziciją iš daugiau tentų, grafinių objektų centravimą galima taikyti per bendrą kelių tentų vaizdą.

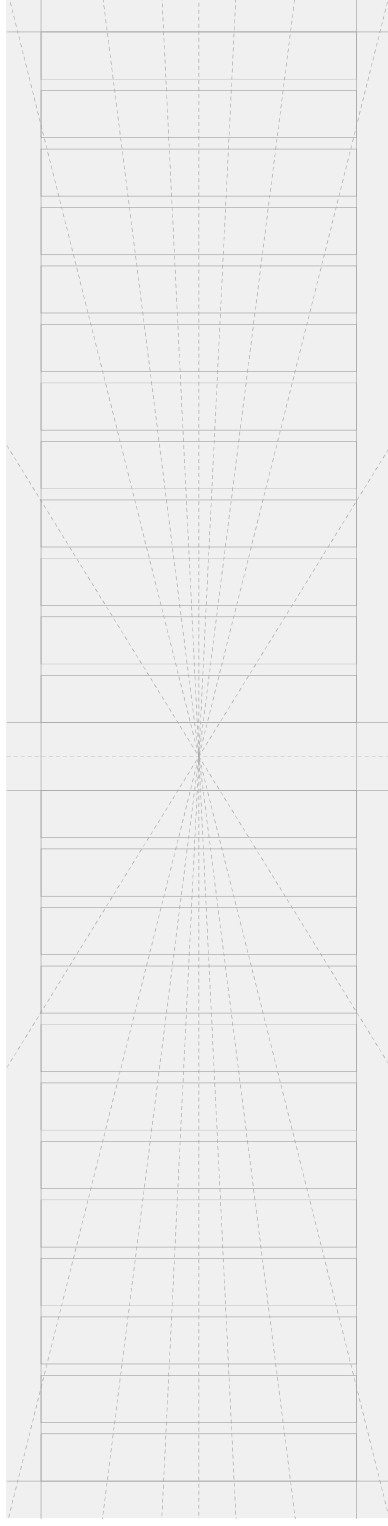



Rangovų logotipų kompozicija

Rangovų logotipai komponuojami atsižvelgiant į 12 stulpelių tinklėlį, priklausomai nuo logotipų kiekio.

Rangovų logotipai tente privalo būti naudojami balto spalvinio varianto ir gali būti komponuojami naudojant tik raudoną foną.


Rangovo reklamos plotui gali būti skirta ne daugiau trečdalis statybvietės aptvėrimo ploto.

Pvz. iš 6 tentų tik 2 gali būti skiriami rangovų reklamos plotui.



Nuotraukų naudojimas tentuose


Nuotraukos kurios nėra
komponuojamos visame
tente, privalo būti
apkerpamos pagal VVK
grafinio elemento formą.

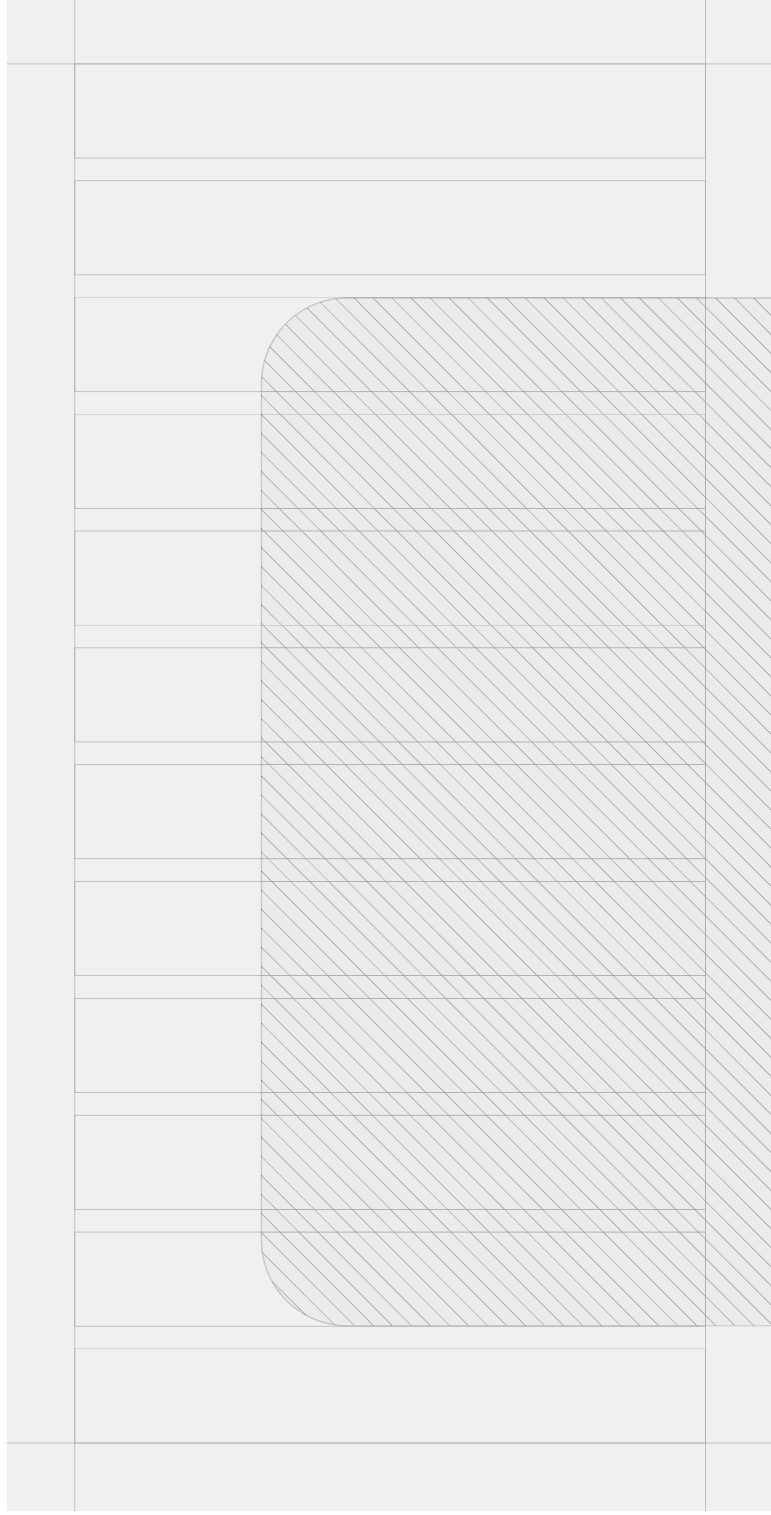

Nuotraukų naudojimas tentuose

Nuotraukos kurios nėra komponuojamos visame tente, privalo būti apkerpamos pagal VVK grafinio elemento formą.

Nuotraukos ar vizualizacijos gali dalinai uždengti vieną kitą, kartu papildant maketą su grafiniiais elementais.

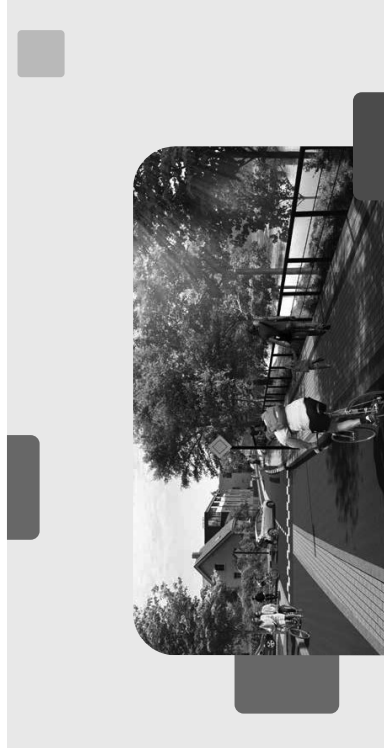

Nuotraukų naudojimo pavyzdys

Nuotraukos kurios nėra komponuojamos visame tente, privalo būti apkerpamos pagal VVK grafinio elemento formą.

Nuotraukos ar vizualizacijos gali dalinai uždengti vieną kitą, kartu papildant maketą su grafinais elementais.

Už tentų vizualizacijas atsakinga UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. Tentų vizualizacijas (maketus) prieš atiduodant gamybai VVK susiderina su Rangovu.



Firminio stiliaus spalvos

Čia pateikiama
pagrindinė stiliaus
paletė.

Firebrick, **Seashell** ir
White spalvos skirtos
fonams ir papildant
vienai kitą.

Nerekomenduojama
naudoti **Black** spalvos
fonams, siekiant
išlaikyti stiliaus
vientisumą.

Firebrick CMYK RGB HEX 25 100 100 0 193 39 45 #c1272d	Seashell CMYK RGB HEX 0 77 0 254 237 229 #feede5	White CMYK RGB HEX 0 0 0 0 255 255 255 #ffffff
Black CMYK RGB HEX 0 0 0 100 0 0 0 #000000		

Firminio stiliaus spalvos

Šiame puslapyje
pateikiama išplėstinė
stiliaus spalvų paletė.

Išplėstinė paletė skirta
įvesti žaismingumo ir
pagyvinti firminį stilių,
naudojama **stiliaus**
grafiniams
elementams.

CMYK RGB HEX	25 100 100 0 193 39 45 #c1272d	CMYK RGB HEX	0 90 100 0 239 65 35 #ef4123	CMYK RGB HEX	0 0 0 100 0 0 0 #000000
CMYK RGB HEX	16 100 100 0 195 33 38 #c32126	CMYK RGB HEX	0 80 100 0 241 90 34 #f15a22	CMYK RGB HEX	0 0 0 99 36 36 36 #242424
CMYK RGB HEX	13 100 100 3 205 32 39 #cd2127	CMYK RGB HEX	0 70 80 0 243 42 67 #f37043	CMYK RGB HEX	0 0 0 87 72 72 72 #484848
CMYK RGB HEX	10 100 100 2 213 32 39 #d52027	CMYK RGB HEX	0 55 65 0 246 141 97 #f68d61	CMYK RGB HEX	0 0 0 71 109 109 109 #6d6d6d
CMYK RGB HEX	7 100 100 0 223 32 39 #df2027	CMYK RGB HEX	0 45 45 0 248 160 132 #f8a084	CMYK RGB HEX	10 10 10 43 145 145 145 #919191
CMYK RGB HEX	3 98 98 0 229 38 39 #e52627	CMYK RGB HEX	0 30 30 0 251 190 167 #fbb6a7	CMYK RGB HEX	10 10 10 22 182 182 182 #b6b6b6
CMYK RGB HEX	0 97 95 0 238 43 41 #ee2b29	CMYK RGB HEX	0 15 15 0 253 221 206 #fdddc6	CMYK RGB HEX	5 5 5 7 217 217 217 #d9d9d9
CMYK RGB HEX	0 95 91 0 238 49 46 #ee312e	CMYK RGB HEX	0 7 7 0 254 237 229 #feedc5	CMYK RGB HEX	0 0 0 0 255 255 255 #ffffff

TENTŲ MONTAVIMAS



VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Tentų montavimo reikalavimai


Rangovas teikdamas pasiūlymą tentų gamybai turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo segmentų skaičių.

Aptvėrimo segmentai turi būti vienodų išmatavimų, to paties medžiagiškumo ir spalvos.

Tentai turi būti skirti lauko sąlygoms.

Už tentų gamybą ir įrengimo darbus – atsakingas rangovas.

Rangovas atsako už techninę tentų priežiūrą visą statybų proceso laikotarpį.

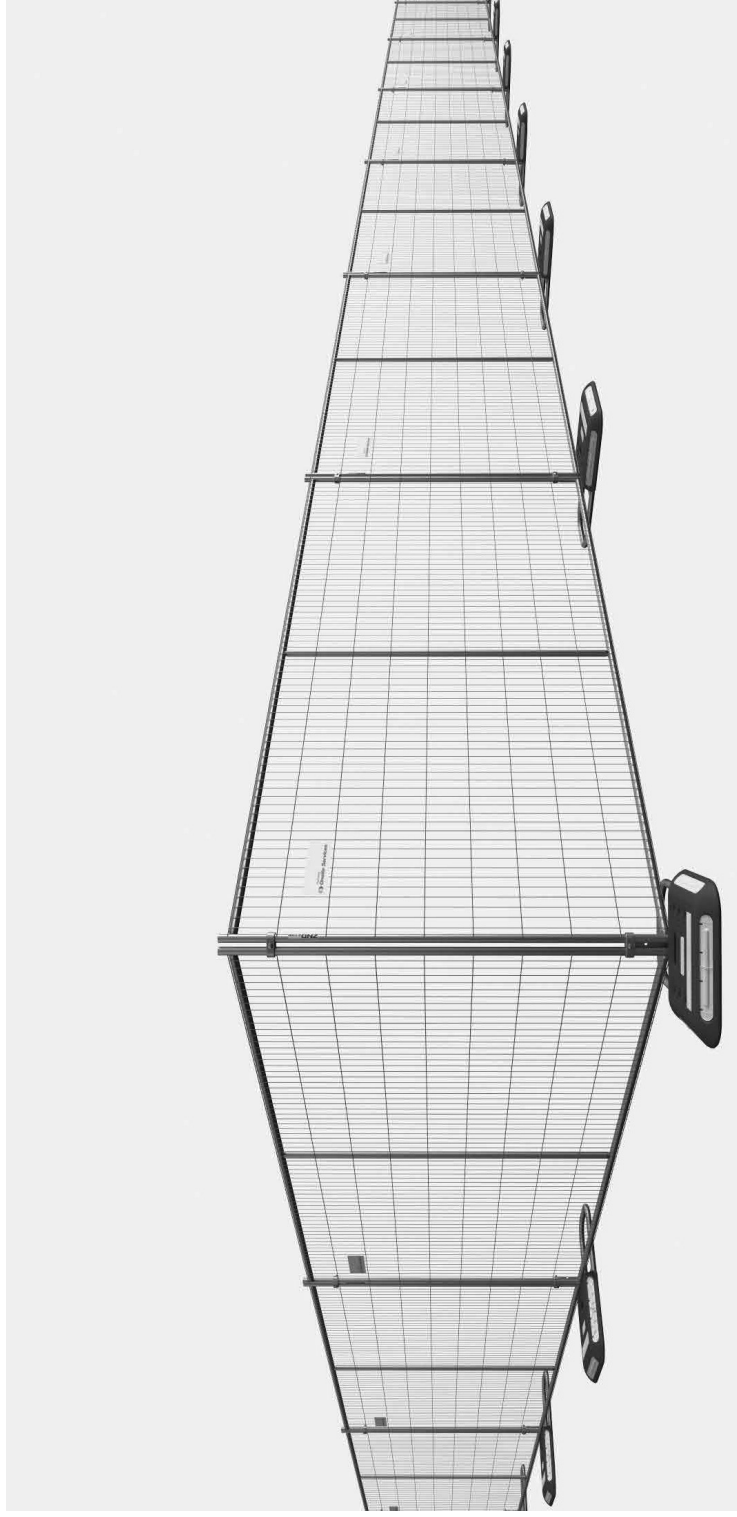

Tentų montavimo reikalavimai


Visi tvoros segmentai turi būti uždengti tentais pagal šį tentų standartą numatytais vizualiais.

Tvoroje negali likti tuščių segmentų (be tentų). Segmentuose negali būti naudojami tentai su kita reklamine informacija.

Tentai turi eiti tokia eilės tvarka, kokia numatyta suderintame makete.

Už tentų gamybą ir įrengimo darbus – atsakingas rangovas.

Rangovas atsako už techninę tentų priežiūrą visą statybų proceso laikotarpį.

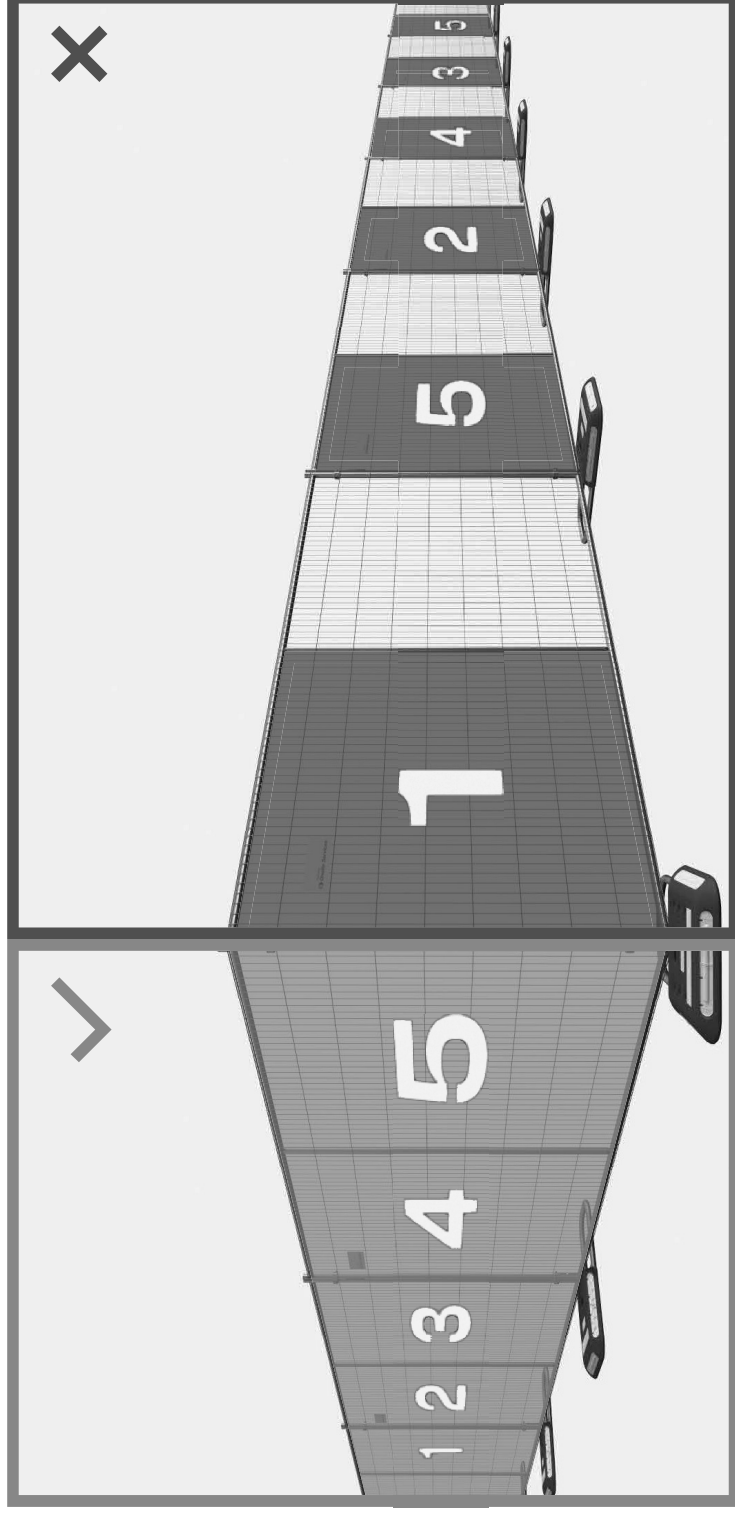

Tentų montavimo reikalavimai

Rangovas teikdamas pasiūlymą tentų gamybai turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo segmentų skaičių.

Aptvėrimo segmentai turi būti vienodų išmatavimų, to paties medžiagiškumo ir spalvos.

Už tentų gamybą ir įrengimo darbus – atsakingas rangovas.

Rangovas atsako už techninę tentų priežiūrą visą statybų proceso laikotarpį.



Tentai turi būti gaminami iš „mesh“ tipo medžiagos ir kabinami ant atitvarinių segmentų.


Tentų montavimo reikalavimai

Tente privalo būti būsimo objekto vizualizacijos, aprašymai, statybų pradžios ir pabaigos terminai bei kita informacija, svarbi žinoti visuomenei, užtikrinti sklandų šio proceso organizavimą.

Statybos darbams, kurių terminas ilgesnis nei vieneri metai, rangovas įsipareigo tentus atnaujinti vieną kartą metuose.

Už tentų gamybą ir įrengimo darbus – atsakingas rangovas.

Rangovas atsako už techninę tentų priežiūrą visą statybų proceso laikotarpį.

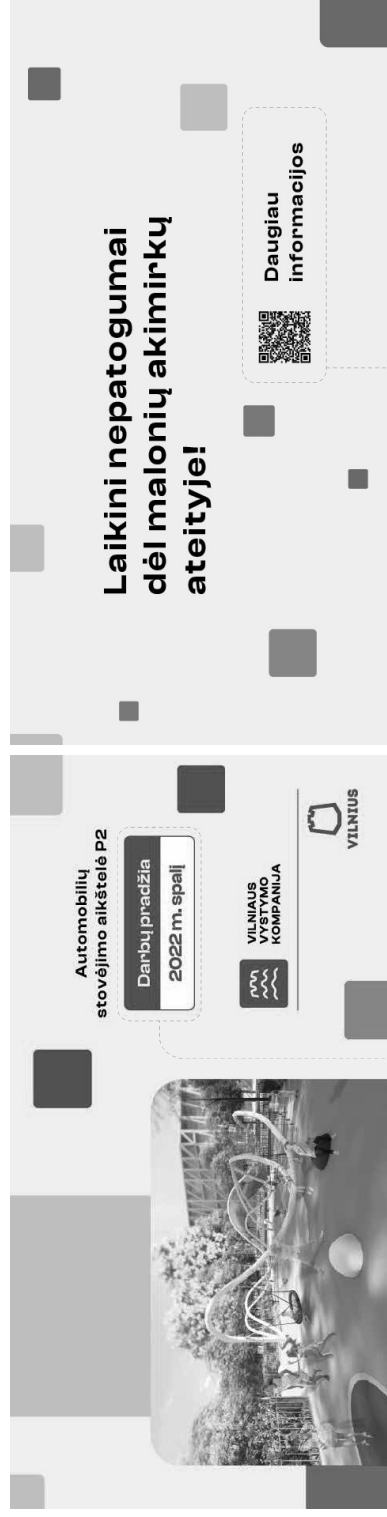

32cm

78cm

Keičiantis darbų terminui, turi būti pakeičiamas ir informacinis lipdukas.

Papildoma informacija visuomenei gali būti pateikiama ir QR kodo su nuoroda pavidalu

Blogi tentų montavimo pavyzdžiai

Čia pateikiami blogi tentų montavimo pavyzdžiai kurių reikėtų vengti.

Už tentų gamybą ir įrengimo darbus – atsakingas rangovas.


Rangovas atsako už techninę tentų priežiūrą visą statybų proceso laikotarpį.



Netinkama medžiaga. Nėra vizualizacijos. Tvoros tvirtinimas išsikiša į pėsčiųjų zoną



Segmentinių tvorų tentams naudoti mesh tipo medžiagą kuri padidina vėjo pralaidumą ir padidina stabilumą.

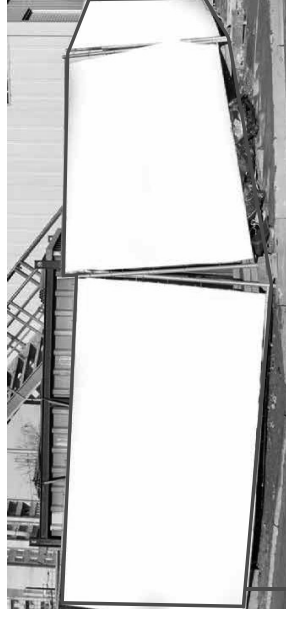

Naudojamų tentų konstrukcijos privalo būti stabilios

Tvoros segmentas be tentų uždengiančių statybvietę



Netinkamas tvirtinimas. Tvoros turi būti tvirtos, stabilios, neišsikišti į pėsčiųjų praejimus. Tvoros tvirtinimas turėtų būti statybvietėje, netrukdyti pėsčiųjų eismo.

TENTŲ RUOŠIMO GIDAS



VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Jei turite papildomų
klasimų, susisiekite:

+3706 87 66 000

info@vilniausvystymas.lt
