

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2016 m. lapkričio 21 d. Nr. 16VM(10)-49
Vilnius

Vilniaus teritorinė muitinė (toliau – Užsakovas), atstovaujama viršininko Jono Reklaičio, veikiančio pagal Vilniaus teritorinės muitinės nuostatus, patvirtintus Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-666 „Dėl Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinių muitinių nuostatų patvirtinimo“ ir UAB „Inta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama specialiųjų projektų departamento vadovo Donato Limanto, veikiančio pagal UAB „INTA“ generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 20 d. įgaliojimą Nr. 19, kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis),

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio poste (adresas Pasieniečių g. 26 Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.) ir Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste (adresas Mačiuliškių k. 7, Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.) esančių rentgeno kontrolės sistemų pravažiavimo remonto darbų, skirtų rampai atnaujinti, atitinkančių Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, atlikimas (toliau – Darbai).

1.2. Atliktiems Darbams suteikiama 5 (penkių) metų garantija. Jei defektai bus nustatyti per garantinį terminą, Rangovas įsipareigoja neatlygintinai juos pašalinti per Šalių suderintą terminą. Rangovui nepašalinus trūkumų per sutartą terminą, Užsakovas, prieš tai įspėjęs Rangovą raštu, turi teisę defektus pašalinti pats arba samdyti kitus asmenis, o sąskaitas už defektų pašalinimą pateikti apmokėti Rangovui.

1.3. Rangovas darbus pradeda sekančią dieną po Sutarties įsigaliojimo ir baigia 2016 m. gruodžio 10 d. Darbai laikomi baigti po Rangovo ir Užsakovo atstovų atliktų Darbų akto pasirašymo.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1 Šalys susitaria, kad bendra Sutarties kaina – 19 093,80 Eur, (devyniolika tūkstančių devyniasdešimt trys Eur, 00 ct), iš jų pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) sudaro 3 313,80 Eur, (trys tūkstančiai trys šimtai trylika Eur 80 ct. (Sutarties 2 priedas).

2.2. Į bendrą Sutarties kainą įskaityta darbų kaina ir visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos Rangovo išlaidos, įskaitant (bet neapsiribojant) medžiagų, transporto, komplektavimo, pakrovimo, iškrovimo ir kitos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos bei visos su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos.

2.3. Remonto darbams taikomas PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatos: atvirkštinis apmokestinimas, kuris sudaro 3 313,80 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 80 ct) ir sumokamas Užsakovo į biudžetą.

2.4. Sutarties kaina yra fiksuota ir Sutarties vykdymo laikotarpiu nekeičiama. Rangovui už atliktus Darbus mokėtina Sutartyje nurodyta fiksuota kaina dėl kainų lygio pasikeitimo ir mokesčių pasikeitimo (išskyrus PVM) nebus perskaičiuojama. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio, kuro kainų ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Sutartyje nurodyta fiksuota kaina gali būti perskaičiuota ją didinant (mažinant) tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Sutartyje nurodytai fiksuotai kainai. Sutartyje nurodyta kaina gali būti pakeista tik Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių

įgaliotų atstovų ir patvirtintu Šalių antspaudais. Perskaičiuota Darbų kaina įsigalioja kitą dieną po to, kai Sutarties Šalys rašytiniu susitarimu ją pakeičia.

2.5. Už faktiškai atliktus Darbus užsakovas sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo bei jų pagrindu išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų gavimo.

2.6. Mokėjimas atliekamas eurai.

2.7. Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintu Šalių antspaudais, gali būti nustatyta kita mokėjimo tvarka dėl sustabdyto, sumažinto (padidinto) Užsakovui finansavimo.

3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. sudaryti Rangovui sąlygas, suteikti jo turimą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbams atlikti;

3.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai baigtus Darbus ir pasirašyti pateiktus Medininkų kelio poste ir Lavoriškių kelio poste atliktų Darbų aktus (Sutarties 4 priedas) arba pateikti motyvuotus atsisakymus;

3.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3.2. Užsakovas turi teisę:

3.2.1. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių, pareikalauti šalinti trūkumus arba sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;

3.2.2. Užsakovas turi vykdomų statybos darbų priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus nurodymus Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti. Visi nurodymai pateikiami raštu.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.3.1. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus. Darbus atlikti laikantis galiojančių statybos normų bei taisyklių ir pagal Sutarties 1, 3 prieduose Darbams keliamus reikalavimus;

3.3.2. Informuoti užsakovą apie statybos eigą;

3.3.3. atlikdamas darbus vadovautis saugumo technikos, aplinkos apsaugos ir kt. reikalavimais bei už tai pilnai atsakyti prieš kontroliuojančias institucijas įstatymų nustatyta tvarka;

3.3.4. spręsti savo darbuotojų buitinius klausimus.

4. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, jis sumoka Rangovui 0,03 (trijų šimtųjų) procento delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4.2. Jeigu Rangovas pažeidė Darbų atlikimo terminus ir tai įvyko dėl Rangovo tiesioginės kaltės, Užsakovas turi teisę skaičiuoti delspinigius po 0,03 (trijų šimtųjų) procento nuo bendros Darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

4.3. Šalis, dėl kurios veiksmų kita Šalis patiria nuostolius, privalo atlyginti tik tos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo Sutarties sąlygų vykdymo.

5. FORCE MAJEURE

5.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis.

5.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

5.3. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą.

5.4. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

6. ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, ar iš šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas Šalių tarpusavio susitarimu.

6.2. Šalims nepasiekus susitarimo, toks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir negaliojimu, bus sprendžiamas teismine tvarka atitinkamame teisme, teritorinį teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, PAPILDYMAS, NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną ir galioja, kol Šalys įvykdo visus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos (Sutarties objektas, kainodaros taisyklės, Sutarties trukmė) negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

7.3. Sutartis gali būti nutraukta:

7.3.1. rašytiniu Šalių susitarimu;

7.3.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 7 (septynias) dienas, šiais atvejais ir pareikalauti nuostolių atlyginimo:

7.3.2.1. jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir/ar nepašalina arba netinkamai pašalina Užsakovo raštu nurodytus trūkumus;

7.3.2.2. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

7.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka.

7.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, Rangovas be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensavimą.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie visus naujus įvykius ir aplinkybes, galinčius turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui.

8.2. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ir kiti dokumentai, reikalingi dėl šios Sutarties, turi būti atlikti raštu ir išsiųsti paštu (registruotu laišku) arba faksimilinio ar elektroninio ryšio priemonėmis, Sutartyje nurodytais Šalių adresais.

8.3. Užsakovo ir Rangovo paskirti atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą bei jų kontaktai:

Užsakovo:

Vilniaus teritorinė muitinė

Naujoji Rionų g. 3, Vilnius

Tel. (8 5) 2356 420

Faksas (8 5) 2356 280

El. paštas: gediminas.minelga@lrmuitine.lt

Rangovo:

Uždaroji akcinė bendrovė „Inta“

Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius

Tel.: (8 5) 216 7211

Faksas (8 5) 216 7212

El. paštas : donatas.limantas@inta.lt

Gediminas Minelga

(atsakingas asmuo)

Donatas Limantas

(atsakingas asmuo)

8.4. Šalys privalo informuoti viena kitą apie jų teisinio statuso, adresų, telefonų bei faksų numerių, elektroninio pašto adresų, kitų rekvizitų, atsakingų asmenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas jiems pasikeitus.

8.5. Užsakovas Sutarties vykdymui gali pasitelkti subrangovus.

8.6. Užsakovas visiškai atsako už kokybišką Sutarties vykdymą ir atlikimą laiku, taip pat visiškai atsako už bet kurių trečiųjų asmenų, kuriuos jis gali samdyti Sutarties vykdymui, darbą. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalies savo įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subrangos sutartimi, kuri turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

8.7.1. tokia sutartis turi būti rašytinė;

8.7.2. Rangovas Sutarčiai vykdyti, išskyrus 8.7.3 punkte numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti Rangovo pasiūlyme. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subrangovas, neatleidžia rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį;

8.7.3. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Užsakovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovui nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar kitais atvejais, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subrangovų pakeitimo priežastis ir būsimus subrangovus, kurie turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus subrangovams taikomas reikalavimus. Subrangovų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.7.4. Šios sąlygos dėl subrangos taikomos tik tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodė, kad subrangovus pasitelks.

8.8. Nei viena šios Sutarties Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai su priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.2. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

10. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Medininkų ir Lavoriškių muitinės kelio postuose esančių rentgeno kontrolės sistemų pravažiavimo remonto darbų, skirtų rampai atnaujinti, techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

10.2. Medininkų ir Lavoriškių muitinės kelio postuose esančių rentgeno kontrolės sistemų pravažiavimo remonto darbų, skirtų rampai atnaujinti, sąmata. (Sutarties 2 priedas).

10.3. Medininkų ir Lavoriškių muitinės kelio postuose esančių rentgeno kontrolės sistemų pravažiavimo remonto darbų, skirtų rampai atnaujinti, techninis aprašas (Sutarties 3 priedas).

10.4. Darbų priėmimo–perdavimo akto forma (Sutarties 4 priedas).

10.5. UAB „INTA“ generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 20 d. įgaliojimo Nr. 19 kopija, 1 lapas

XI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Vilniaus teritorinė muitinė

Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius

Tel.(8 5) 235 60420

faksas (8 5) 235 6280

El. paštas: gediminas.minelga@lrmuitine.lt

Juridinio asmens kodas 290733470

PVM mokėtojo kodas LT907334716

Banko sąskaitos Nr. LT304010042400070066

AB bankas DNB

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Inta“

Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius

Tel.: (8 5) 216 7211

Faksas (8 5) 216 7212

El.paštas : donatas.limantas@inta.lt

Juridinio asmens kodas 110015560

PVM mokėtojo kodas LT100000021218

Banko sąskaitos Nr. LT7044060000148408

AB SEB bankas

Muitinės viršininkas

Jonas Reklaitis



Specialiųjų projektų departamento vadovas

Donatas Limantas



A. V.

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis inspektorius

Saulius Malinauskas

2016 11 24

Muitinės departamento
Finansų skyriaus vyriausioji inspektoriė

Vilė Paukštytė

2016-11-24

Vilniaus teritorinės muitinės
Teisės skyriaus viršininkė

Janina Janibauskienė

2016-11-24

Vilniaus teritorinės muitinės
Mobilųjų grupių posto
viršininkas

Romas Siekštelis

2016-11-24

Vilniaus teritorinės muitinės
Viršininko pavaduotojas

Alvydas Bražiūnas

2016 11 21

MEDININKŲ IR LAVORIŠKIŲ MUITINĖS KELIO POSTUOSE ESANČIŲ RENTGENO KONTROLĖS SISTEMŲ PRAVAŽIAVIMŲ REMONTO DARBŲ, SKIRTŲ RAMPAI ATNAUJINTI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Esamos situacijos aprašymas

1. Pirkimo objektas – Medininkų ir Lavoriškių muitinės postuose įrengtų stacionarių rentgeno kontrolės sistemų apsauginių statinių važiuojamojoje juostoje esančių betoninių rampų atnaujinimas ir paaukštinimas, kuris leistų muitinės pareigūnams skenuojamų lengvųjų automobilių bei mikroautobusų rentgenogramose aiškiai matyti skenuojamų automobilių kėbulo konstrukcijos apatines dalis.

2. Daugiau informacijos apie pirkimo objektą galima gauti susisiekus su perkančiosios organizacijos atstovais:

- 2.1. Juozas Balčiūnas, (8 5) 266 6140, mob. 8 686 10278;
- 2.2. Romas Šiekštelis, (8 5) 235 6318, mob. 8 620 55369;
- 2.3. Vygandas Matusevičius, (8 5) 266 6115, mob. 8 686 47745.

Techniniai reikalavimai

3. Rampos gamybai naudojamos medžiagos ir techniniai sprendimai pateikiami kartu su techniniu projektu, kuris derinamas su perkančiąja organizacija iš anksto.

4. Rampos atnaujinimas bei technologinis betono kietėjimo laikas neturi viršyti 21 paros.

5. Vidutinis transporto srautas, pravažiuojantis per rampą, turi būti skaičiuojamas ne mažiau 50 transporto vienetų per parą, 365 paros per metus.

6. Rampa turi atlaikyti apkrovas, sukliamas pravažiuojančio transporto srauto, kurio vieno junginio maksimali leidžiama bendroji masė gali sudaryti iki 44 tonų.

7. Tikslūs rampos matmenys nurodomi techniniame apraše. Preliminarūs rampos matmenys:

- 7.1. bendras ilgis 8 m, iš kurių po 2 metrus nuolydžiai skirti užvažiuoti ir nuvažiuoti;
- 7.2. aukštis horizontalioje plokštumoje ne daugiau kaip 15 cm;
- 7.3. plotis 3,5 m su per vidurį paliktu drenažo lataku, kuris per visą rampos ilgį turi būti uždengtas grotelėmis.

8. Esantys eismą kreipiantys atitvarai ties rampa aukštinami nuo rampos paviršiaus ne daugiau kaip 100 mm.

9. Apsauginio statinio važiuojamoje juostoje dalyje įrengiamas horizontalus, šalia juostos – vertikalus ženklinimas pagal Kelių eismo taisykles. Ženklinimas derinamas su perkančiąja organizacija.

10. Atliktiems darbams suteikiama 5 metų garantija.

2016 m. lapkričio 21 d.
Sutarties Nr. 16 VM(10)-49
2 priedas

MEDININKŲ IR LAVORIŠKIŲ MUITINĖS KELIO POSTUOSE ESANČIŲ RENTGENO KONTROLĖS SISTEMŲ PRAVAŽIAVIMO REMONTO DARBŲ, SKIRTŲ RAMPAI ATNAUJINTI, SĄMATA

Medininkų pasienio kontrolės punkto stacionari rentgeno kontrolės sistema MB1215LC

Iš viso už 9.546,90 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	Projektavimo darbai	kompl.	1
2	Paruošiamieji darbai	kompl.	1
3	Grindų įrengimo darbai	kompl.	1
4	Sistemos derinimo ir testavimo darbai	kompl.	1
5	Transportas	kompl.	1
Iš viso			
PVM			
Iš viso su PVM			

Lavoriškių pasienio kontrolės punkto stacionari rentgeno kontrolės sistema MB1

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	Projektavimo darbai	kompl.	1
2	Paruošiamieji darbai	kompl.	1
3	Grindų įrengimo darbai	kompl.	1
4	Sistemos derinimo ir testavimo darbai	kompl.	1
5	Transportas	kompl.	1
Iš viso			
PVM			
Iš viso su PVM			

Užsakovas

Vilniaus teritorinė muitinė

Juridinio asmens kodas 290733470

Muitinės viršininkas

Jonas Reklaitis



Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Inta“

Juridinio asmens kodas 110015560

Specialiųjų projektų departamento vadovas

Donatas Limantas



A. V.

2016 m. lapkričio 21 d.
Sutarties Nr. 16 VM(10)-19
3 priedas

MEDININKŲ IR LAVORIŠKIŲ MUITINĖS KELIO POSTUOSE ESANČIŲ RENTGENO KONTROLĖS SISTEMŲ PRAVAŽIAVIMO REMONTO DARBŲ SKIRTŲ RAMPAI ATNAUJINTI TECHNINIS APRAŠAS

NUCTECHTM MB1215LC stacionari-kilnojama konteinerių ir transporto priemonių patikros sistema (toliau Sistema) suprojektuota intensyviai neintervenciniai krovininių transporto priemonių patikrai. Sistemoje taip pat numatyta galimybė atlikti lengvųjų automobilių patikrą. Tam tikslui naudojama kilnojama rampa. Medininkų ir Lavoriškių rentgeno kontrolės sistemose kiekvieną dieną atliekama tiek sunkiasvorių tiek lengvųjų automobilių patikra, dėl šios priežasties kiekvieną dieną lengvųjų automobilių rampą daug kartų reikia surinkti ir išrinkti. Siekiant palengvinti ir paspartinti sistemos operatorių darbą, bei supaprastinti lengvųjų automobilių skenavimo procedūrą bus atlikti sistemų pravažiavimų remonto darbai skirti rampai įrengti.

Įrengiant rampą bus atliekami šie pagrindiniai darbai:

- Parošiamieji darbai;
- Rampos įrengimo (grindų betonavimo) darbai;
- Sistemos derinimo ir testavimo darbai.

Pagrindiniai įrengiamų rampų išmatavimai:

- Plotis- 3,5 m;
- Aukštis nuo esamų grindų paviršiaus- 0,15 m;
- Ilgis- 8 m, iš kurių 2 m užvažiavimas, 4 m horizontalioji dalis ir 2 m nuvažiavimas;

Parošiamieji darbai


Prieš atliekant rampos betonavimo darbus rentgeno kontrolės sistema bus uždengta plėvele, tokiu būdu apsaugant ją nuo dulkių. Esamos kreipiančios kairėje ir dešinėje pusėje demontuojamos (8 m).

Ramos įrengimo (grindų betonavimo) darbai

- Nušlifuojama dalis esamos grindų dangos;
- Rampos užvažiavimas ir nuvažiavimas įgilinamas (frezuojama esame grindų danga) apie 10 cm;
- Žingsniu 30x30 cm gręžiamos 12 mm diametro skylės esamose grindyse;
- Į išgręžtas skyles cheminiu būdu tvirtinama 12 mm armatūra. Naudojama KEUP(CE) cheminio tvirtinimo derva;
- Montuojamas 12 mm armatūros tinklas, žingsnių 30x30 cm, per visą betonavimo plotą;
- Rampos kraštų sutvirtinimui (išorinių ir vidinių, prie latako) montuojamas 75x75 mm kampuotis;
- Nuvalomas (siurbiant) esamas grindų paviršius ir padengiamas gruntu TIEFGRUD TB;
- Sumontuotas kampuotis dengiamas metalo gruntavimo dažais HAMMERITE SMP;
- Montuojami klojiniai;
- Liejamas C30/37 XF3 betonas;
- Rampos paviršius dengiamas kietikiu LITHURIN HARD;

- Išdžiūvus betonui pjaunamos deformacinės siūlės ir užpildomos INNOELAST TIPE 1;
- Montuojamos kreipiančiosios;
- Montuojamos 8 m latakų grotelės;
- Rampos važiuojamoje juostoje įrengiamas horizontalus ir vertikalus ženklینimas.

Principinė rampos įrengimo schema:

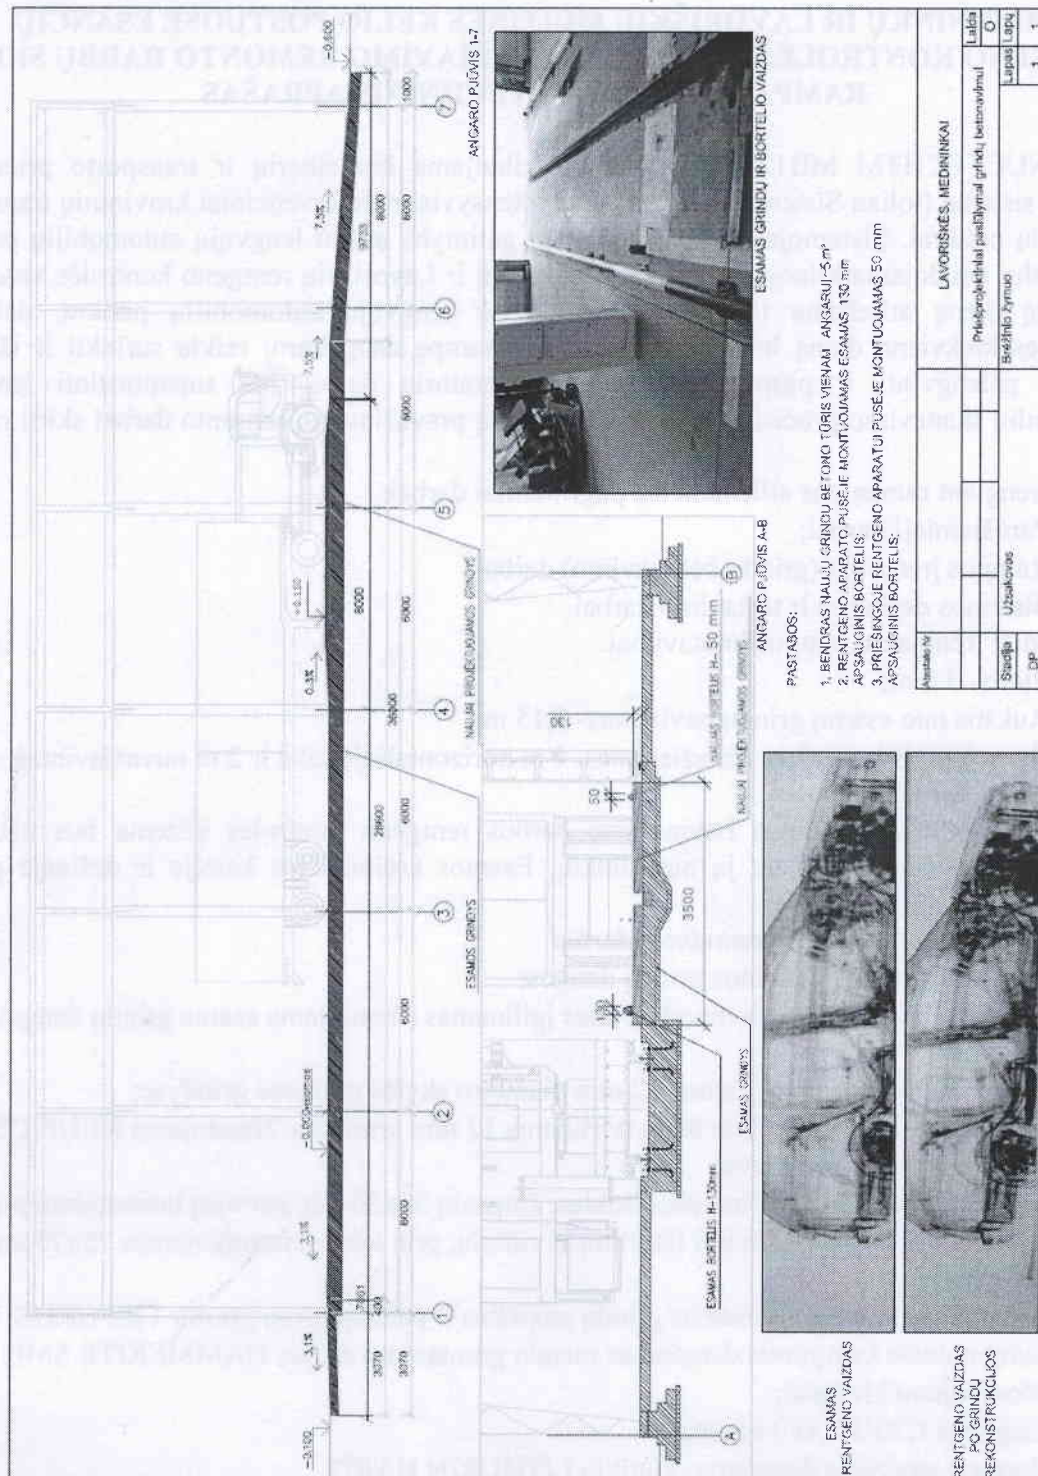

Sistemos derinimo ir testavimo darbai

Įrengus rampą atliekami tvarkymo darbai, sistemos derinimas ir testavimas. Įvertinama ar visos sistemos sudedamosios dalys funkcionuoja tinkama. Atliekami bandomieji skenavimai su įvairių tipų transporto priemonėmis.

2016 m. lapkričio 21 d.
Sutarties Nr. 16 VH (10) - 49
4 priedas

DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2016 m. _____ mėn. ____ d.

Statybos objektas: _____
(kelio posto pavadinimas)

Užsakovas: Vilniaus teritorinė muitinė

Rangovas: UAB „Inta“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2016 m. lapkričio ____ d. statybos rangos sutartimi Nr. _____

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2016 m. lapkričio ____ d. statybos rangos sutartį Nr. _____ yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja Užsakovo atstovas(ai)

bei Rangovo atstovas(ai) _____

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

a) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

b) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Pastabos:

Darbus priėmė:

Užsakovas

Darbus perdavė:

Rangovas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8~5) 216 72 11 Faks. (8~5) 216 72 12
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB Vilniaus bankas

Muitinės departamentas prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

ĮGALIOJIMAS

2016-11-20 Nr. 19
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė "INTA", įmonės kodas 110015560, įgalioja spec. projektų departamento vadovą Donatą Limantą, asmens kodas [redacted] pasirašyti Medininkų ir Lavoriškių muitinės kelio postuose esančių rentgeno kontrolės sistemų pravažiavimų remonto darbų, skirtų rampai atnaujinti, pirkimo-pardavimo sutartį.

Šis įgaliojimas galioja iki š.m. lapkričio 30 d.

Generalinis direktorius

Vytautas Vitkauskas

Kopija filius:

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis inspektorius

Saulius Malinauskas

2016 11 21
