



GENERALINIS
STATYBOS
RANGOVAS



Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui
Viešųjų pirkimo komisijai
Teikiama per CVP IS

2022-11-24 Nr. SR-221124-01AB
į 2022-11-17, Nr.A5-191
į 2022-11-21, Nr.11086830

DĖL PATIKSLINIMO

CVP IS priemonėmis UAB „Infes“ (toliau-Tiekėjas) 2022 m. lapkričio 18 d. gavo pranešimą Nr.A5-191 „Dėl komisijos priimtų sprendimų“ (toliau-Pranešimas), kuriame nurodyta, jog Komisija nusprendė, kad Tiekėjo kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs ir pasiūlė CVPIS priemonėmis patikslinti savo kvalifikacijos duomenis. Perkančioji organizacija 2022-11-21 pranešimu Nr. 11086830, nurodė Tiekėjui patikslinti kvalifikacijos duomenis ne vėliau kaip iki **2022 m. lapkričio 24 d. 14:00 val.**

Nepraleisdami nustatyto termino ir nekeisdami pasiūlymo esmės, patiksliname kvalifikacijos duomenis ir teikiame šiuos paaiškinimus:

1. Tiekėjas atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašė nurodė objektą „Mokslo paskirties pastato - Pastato-Mokyklos (unikalus KVR kodas 16014) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, kapitalinio remonto ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektas“. Perkančiajai organizacijai pateiktame Tiekėjo atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašė nurodyta, kad tinkamai atliktų svarbiausių statybos darbų vertė – 261 378,00 Eur be PVM. Pažymime, kad Tiekėjas į nurodytą darbų vertę neįtraukė projektavimo ir kitų paslaugų (53 200 Eur be PVM), restauravimo darbų (540 000 Eur be PVM), tvarkybos darbų (180 000 Eur be PVM), pridedame atliktų darbų aktą. Paaiškiname, kad tinkamai atliktų svarbiausių statybos darbų vertė gaunama: $1\,070\,860,14 - 53\,200 - 540\,000 - 180\,000 = 297\,660,14$ Eur be PVM. Kadangi Perkančiajai organizacijai pateiktame Tiekėjo atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašė padaryta skaičiavimo klaida (nurodyta, kad tinkamai atliktų svarbiausių statybos darbų vertė – 261 378,00 Eur be PVM, t.y. 36 282,14 Eur mažiau), teikiame patikslintą atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašą su ištaisyta skaičiavimo klaida.
2. Tiekėjas atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašė nurodė objektą „Trakų meno mokyklos, un. Nr. 7994-0007-8015, Karaimų g. 10, Trakų m., Trakų r. sav., rekonstravimo darbai“, sutarties vertė – 632 403,99 Eur be PVM. Perkančiajai organizacijai pateiktame Tiekėjo atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašė nurodyta, kad tinkamai atliktų svarbiausių statybos darbų vertė – 443 253,10 Eur be PVM. Pažymime, kad Tiekėjas į šią nurodytą darbų vertę neįtraukė atliktų darbų vertės, kuri nepatenka į 5 metų laikotarpį (per paskutinius 5 metus

iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos), kas sudaro 17 548,40 Eur be PVM (pridedame 2017-10-31 atliktų darbų aktą Nr. 02, kuris patvirtina, jog iki 2017-10-31 buvo atlikta darbų už 17 548,40 Eur be PVM sumą). Taip pat pažymime, kad Tiekėjas į šią nurodytą darbų vertę įtraukė atliktų darbų vertę savomis jėgomis, neįtraukiant pasitelktų subrangovų atliktų darbų vertės: 154 938,69 Eur be PVM (UAB „Fertig“, pridedamas atliktų darbų aktai); 13 480,58 Eur be PVM (UAB „Pažangūs projektai“, pridedamas atliktų darbų aktai su sąskaitomis); 2 109,92 Eur be PVM (UAB „Velansta“, pridedamas atliktų darbų aktas su sąskaitomis); 100 Eur be PVM (MB „Smelta“, sąskaita pridedama); 950 Eur be PVM (VŠĮ „Architektūros tyrimų centras“ pridedamas atliktų darbų aktas su sąskaita). Paaiškiname, kad tinkamai atliktų svarbiausių statybos darbų vertė gaunama: $632\,403,99 - 17\,548,40 - 154\,938,69 - 2\,109,92 - 100 - 950 = 443\,276,70$ Eur be PVM. Kadangi Perkančiajai organizacijai pateiktame Tiekėjo atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašė padaryta skaičiavimo klaida (nurodyta, kad tinkamai atliktų svarbiausių statybos darbų vertė – 443 253,10 Eur be PVM, t.y. 23,6 Eur mažiau), teikiame patikslintą atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašą su ištaisyta skaičiavimo klaida.

Priedama:

1. Patikslintas atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas;
2. „Mokslo paskirties pastato - Pastato-Mokyklos (unikalus KVR kodas 16014) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, kapitalinio remonto ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektas“ atliktų darbų aktas Nr.6, 2020-08-20 – 1 lapas.
3. „Trakų meno mokyklos, un. Nr. 7994-0007-8015, Karaimų g. 10, Trakų m., Trakų r. sav., rekonstravimo darbai“ atliktų darbų aktas Nr.02, 2017-10-31, 2 lapai.
4. UAB Fertig atliktų papildomų darbų aktas Nr.1, 2018.08.01, 3 lapai.
5. UAB Fertig atliktų papildomų darbų aktas Nr. 2, 2018.08.24, 3 lapai.
6. UAB Fertig atliktų papildomų darbų aktas Nr. 3, 2018.10.20, 2 lapai.
7. UAB Fertig atliktų papildomų darbų aktas Nr.5, 2018.10.29, 2 lapai.
8. UAB Fertig atliktų papildomų darbų aktas Nr.6, 2018.11.02, 2 lapai.
9. UAB Fertig atliktų papildomų darbų aktas Nr.4_2018.11.29, 2 lapai.
10. UAB Fertig atliktų darbų aktas Nr.6_2018.12.21, 5 lapai.
11. UAB Pažangūs projektų sprendimai priėmimo perdavimo aktas_2017.12.14, 2 lapai.
12. UAB Pažangūs projektų sprendimai priėmimo perdavimo aktas_2018.01.19, 2 lapai.
13. UAB Pažangūs projektų sprendimai priėmimo perdavimo aktas_2018.04.11, 2 lapai.
14. UAB Pažangūs projektų sprendimai priėmimo perdavimo aktas_2018.06.15, 2 lapai.
15. UAB Pažangūs projektų sprendimai priėmimo perdavimo aktas_2018.10.17, 2 lapai.
16. UAB Pažangūs projektų sprendimai priėmimo perdavimo aktas_2018.12.06, 3 lapai.
17. UAB Pažangūs projektų sprendimai priėmimo perdavimo aktas_2019.02.06, 2 lapai.
18. UAB Pažangūs projektų sprendimai priėmimo perdavimo aktas_2019.07.04, 2 lapai.



GENERALINIS
STATYBOS
RANGOVAS



19. UAB Velansta atliktų darbų aktas, 2019.02.06, 3 lapai.
20. MB Smelta, PVM sąskaita faktūra, 2018-11-28, 1 lapas.
21. VŠĮ Architektūros tyrimų centras Atliktu darbu aktas Nr.1, 2018.10.04, 2 lapai.

Viešųjų pirkimų projektų vadovė

Aurelija Bagdonienė

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas
LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 7300
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100



Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė AURELIJA, BAGDONIENĖ
Data: 2022-11-24 13:15:12

**PASTATO, VILNIAUS G. 41 A, VILNIUJE,
REKONSTRUKCIJOS IR TVARKYBOS DARBAI**


ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DABŲ* SĄRAŠAS

Patvirtinu, kad _____ per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino
(*ūkio subjekto pavadinimas*)
pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus:

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas / objektas (kultūros paveldo pastato pavadinimas, kodas, adresas, kt.)	Sutarties vertė, EUR be PVM	Tinkamai atliktų svarbiausių statybos darbų aprašymas, vertė, EUR be PVM	Svarbiausių statybos darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos)	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Užsakovo pavadinimas Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
1	Mokslo paskirties pastato - Pastato- Mokyklos (unikalus KVR kodas 16014) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, kapitalinio remonto ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektas	1070860,14	297 660,14	2019-06-06/ 2020-08-20	R	Alytaus rajono savivaldybės administracija, administracijos direktorė Gintarė <div></div>
2	Trakų meno mokyklos, un. Nr. 7994-0007- 8015, Karaimų g. 10, Trakų m.,	632 403,99	443 276,70	2017-05-18/ 2019-02-28	KP	Trakų rajono savivaldybės administracija, administracijos direktorius

	Trakų r. sav., rekonstravimo darbai. (KVR 37463)					Andrius Šatevičius
--	---	--	--	--	--	-----------------------

Viešųjų pirkimų projektų vadovė Aurelija Bagdonienė



(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

**Svarbiausi statybos darbai - kultūros paveldo pastato rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto ir/ar paprastojo remonto darbai (be projektavimo ir kitų paslaugų)*

Papildomas susitarimas NR. SUT-907 prie 2019 birželio 06 d. Sutarties SUT-459

PAŽYMA Nr. 1
APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTĘ

2020 m. balandžio mėn. 30 d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2019 m. 11 mėn. 05 d. iki 2020 m. 04 mėn. 30 d.

Rangovas: UAB "Infes", įmonės kodas 302947360, PVM mok. kodas LT100007393212, Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius**Užsakovas:** Alytaus rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188718528, Pulkų g. 21, LT-62135 Alytus**Objekto pavadinimas:** „Mokslų paskirties pastato – Pastato-Mokyklos (unikalus KVR kodas 16014) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, kapitalinio remonto ir tvarkomųjų**paveldosaugos darbų (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektas“****Papildomas susitarimas NR. SUT-907** prie 2019 birželio 06 d. Sutarties SUT-459

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Darbų (įnirrašų) pavadinimas	Sutartinė kaina, Eur be PVM	Darbų likutis, Eur be PVM	Įvykdyta darbų ir išlaidų kaina nuo statybos pradžios, Eur be PVM		
				Nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį	Iki ataskaitinio laikotarpio	Per ataskaitinį laikotarpį
I	2	3	4	5	6	7
I	Papildomi darbai					
I		7 240,15 €	0,00 €	7 240,15 €	0,00 €	7 240,15 €
II	Suma be PVM:	7 240,15 €	0,00 €	7 240,15 €	0,00 €	7 240,15 €
III	PVM 21%:	1 520,43 €	0,00 €	1 520,43 €	0,00 €	1 520,43 €
III	Iš viso su PVM:	8 760,58 €	0,00 €	8 760,58 €	0,00 €	8 760,58 €

Lentelė Nr. 2 Papildoma informacija (ataskaitinis mėnesis):

	%	Suma, Eurais
IV Išankstinių mokėjimų likutis (be PVM) iki ataskaitinio mėn., eurai	0	0,00 €
V Užskaitoma išankstinio mokėjimo suma, pagal išankstinio mokėjimo grąžinimo normą (nuo sumos be PVM) per ataskaitinį mėn., proc., eurai (I*V/100)	0	0,00 €
VI Išankstinių mokėjimų likutis (be PVM) po ataskaitinio mėn., eurai (IV-V)		0,00 €
VII Sulaikymas (nuo sumos be PVM), proc., eurai (I*VII/100)	0	0,00 €
VIII Suma apmokėjimui (be PVM) (I-V-VII)		7 240,15 €
IX Rangovui taikomas Genrangos mokestis (be PVM), proc., eurai (bus išskaitomas iš Rangovui mokėtinų sumos) (I*IX/100)	0	0,00 €

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, parašas)



Ypatingo stalinio statybos vadovas:

Rolandas Janulis

AM atstauto Nr. 31584

Dokumentas

PVM SĄSKAITA -FAKTŪRA

VŠĮ 18-121
2018 m. spalio 4 d.

Pardavėjas:

VŠĮ Architektūros tyrimų centras
(Pavadinimas)
Adutiškio g. 5-12, Vilnius
(Buveinė)
302695710
(Įmonės kodas)
LT 100007665618
(PVM mokėtojo kodas)
sąsk. LT 627300010129631001
AB Swedbank

Pirkėjas:

UAB "INFES"
(Pavadinimas)
Žirmūnų g. 27, Vilnius
(Adresas)
302947360
(Įmonės kodas)
LT100007393212
(PVM mokėtojo kodas)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kaina (be PVM), €	Suma, €
1	2	3	4	5
1	Architektūros tyrimai archeologinių tyrimų metu, sklype Karaimų g. 10, Trakai atidengtų statinių liekanų vietose. Tyrimų - tikslas nustatyti liekanų chronologiją ir būklę.	1	950,00	950,00
	Pagal 2018-09-20 sutartį Nr. 2018/09 20	Iš viso	Viso	950,00
			PVM 21%	199,50
			Bendra suma	1149,50

Suma žodžiais: vienas tūkstantis keturiasdešimt devyni eurai 50 ct

Sąskaitą išrašė direktorė Vitalija Veževičienė

(Asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-a vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos)

Gavo:

pareigos, vardas, pavardė, parašas

Staty





Adutiškio g. 5 – 12, LT- 02112, Vilnius., Tel. +370 65558235, faksas +370 5 2138190, el.p. architekturostyrimai@gmail.com; į/k. 302695710, A.s. LT627300010129631001 AB bankas Swedbank, kodas 73000

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS Nr. 1

2018 m. spalio 4 d.

Vilnius

Užsakovas: UAB „INFES“

Vykdytojas: VšĮ „Architektūros tyrimų centras“

A/s LT 627300010129631001 AB Swedbank.

Mes, žemiau pasirašę, surašėme šį aktą apie atliktus darbus, kurie atlikti vykdant 2018 m. rugpjūčio 16 d., sutarties Nr. 2018/09/16.

Objektas: Karaimų g. 10, Trakai

Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina, €	Įvykdymas			Apmo- kėti darbai iki ataskai- tinio mėnesio	Priklauso apmokėti, €
		nuo darbų pradžios	nuo metų pradžios	Iš jų per ataskait. mėn.		
1	2	3	4	5	6	7
Architektūros tyrimai archeologinių tyrimų metu, sklype Karaimų g. 10, Trakai, atidengtų statinių liekanų vietose. Tyrimų tikslas - nustatyti liekanų chronologiją ir būklę.	1149,50	1149,50	1149,50	1149,50	-	1149,50
IŠ VISO, €	1149,50					1149,50

Užsakovas:

Vykdytojas:

Direktorė Vytė Vaitiekaitė



1912417



VELANSTA UAB

PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA
SERIJA VEL NR 05071

UAB "Velansta"
Tel.: 246 2247
Moštrų g. 9, Vilnius
El.p. velansta@velansta.lt
www.velansta.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT34 7044 0600 0158 3787
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
PVM mokėtojo kodas: LT 258755219
Įmonės kodas: 126875523
Rejestro Nr. AB2002-55 2002 01 17

Data: 2019-02-06


Gavėjas: UAB "INFES"
Mokėtojas: UAB "INFES"
Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės (asmens) kodas: 302947360
PVM mokėtojo kodas: LT 100007393212

Apmokėjimas: 10 k.d.

Pavadinimas	Mat, vnt.	Kiekis	Kaina	Suma, €
Už 2019 m. vasario mėn. atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą Nr. 1, prie sutarties Nr. 181220/1	kompl.	1	2109,92	2109,92
Objektas: Karaimų g. 10, Trakai				
Suma be PVM:				2 109,92
PVM 21%:				443,08
Iš viso:				2 553,00

Suma žodžiais:
Du tūkstantčiai penki šimtai penkiasdešimt trys Eurai, 00 ct.

Sąskaitą išrašė:
Administratore - apskaitininkė
Lina Zabarauskaitė




Sąskaitą gavo:

PVM įstatymo 96 str.
Mokama suma be PVM

Atvirkštinis apmokestinimas

Darbu vadovas
Kęstutis Skikas

GAMYBA IR MONTAVIMAS
Plastikiniai ir aliumininiai langai, durys, žiemos sodai
www.velansta.lt

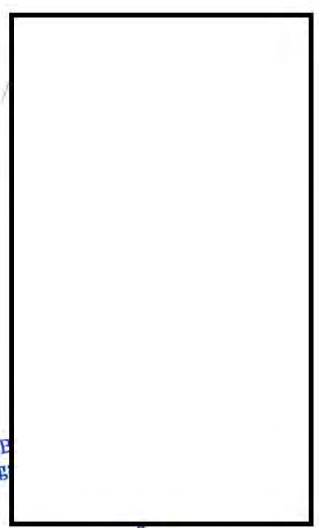

Auding

Sutartis Nr. 181220/1

ATLIKTO DARBU AKTAS Nr. 1

už 2019 m. vasario mėn.

F-2

Užsakovas: UAB „INFES“
Rangovas: UAB "Vėlansta"
Objekto pavadinimas: Karainių g. 10, Trakai

Eil.Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)				per 2019 m. vasario mėn.			
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso €	Kiekis	Vnt. kaina	Viso €	Kiekis	Vnt. kaina	Viso €	Kiekis	Viso €
1	Vidaus pertvara	m ²	3,45	557,817	1924,47	3,45	557,817	1924,47	3,45	557,817	1924,47		
2	Montavimo darbai	m ²	3,45	45,06	155,45	3,45	45,06	155,45	3,45	45,06	155,45		
3	Transportavimo išlaidos	vnt.	1	30,00	30,00	1	30,00	30,00	1	30,00	30,00		
	IS viso be PVM				2109,92			2109,92			2109,92		
	PVM 21 %				443,08			443,08			443,08		
	VISO				2553,00			2553,00			2553,00		

Suma žodžiais: Du tūkstantiai penki šimtai penkiasdešimt trys Eurai 00 ct.

Priėmė:

Užsakovas:

Parigys, V. Juvardis, parąšas

2019 m. vasario mėn. 06 d.

A.V.

Perdavė:

Rangovas:

Parigys, V.

2019 m. vasario mėn.

Durbų va
Kėstutis

PAŽŪJIA Nr. 1
APIE ATLIEKŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTĘ

už 2019 m. vasario mėn. atliktus darbus

Rungtys: UAB "Irelansta" Meistrų g. 9, Vilnius, Įmonės kodas 125875323, Atsiskaitymoji sąskaita LT34 7044 0600 0158 3787, AB SEB bankas, b/k 70440

Užsakovas: UAB „INFES“

Objekto pavadinimas: Karūmų g. 10, Trakai

Sutarties Nr. 181220/1

Eil. Nr.	Darbo (paslaugų) pavadinimas	Sutartinė kaina, € be PVM	Darbo ilgas, € be PVM	Našų surinkimo pradėtos, pakeičiamos, atstatytos mėn.	Našų atstatytos mėn.	Per atstatytos mėn.
1	2		4	5	6	7
1	Vidaus patvara	1924,47	0,00	1924,47	0,00	1924,47
2	Montavimo darbai	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45
3	Transportavimo išlaidos	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Suma be PVM:	2109,92	0,00	2109,92	0,00	2109,92
	PVM 21%:	443,08	0,00	443,08	0,00	443,08
	Iš viso su PVM:	2553,00	0,00	2553,00	0,00	2553,00

Suma žodžiais: Du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimi trys Eurai 00 ct.

Priėmė:

Užsakovas:

Pareigos V. Pasardė, parašas

2019 m. vasario mėn. 06 d.

A.V.

Perdavė:

Rangovas:

2019 m. vasario mėn.

Darbo vadovs
Kęstutis S.

144

2019-07-23

PVM sąskaita – faktūra Serija PPS Nr. 3/1907/

2019 m. liepos mėn. 4 d.

Pardavėjo pavadinimas:

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"

Įmonės kodas: 302470286

Įmonės PVM kodas: LT 100005683516

Atsiskaitomoji sąskaita: LT36 7044 0600 0733 8664

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Adresas: V. Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius

Pirkėjo pavadinimas:

UAB "INFES"

Įmonės kodas: 302947360

Įmonės PVM kodas: LT 100007393212

Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eurais	Suma eurais
Architektūrinės dalies darbo projekto korektūra	1	1	500,00	500,00
ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS				
2019-07-04 Nr. DPA-3/1907/				

	IŠ VISO:	500,00
	PVM 21%:	105,00
Šeši šimtai penki eurai, 00 cent.	IŠ VISO SU PVM:	605,00

Pardavėjas:	direkt	
Pirkėjas:	D K	



UAB „INFES“

[monės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Tel. (8 5) 2313209, fax.: (8 5) 2107687

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"

[monės kodas 302470286, V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius,
tel.(8-656) 14394

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2019-07-04 Nr. DPA-3/1907/
Vilnius

Mes, UAB „INFES“ (toliau – Užsakovas), ir UAB “Pažangūs projektų sprendimai“ (toliau – Projektuotojas), šiuo aktu pažymime, kad Projektuotojas atliko ir Užsakovui perdavė sutartį darbą: **Architektūrinės dalies darbo projekto korektūrą** ir tokiu būdu įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

Užsakovas patvirtina, kad neturi pretenzijų dėl atliktų sutartinių darbų kokybės.

Atliktų darbų vertė – 605,00 Eur (šeši šimtai penki eurai, 00 cnt.), įskaitant PVM (105,00 Eur).

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui sutartinę kainą, lygią 605,00 Eur (šeši šimtai penki eurai, 00 cnt.), įskaitant PVM (105,00 Eur).

Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Projektuotojui.

Priėmė

A.V.

Perdavė

Darbu vadovas

Aidas Jastrė

PVM sąskaita – faktūra Serija PPS Nr. 1/1902/

2019 m. vasario mėn. 6 d.

Pardavėjo pavadinimas:
UAB "Pažangūs projektų sprendimai"
 Įmonės kodas: 302470286
 Įmonės PVM kodas: LT 100005683516
 Atsiskaitomoji sąskaita: LT36 7044 0600 0733 8664
 AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440
 Adresas: V. Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius

Pirkėjo pavadinimas:
UAB "INFES"
 Įmonės kodas: 302947360
 Įmonės PVM kodas: LT 100007393212
 Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eurais	Suma eurais
Elektrotechninės ir žaibosaugos dalies darbo projektas PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 2017-06-05 Nr. 144S-170605/2 ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS 2019-02-06 Nr. DPA-1/1902/	1	1	1.009,80	1.009,80

	IŠ VISO:	1.009,80
	PVM 21%:	212,06
Vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt vienas euras, 86 cent.	IŠ VISO SU PVM:	1.221,86

Pardavėjas:	dir
Pirkėjas:	Projek A



Proj 144

UAB „INFES“

Įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Tel. (8 5) 2313209, fax.: (8 5) 2107687

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"

Įmonės kodas 302470286, V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius,
tel.(8~656) 14394

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2019-02-06 Nr. DPA-1/1902/
Vilnius

Mes, UAB „INFES“ (toliau – Užsakovas), ir UAB "Pažangūs projektų sprendimai" (toliau – Projektuotojas), šiuo aktu pažymime, kad Projektuotojas atliko ir Užsakovui perdavė 2017 m. birželio mėn. 5 d. Sutartyje Nr.144S-170605/2 (toliau – Sutartis) nurodytą sutartį darbą: **Elektrotechninės ir žaibosaugos dalies darbo projektą** ir tokiu būdu įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

Užsakovas patvirtina, kad neturi pretenzijų dėl atliktų sutartinių darbų kokybės.

Atliktų darbų vertė – 1.221,86 Eur (vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt vienas euras, 86 cnt.), įskaitant PVM (212,06 Eur).

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui sutartinę kainą, lygią 1.221,86 Eur (vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt vienas euras, 86 cnt.), įskaitant PVM (212,06 Eur).

Šis aktas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Projektuotojui.

Priėmė

A.V.

Perdavė



PVM sąskaita – faktūra Serija PPS Nr. 12/1812/

2018 m. gruodžio mėn. 6 d.

Pardavėjo pavadinimas:

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"

Įmonės kodas: 302470286

Įmonės PVM kodas: LT 100005683516

Atsiskaitomoji sąskaita: LT36 7044 0600 0733 8664

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Adresas: V. Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius

Pirkėjo pavadinimas:

UAB "INFES"

Įmonės kodas: 302947360

Įmonės PVM kodas: LT 100007393212

Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eurais	Suma eurais
Nauji lauko pandusų ir terasos įrengimo konstrukcinius sprendinius, kurie nebuvo numatyti Techninio projekto (Nr. TP-29-50) sprendiniuose PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 2017-06-05 Nr. 144S-170605/2 PAPOLDOMAS SUSITARIMAS 2018-09-14 Nr.3 ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS 2018-12-06 Nr. DPA-12/1812/	1	1	650,00	650,00

	IŠ VISO:	650,00
	PVM 21%:	136,50
Septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 50 cent.	IŠ VISO SU PVM:	786,50

Pardavėjas:	
Pirkėjas:	

144

Kataž

[Redacted Signature Box]

[Handwritten Signature]

UAB „INFES“
Įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Tel. (8 5) 2313209, fax.: (8 5) 2107687

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"
Įmonės kodas 302470286, V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius,
tel.(8-656) 14394

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2018-12-06 Nr. DPA-12/1812/
Vilnius

Mes, UAB „INFES“ (toliau – Užsakovas), ir UAB “Pažangūs projektų sprendimai“ (toliau – Projektuotojas), šiuo aktu pažymime, kad Projektuotojas atliko ir Užsakovui perdavė 2017 m. birželio mėn. 5 d. Sutartyje Nr.144S-170605/2 (toliau – Sutartis) ir 2018 m. rugsėjo mėn. 14 d. Papildomame susitarime Nr.3 nurodytą sutartį darbą: **Naujus lauko pandusų ir terasos įrengimo konstrukcinius sprendinius, kurie nebuvo numatyti Techninio projekto (Nr.TP-29-50) sprendiniuose** ir tokiu būdu įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

Užsakovas patvirtina, kad neturi pretenzijų dėl atliktų sutartinių darbų kokybės.

Atliktų darbų vertė – 786,50 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 50 cnt.), įskaitant PVM (136,50 Eur).

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui sutartinę kainą, lygią 786,50 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 50 cnt.), įskaitant PVM (136,50 Eur).

Šis aktas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Projektuotojui.

Priėmė

Perdavė



Uždaroji akcinė bendrovė "Pažangūs projektų sprendimai"

V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius, tel.(8-656) 14394, el. p. aidas.jastremskas@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302470286, PVM mokėtojo kodas LT100005683516

UAB „INFES“
Žirmūnų g. 27, Vilnius

2018-12-06 Nr. 12/06
Į 2018- - Nr.
Vilnius

DĖL PERDUODAMŲ DOKUMENTŲ

UAB „Pažangūs projektų sprendimai“, vadovaudamiesi 2017-06-05 Projektavimo paslaugų sutartimi Nr.144S-170605/2 ir 2018-09-14 Papildomu susitarimu Nr.3, parengėme ir perduodame Meno mokyklos pastato (Un. Nr.7994-0007-8015), Karaimų g. 10, Trakai, rekonstravimo darbo projektą:

- 1. Naujus lauko pandusų ir terasos įrengimo konstrukcinius sprendinius, kurie nebuvo numatyti Techninio projekto (Nr.TP-29-50) sprendiniuose (atspausdinta ir surišta 3 egz.);**
- 2. Darbų perdavimo ir apmokėjimo dokumentai (pagal 2017-06-05 Sutartį Nr.144S-170605/2 ir 2018-09-14 Papildomą susitarimą Nr.3):**
 - 2.1. Perdavimo-priėmimo aktas – 2 egz.;
 - 2.2. PVM sąskaita-faktūra – 2 egz.;

Prašome, po vieną pasirašytą ir antspauduotą egzempliorių (2 p.) gražinti adresu: UAB „Pažangūs projektų sprendimai“ V. Grybo g. 34-100, LT- 10318 Vilnius, arba pateikti raštišką atsisakymą pasirašyti siunčiamus dokumentus, nurodant nepasirašymo priežastis, bei gražinti nepasirašytus dokumentus per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos.

Perdavė:

Priėmė:



144

PVM sąskaita – faktūra Serija PPS Nr. 10/1810/

2018 m. spalio mėn. 17 d.

Pardavėjo pavadinimas:

UAB “Pažangūs projektų sprendimai”

Įmonės kodas: 302470286

Įmonės PVM kodas: LT 100005683516

Atsiskaitomoji sąskaita: LT36 7044 0600 0733 8664

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Adresas: V. Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius

Pirkėjo pavadinimas:

UAB “INFES”

Įmonės kodas: 302947360

Įmonės PVM kodas: LT 100007393212

Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eurai	Suma eurai
Architektūrinės dalies darbo projektas PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 2017-06-05 Nr. 144S-170605/2 PAPOLDOMAS SUSITARIMAS 2018-05-30 Nr.2 ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS 2018-10-17 Nr. DPA-10/1810/	1	1	2.876,00	2.876,00

	IŠ VISO:	2.876,00
	PVM 21%:	603,96
Trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 96 cnt.	IŠ VISO SU PVM:	3.479,96

Pardavėjas: direktorius

Pirkėjas: statybos proj.
Aurimas

016 Suleika Rytė
07.10.2018 J. K. Kung

UAB „INFES“
Įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Tel. (8 5) 2313209, fax.: (8 5) 2107687

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"
Įmonės kodas 302470286, V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius,
tel.(8~656) 14394

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2018-10-17 Nr. DPA-10/1810/
Vilnius

Mes, UAB „INFES“ (toliau – Užsakovas), ir UAB "Pažangūs projektų sprendimai" (toliau – Projektuotojas), šiuo aktu pažymime, kad Projektuotojas atliko ir Užsakovui perdavė 2017 m. birželio mėn. 5 d. Sutartyje Nr.144S-170605/2 (toliau – Sutartis) ir 2018 m. gegužės mėn. 30 d. Papildomame susitarime Nr.2 nurodytą sutartį darbą: **Architektūrinės dalies darbo projektą** ir tokiu būdu įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

Užsakovas patvirtina, kad neturi pretenzijų dėl atliktų sutartinių darbų kokybės.

Atliktų darbų vertė – 3.479,96 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 96 cnt.), įskaitant PVM (603,96 Eur).


Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui sutartinę kainą, lygią 3.479,96 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 96 cnt.), įskaitant PVM (603,96 Eur).

Šis aktas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Projektuotojui.

Priėmė A.V.

Perdavė

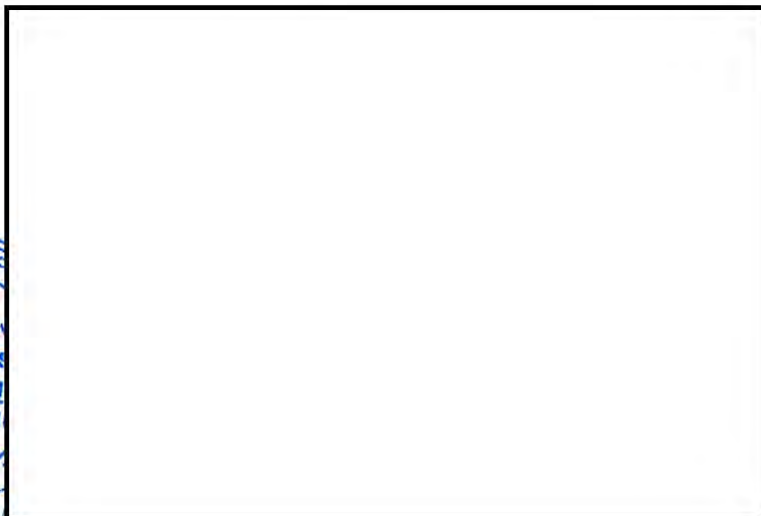

PVM sąskaita – faktūra Serija PPS Nr. 5/1806/

2018 m. birželio mėn. 15 d.

Pardavėjo pavadinimas:

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"

Įmonės kodas: 302470286

Įmonės PVM kodas: LT 100005683516

Atsiskaitomoji sąskaita: LT36 7044 0600 0733 8664

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Adresas: V. Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius

Pirkėjo pavadinimas:

UAB "INFES"

Įmonės kodas: 302947360

Įmonės PVM kodas: LT 100007393212

Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eurais	Suma eurais
Grindų, sėramų, balkono, pandusų ir terasos įrengimo sprendinių konstrukcinių darbo projektas	1	1	2.409,04	2.409,04
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 2017-06-05 Nr. 144S-170605/2				
ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS 2018-06-15 Nr. DPA-5/1806/				

	IŠ VISO:	2.409,04
	PVM 21%:	505,90
Du tūkstančiai devyni šimtai keturiolika eurų, 94 cent.	IŠ VISO SU PVM:	2.914,94

Pardavėjas:	direktorius Aidas J
Pirkėjas:	* Statinio statybos vadovas Tomas Amšiejus Kvalifikacijos atestato Nr. 3

UAB "INFES"

UAB „INFES“
Įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Tel. (8 5) 2313209, fax.: (8 5) 2107687

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"
Įmonės kodas 302470286, V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius,
tel.(8-656) 14394

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2018-06-15 Nr. DPA-5/1806/
Vilnius

Mes, UAB „INFES“ (toliau – Užsakovas), ir UAB "Pažangūs projektų sprendimai" (toliau – Projektuotojas), šiuo aktu pažymime, kad Projektuotojas atliko ir Užsakovui perdavė 2017 m. birželio mėn. 5 d. Sutartyje Nr.144S-170605/2 (toliau – Sutartis) ir 2017 m. rugsėjo mėn. 6 d. Papildomame susitarime Nr.1 nurodytą sutartį darbą: **Grindų, sąramų, balkono, pandusų ir terasos įrengimo sprendinių konstrukcinių darbo projektą** ir tokiu būdu įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

Užsakovas patvirtina, kad neturi pretenzijų dėl atliktų sutartinių darbų kokybės.

Atliktų darbų vertė – 2.914,94 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai keturiolika eurų, 94 cnt.), įskaitant PVM (505,90 Eur).

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui sutartinę kainą, lygią 2.914,94 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai keturiolika eurų, 94 cnt.), įskaitant PVM (505,90 Eur).

Šis aktas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Projektuotojui.

Priėmė

Perdavė



Statinio statybos vadovas
Tomas Amšiejus
atlikęs at... 32

Aidas Jastremskas

PVM sąskaita – faktūra Serija PPS Nr. 03/1804/

2018 m. balandžio mėn. 11 d.

Pardavėjo pavadinimas:

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"

Įmonės kodas: 302470286

Įmonės PVM kodas: LT 100005683516

Atsiskaitomoji sąskaita: LT36 7044 0600 0733 8664

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Adresas: V. Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius

Pirkėjo pavadinimas:

UAB "INFES"

Įmonės kodas: 302947360


Įmonės PVM kodas: LT 100007393212

Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eurais	Suma eurais
Projekto vadovo darbas, vėdinimo darbo projekto dalis	1	1	1.441,00	1.441,00
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 2017-06-05 Nr. 144S-170605/2				
ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS 2018-04-11 Nr. DPA-03/1804/				

	IŠ VISO:	1.441,00
	PVM 21%:	302,61
Vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 61 cent.	IŠ VISO SU PVM:	1.743,61

Pardavėjas:	direktorius Aidas Jastremskas	
Pirkėjas:	Statnio Tomas	



UAB „INFES“
Įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Tel. (8 5) 2313209, fax.: (8 5) 2107687

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"
Įmonės kodas 302470286, V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius,
tel.(8~656) 14394

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2018-04-11 Nr. DPA-03/1804/
Vilnius

Mes, UAB „INFES“ (toliau – Užsakovas), ir UAB “Pažangūs projektų sprendimai“ (toliau – Projektuotojas), šiuo aktu pažymime, kad Projektuotojas atliko ir Užsakovui perdavė 2017 m. birželio mėn. 5 d. Sutartyje Nr.144S-170605/2 (toliau – Sutartis) nurodytą sutartį darbą: **Projekto vadovo darbą ir vėdinimo darbo projekto dalį** ir tokiu būdu įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

Užsakovas patvirtina, kad neturi pretenzijų dėl atliktų sutartinių darbų kokybės.

Atliktų darbų vertė – 1.743,61 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 61 cnt.), įskaitant PVM (302,61 Eur).


Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui sutartinę kainą, lygią 1.743,61 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 61 cnt.), įskaitant PVM (302,61 Eur).

Šis aktas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Projektuotojui.

Priėmė

Perdavė



Aidas Jastremskas

Specialiųjų statybos
darbų vadovas
Mantas Miliauskas



PVM sąskaita – faktūra Serija PPS Nr. 01/1801/

2018 m. sausio mėn. 19 d.

Pardavėjo pavadinimas:

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"

Įmonės kodas: 302470286

Įmonės PVM kodas: LT 100005683516

Atsiskaitomoji sąskaita: LT36 7044 0600 0733 8664

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Adresas: V. Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius

Pirkėjo pavadinimas:

UAB "INFES"

Įmonės kodas: 302947360

Įmonės PVM kodas: LT 100007393212

Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eurais	Suma eurais
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo, vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, šilumos punkto, gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių darbo projekto dalys PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 2017-06-05 Nr. 144S-170605/2 ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS 2018-01-19 Nr. DPA-01/1801/	1	1	1.702,18	1.702,18

	IŠ VISO:	1.702,18
	PVM 21%:	357,46
Du tūkstančiai penkiasdešimt devyni eurai, 64 cnt.	IŠ VISO SU PVM:	2.059,64

Pardavėjas:	direktorius	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; display: inline-block;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 60px; display: inline-block;"></div>
Pirkėjas:	<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 70px; display: inline-block;"></div>		

(144)

UAB „INFES“
Įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Tel. (8 5) 2313209, fax.: (8 5) 2107687

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"
Įmonės kodas 302470286, V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius,
tel.(8~656) 14394

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2018-01-19 Nr. DPA-01/1801/
Vilnius

Mes, UAB „INFES“ (toliau – Užsakovas), ir UAB "Pažangūs projektų sprendimai" (toliau – Projektuotojas), šiuo aktu pažymime, kad Projektuotojas atliko ir Užsakovui perdavė 2017 m. birželio mėn. 5 d. Sutartyje Nr.144S-170605/2 (toliau – Sutartis) nurodytą sutartį darbą: **Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo, vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, šilumos punkto, gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių darbo projekto dalis** ir tokiu būdu įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

Atliktų darbų vertė – 2.059,64 Eur (du tūkstančiai penkiasdešimt devynis eurai, 64 cnt.), įskaitant PVM (357,46 Eur).

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui sutartinę kainą, lygią 2.059,64 Eur (du tūkstančiai penkiasdešimt devyni eurai, 64 cnt.), įskaitant PVM (357,46 Eur).

Šis aktas yra neatskiriama Sutarties dalis.


Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kuriu vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Projektuotojui.

Priėmė

A. V.



Perdavė



mskas

PVM sąskaita – faktūra Serija PPS Nr. 15/1712/

2017 m. gruodžio mėn. 14 d.

Pardavėjo pavadinimas:

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"

Įmonės kodas: 302470286

Įmonės PVM kodas: LT 100005683516

Atsiskaitomoji sąskaita: LT36 7044 0600 0733 8664

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Adresas: V. Grybo g. 34-100, LT-10318 Vilnius

Pirkėjo pavadinimas:

UAB "INFES"

Įmonės kodas: 302947360

Įmonės PVM kodas: LT 100007393212

Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina eurais	Suma eurais
Naujo stogo įrengimo, šilumos punkto patalpos rūsyje įrengimo ir pastato laiptinės įrengimo konstrukcinių sprendinių darbo projektas PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 2017-06-05 Nr. 144S-170605/2 ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS 2017-12-14 Nr. DPA-15/1712/	1	1	2.892,56	2.892,56

	IŠ VISO:	2.892,56
	PVM 21%:	607,44
Trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 cent.		IŠ VISO SU PVM: 3.500,00

Pardavėjas:	direktorius Aidas J.	
Pirkėjas:		

UAB „INFES“
Įmonės kodas 302947360, Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Tel. (8 5) 2313209, fax.: (8 5) 2107687

UAB "Pažangūs projektų sprendimai"
Įmonės kodas 302470286, V. Grybo g. 34-100, 10318 Vilnius,
tel.(8~656) 14394

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2017-12-14 Nr. DPA-15/1712/
Vilnius

Mes, UAB „INFES“ (toliau – Užsakovas), ir UAB “Pažangūs projektų sprendimai“ (toliau – Projektuotojas), šiuo aktu pažymime, kad Projektuotojas atliko ir Užsakovui perdavė 2017 m. birželio mėn. 5 d. Sutartyje Nr.144S-170605/2 (toliau – Sutartis) ir 2017 m. rugsėjo mėn. 6 d. Papildomame susitarime Nr.1 nurodytą sutartį darbą: **Naujo stogo įrengimo, šilumos punkto patalpos rūsyje įrengimo ir pastato laiptinės įrengimo konstrukcinių sprendinių darbo projektą** ir tokiu būdu įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

Užsakovas patvirtina, kad neturi pretenzijų dėl atliktų sutartinių darbų kokybės.

Atliktų darbų vertė – 3.500,00 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 cnt.), įskaitant PVM (607,44 Eur).

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Projektuotojui sutartinę kainą, lygią 3.500,00 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 cnt.), įskaitant PVM (607,44 Eur).

Šis aktas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šis aktas yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Užsakovui ir vienas – Projektuotojui.

Priėmė A.V.

Perdavė



144

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija FER Nr.001117

2018-12-21

Pardavėjas:

UAB "FERTIG"
Adresas: Eigulių g. 2, Vilnius
Įm. kodas: 302421079
PVM mokėt. kodas: LT 100004849816
a.s.: LT883920090033022532

Gavėjas:

UAB "INFES"
Adresas: Žirmūnų g.27, Vilnius
Įm. kodas: 302947360
PVM mokėt. kodas: LT100007393212

Apmokėti iki 2019-01-21

Kodas	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vnt.kaina, EUR	Suma, EUR
	Sąskaita pagal atliktų darbų aktą Nr.1 prie sutarties Nr.144S-180702/14	vnt	1	8356,14	8356,14

Suma(be PVM) 8356,14

PVM 21%: 1754,79

Bendra suma EUR: 10110,93

Viso EUR: 10110,93

PASTABA: Pagal PVM ĮSTATYMĄ 96 str. atvirkštinis apmokėjimas - PVM išskaito ir sumoka pirkėjas.

Dešimt tūkstančių šimtas dešimt EUR ir 93 ct

(suma žodžiais)

PVM sąskaitą faktūrą išrašė:

PVM sąskaitą faktūrą gavo:



245 m. nu
5% Suburk

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.6

Už 2018 m. Gruodžio mėn.

Rangovas:
Užsakovas:
Statybos pavadinimas:
Sutarties Nr.

UAB "FERTIG"
UAB "INFES"
Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10,
144S-180702/14

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)			Per 2018 m. Gruodžio mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.
	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	m2	605,43	7	4238,01	776,34	7	5434,38	0	7	0,00
	Sienu apdaila gipskartonio plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles	m2	605,43	6,5	3935,30	776,34	6,5	5046,21	0	6,5	0,00
	Angokraščių aptaisymas GK plokštėmis klijuojant ar sukanant (pagal faktą)	m	1	12	12,00	286,38	12	3436,56	0	12	0,00
	Sienu apdaila gipskartonio plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius (kartotinis sluoksnis)	m2	403,63	7	2825,41	776,34	7	5434,38	0	7	0,00
	Sienu aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant	m2	201,81	7,5	1513,58	57	7,5	427,50	0	7,5	0,00
	Sienu aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	260,29	19	4945,51	0	19	0,00	0	19	0,00
	Vidinių paviršių tinkavimas kalkių - cemento skiediniu	m2	983,94	9	8855,46	990,65	9	8915,85	0	9	0,00
	Gipskartonio pertvarų įrengimas, aptaisant dviem gipskartonio sluoksniais	m2	482,63	13,50	6515,51	514,34	13,50	6943,59	0	13,50	0,00
	Tinkuotų arba betono sienu labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	m2	1710,99	13	22242,87	2584,39	13	33597,07	321,39	13	4.178,07
	Paruoštų dažymui sienu surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	1710,99	13	22242,87	2584,39	13	33597,07	321,39	13	4.178,07
	Tinkuotų arba betono sienu labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	m2	366,37	13	4762,81	465,55	13	6052,15	0	13	0,00
	Paruoštų dažymui lubų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	366,37	13	4762,81	465,55	13	6052,15	0	13	0,00
	Lengvų profilių tvirtinimas prie paviršių	m2	516,65	6	3099,90	479,75	6	2878,50	0	6	0,00
	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	m2	516,65	8,5	4391,53	479,75	8,5	4077,88	0	8,5	0,00

Lubų karkasų papildomas aptaisymas gipso kartono plokštėmis	m2	24,28	7	169,96	479,75	7	3358,25	0	7	0,00
Pakabinamų armstrong lubų įrengimas	m2	424,51	13,5	5730,89	0	13,5	0,00	0	13,5	0,00
Akmens masės plytelių danga	m2	157,26	19	2987,94	450,2	19	8553,80	0	19	0,00
Hidroizoliacijos įrengimas suklijuojant izoliacines juosta ir tepant 2 kartus (pagal faktą)	m2	1	5	5,00	95	5	475,00	0	5	0,00
Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostėmis	m2	213,8	6	1282,80	213,8	6	1282,80	0,0	6	0,00
Iš viso be PVM				104520,135			135.563,14			8.356,14
PVM 21%:				21.949,23			28.468,26			1.754,79
Iš viso su PVM:				126.469,37			164031,39			10.110,93

Perdavė:

Rangovas: Direktorius Nerijus Vidžiūnas

Parei

2018 m. Gruodžio

Priėmė:

Užsakovas:

Pareigos V.Pavardė, parašas

2018 m. ____ mėn. ____ d. A.V.



PAŽYMA Nr. 6

už 2018m. Gruodžio mėn.

Rangovas : **UAB "FERTIG"**Užsakovas: **UAB "INFES"**

Statybos pavadinimas: „Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10,“
Sutarties Nr. 144S-180702/14

Išlaidų kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina, EUR be PVM	Nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį mėn.	Iki ataskaitinio mėn	Per ataskaitinį mėn.
1	2	3	4	5	6
	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	4238,01	5434,38	5434,38	0,00
	Sienų apdaila gipskartonio plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles	3935,295	5046,21	5046,21	0,00
	Angokrasčių aptaisymas GK plokštėmis klijuojant ar sukant (pagal faktą)	12	3436,56	3436,56	0,00
	Sienų apdaila gipskartonio plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius (kartotinis sluoksnis)	2825,41	5434,38	5434,38	0,00
	Sienų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant	1513,575	427,50	427,50	0,000
	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	4945,51	0,00	0,00	0,000
	Vidinių paviršių tinkavimas kalkių - cemento skiediniu	8855,46	8915,85	8915,85	0,00
	Gipskartonio pertvarų įrengimas, aptaisant dviem gipskartonio sluoksniais	6515,505	6943,59	6943,59	0,00
	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	22242,87	33597,07	29419,00	4178,07
	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	22242,87	33597,07	29419,00	4178,07
	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	4762,81	6052,15	6052,15	0
	Paruoštų dažymui lubų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	4762,81	6052,15	6052,15	0
	Lengvų profilių tvirtinimas prie paviršių	3099,9	2878,50	2878,50	0,00
	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	4391,525	4077,88	4077,88	0,00
	Lubų karkasų papildomas aptaisymas gipso kartono plokštėmis	169,96	3358,25	3358,25	0,00

Pakabinamų armstrong lubų įrengimas	5730,885	0,00	0,00	0
Akmenų masės plytelių danga	2987,94	8553,80	8553,80	0
Hidroizoliacijos įrengimas suklįjuojant izoliacinę juostą ir tepant 2 kartus (pagal faktą)	5	475,00	475,00	0
Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostėmis	1282,8	1282,80	1282,80	0,00
Iš viso:	104520,135	135.563,14	127.207,00	8.356,14
PVM 21%:	21.949,23	28.468,26	26.713,47	1.754,79
Iš viso su PVM:	126.469,36	164.031,40	153.920,47	10.110,93


Rangovas: Direktorius Ne

P.

Užsakovas: Pareigos, V.Pavardė, parašas

2018 m. C

2018 m. Gruodžio mėn. ____ d.

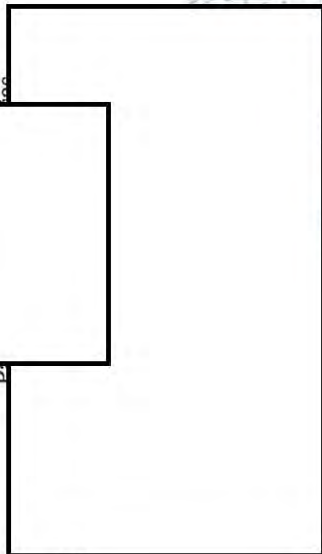

144

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija FER Nr.001097

2018-11-29

Pardavėjas:

UAB "FERTIG"
Adresas: Eigulių g. 2, Vilnius
Įm. kodas: 302421079
PVM mokėt. kodas: LT 100004849816
a.s.: LT883920090033022532

Gavėjas:

UAB "INFES"
Adresas: Žirmūnų g.27, Vilnius
Įm. kodas: 302947360
PVM mokėt. kodas: LT100007393212

Apmokėti iki 2018-12-29

Kodas	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vnt.kaina, EUR	Suma, EUR
	Sąskaita pagal atliktų darbų aktą Nr.4 prie sutarties Nr.144S-180702/14 Papildomi darbai	vnt	1	6377,31	6377,31

Suma(be PVM) 6377,31

PVM 21%: 1339,24

Bendra suma EUR: 7716,55

Viso EUR: 7716,55

PASTABA: Pagal PVM ĮSTATYMĄ 96 str. atvirkštinis apmokėjimas - PVM išskaito ir sumoka pirkėjas.

Septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiolika EUR ir 55 ct

(suma žodžiais)

PVM sąskaitą faktūrą išrašė:

PVM sąskaitą faktūrą gavo:

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.4
Už 2018 m. lapkričio mėn.

Rangovas:
Užsakovas:
Statybos pavadinimas:
Sutarties Nr.

UAB "FERTIG"
UAB "INFES"
Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10,
144S-180702/14 papildomi darbai

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)				Per 2018 m. spalio mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	
1	GK papildomi apsiuvimai, vamzdynai, kolonos (korobai)	kompl	28	150	4200,00	28	150	4200,00	28	150	4.200	
2	GK lubos įrengimas	m2	101,27	21,5	2177,31	101,27	21,50	2177,31	101,27	21,50	2.177	
					6377,305			6.377,31			6.377,31	
					PVM 21%: 1.339,23			1.339,23			1.339,23	
					Iš viso su PVM: 7.716,54			7716,54			7.716,54	

Perdavė:
Rangovas: D
Pa
2018 m. lapkričio

Darbu vadov
Kęstutis Skilp

144

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija FER Nr.001102

18-11-2

Pardavėjas:

UAB "FERTIG"
Adresas: Eigulių g. 2, Vilnius
Įm. kodas: 302421079
PVM mokėt. kodas: LT 100004849816
a.s.: LT883920090033022532

Gavėjas:

UAB "INFES"
Adresas: Žirmūnų g.27, Vilnius
Įm. kodas: 302947360
PVM mokėt. kodas: LT100007393212

Apmokėti iki 2018-11-17

Kodas	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vnt.kaina, EUR	Suma, EUR
	Sąskaita pagal atliktų darbų aktą Nr.6 prie sutarties Nr.144S-180702/14 Papildomi	vnt	1	5239,26	5239,26
Suma(be PVM)					5239,26
PVM 21%:					1100,24
Bendra suma EUR:					6339,50
Viso EUR:					6339,50

PASTABA: Pagal PVM ĮSTATYMĄ 96 str. atvirkštinis apmokėjimas - PVM išskaito ir sumoka pirkėjas.

Šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni EUR ir 50 ct

(suma žodžiais)

PVM sąskaitą faktūrą išrašė:

PVM sąskaitą faktūrą gavo:

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.6

Už 2018 m. Lapkričio mėn.

Rangovas:

Užsakovas:

Statybos pavadinimas:

Sutarties Nr.

UAB "FERTIG"

UAB "INFES"

Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10,

144S-180702/14 papildomi darbai

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)				Per 2018 m. lapkričio mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	
1	Polių tersaas betonavimas ir pagalvių betonavimas	kompl	1	1.600	1600,00	1	1.600	1600,00	1	1.600	1.600	
2	Betonas su transportu	m3	3,3	94,2	310,96	3,3	94,20	310,86	3,3	94,20	311	
3	Laiptų su pandusu įrengimas, laiptų iš kiemo pusės įrengimas, laiptų prie rūšio įrengimas, užpilimas smėliu, atraminės sienutės formavimas, polių grėžimas	kompl	1	3.140,0	3140,00	1	3.140	3140,00	1	3140,00	3.140	
4	Betonas su transportu	m3	2	94,2	188,40	2	94,20	188,40	2	94,20	188	
	Iš viso be PVM				5239,359			5.239,26			5.239,26	
	PVM 21%:				1.100,27			1.100,24			1.100,24	
	Iš viso su PVM:				6.339,63			6339,50			6.339,50	

Perdavė:

Rangovas: D

Priėmė:

Užsakovas:

Pareigos V.Pavardė, parašas

2018 m. lapkričio mėn 02 d.

144

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija FER Nr.001098

2018-10-29

Pardavėjas:

UAB "FERTIG"
Adresas: Eigulių g. 2, Vilnius
Įm. kodas: 302421079
PVM mokėt. kodas: LT 100004849816
a.s.: LT883920090033022532

Gavėjas:

UAB "INFES"
Adresas: Žirmūnų g.27, Vilnius
Įm. kodas: 302947360
PVM mokėt. kodas: LT100007393212

Apmokėti iki 2018-11-29

Kodas	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vnt.kaina, EUR	Suma, EUR
	Sąskaita pagal atliktų darbų aktą Nr.5 prie sutarties Nr.144S-180702/14 Papildomi darbai	vnt	1	778,98	778,98

Suma(be PVM) 778,98

PVM 21%: 163,59

Bendra suma EUR: 942,57

Viso EUR: 942,57

PASTABA: Pagal PVM ĮSTATYMĄ 96 str. atvirkštinis apmokėjimas - PVM išskaito ir sumoka pirkėjas.

Devyni šimtai keturiasdešimt du EUR ir 57 ct

(suma žodžiais)

PVM sąskaitą faktūrą išrašė:

PVM sąskaitą faktūrą gavo:

1/6 gen. rang

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.5
Už 2018 m. spalio mėn.

Rangovas:
Užsakovas:
Statybos pavadinimas:
Sutarties Nr.

UAB "FERTIG"
UAB "INFES"
Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10,
144S-180702/14 papildomi darbai

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)				Per 2018 m. spalio mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	
1	Betoninių laiptų šrengimo darbai	kompl	1	600	600,00	1	600	600,00	1	600	600	
2	Betonas su transportu	m3	1,9	94,2	179,04	1,9	94,20	178,98	1,9	94,20	179	
	Iš viso be PVM				779,037			778,98			778,98	
	PVM 21%:				163,60			163,59			163,59	
	Iš viso su PVM:				942,64			942,57			942,57	

Perdavė:
Rango

2018 m



144

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija FER Nr.001094

2018-10-20

Pardavėjas:

UAB "FERTIG"
Adresas: Eigulių g. 2, Vilnius
Įm. kodas: 302421079
PVM mokėt. kodas: LT 100004849816
a.s.: LT883920090033022532

Gavėjas:

UAB "INFES"
Adresas: Žirmūnų g.27, Vilnius
Įm. kodas: 302947360
PVM mokėt. kodas: LT100007393212

Apmokėti iki 2018-11-20

Kodas	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vnt.kaina, EUR	Suma, EUR
	Sąskaita pagal atliktų darbų aktą Nr.1 prie sutarties Nr.144S-180702/14 Papildomi darbai	vnt	1	2285	2285,00

Suma(be PVM) 2285,00

PVM 21%: 479,85

Bendra suma EUR: 2764,85

Viso EUR: 2764,85

PASTABA: Pagal PVM ĮSTATYMĄ 96 str. atvirkštinis apmokėjimas - PVM išskaito ir sumoka pirkėjas.

Du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt keturi EUR ir 85 ct

(suma žodžiais)

PVM sąskaitą faktūrą išrašė:

(v)

PVM sąskaitą faktūrą gavo:

(v)

5% Sėdai kyma
1% Sen. nanga

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.3
Už 2018 m. spalio mėn.

Rangovas:
Užsakovas:
Statybos pavadinimas:
Sutarties Nr.

UAB "FERTIG"
UAB "INFES"
Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10,
144S-180702/14 papildomi darbai



Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina			Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)			Per 2018 m. spalio mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Vnt. kaina	Viso EUR.
1	„Starbų užtaisymas po elektrikų, silpnų srovių ir santechnikų sienų išdaužymų	kompl	1	600,0	600,00	1	600,0	600,00	1	600,0
2	GK papildomi apsiuvimai, vamzdynai, kolonos (korobai)	kompl	15	150	2250,00	20	150	3000,00	5	150
3	kolonų paruošimas dekoravimas ir dažymas	kompl	1	200,0	200,00	1	200	200,00	1	200,0
4	Paruošimas palangių montavimui visame objekte	kompl	1	450	450,00	1	450	450,00	1	450
5	Deformacinių siulių įrengimas	kompl	1	100,0	100,00	1	100,0	100,00	1	100,0
6	Vamzdžių apklijavimas	kompl	1	100,0	100,00	1	100	100,00	1	100,0
7	Medžiagų pirkimas suderinta su Kėstu	kompl	1	85	85,00	1	85	85,00	1	85
					3785,000			4.535,00		2.285,00
					794,85			952,35		479,85
					4.579,85			5487,35		2.764,85

Perdavė:
Rangovas

Priėmė:
Užsakovas: Pareigos V.Pavardė, parašas

2018 m. S

2018 m. mėn. d. A.V.



144

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija FER Nr.001082

2018-08-24

Pardavėjas:

UAB "FERTIG"
Adresas: Eigulių g. 2, Vilnius
Įm. kodas: 302421079
PVM mokėt. kodas: LT 100004849816
a.s.: LT883920090033022532

Gavėjas:

UAB "INFES"
Adresas: Žirmūnų g.27, Vilnius
Įm. kodas: 302947360
PVM mokėt. kodas: LT100007393212

Apmokėti iki 2018-09-24

Kodas	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vnt.kaina, EUR	Suma, EUR
	Sąskaita pagal atliktų darbų aktą Nr.1 prie sutarties Nr.144S-180702/14 Papildomi darbai	vnt	1	2670	2670,00
Suma(be PVM)					2670,00
PVM 21%:					560,70
Bendra suma EUR:					3230,70
Viso EUR:					3230,70

PASTABA: Pagal PVM ĮSTATYMĄ 96 str. atvirkštinis apmokėjimas - PVM išskaito ir sumoka pirkėjas.

Trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt EUR ir 70 ct
(suma žodžiais)

PVM sąskaitą faktūrą išrašė:

PVM sąskaitą faktūrą gavo:

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.2
Už 2018 m. rugpjūčio mėn.

UAB "FERTIG"
UAB "INFES"

Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10.
144S-180702/14 papildomi darbai

Rangovas:
Užsakovas:
Statybos pavadinimas:
Sutarties Nr.

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)				Per 2018 m. rugpjūčio mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	
3	Garų izoliacinės plėvelės montavimas, su „šukų“CD12 sumontavimas	m2	330	2,5	825,00	330	2,5	825,00	0	2,5	0	
4	GK papildomi apsiuvimai, vamzdynai, kolonos (korobai)	kompl	15	150	2250,00	15	150	2250,00	10	150	1.500	
	Papildomo GK pertvaros užsukant dviem sluoksniais įrengimas su apsiltinimu ir plevele	m2	350	14,5	5075,00	0	0	0,00	0	14,5	0	
	Stogo karnizo išardymas ir perdarymas(stogeliai)	kompl	1	1.000	1000,00	1	1.000	1000,00	1	1.000	1.000	
	Dazytu paviršiu aliejiniais dažais/ kreida skutimas gruntavimas	m2	200	1,7	340,00	100	1,7	170,00	100	1,7	170	
	Vidaus palangių įrengimas,pagal faktą (be medžiagos)	m	150	5,6	840,00	0	0	0,00	0	5,6	0	
5	Nešančios stogo konstrukcijos perdarymas mansardiniame aukšte	kompl	1	450	450,00	1	450	450,00	0	450	0	
	Iš viso be PVM				10780,000			4.695,00			2.670,00	
	PVM 21%:				2.263,80			985,95			560,70	
	Iš viso su PVM:				13.043,80			5680,95			3.230,70	

Prėmė:
Užsakovas: Pareigos V.Pavardė, parašas

Perdavė:
Rangovas: Direk Pareigos V.Pavardė, parašas

2018 m. ru

PAŽYMA Nr. 2

už 2018m. Rugpjūčio mėn.

Rangovas: **UAB "FERTIG"**Užsakovas: **UAB "INFES"**

Statybos pavadinimas: „Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10, “

Sutarties Nr. 144S-180702/14 papildomi darbai

Išlaidų kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina, EUR be PVM	Nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį mėn.	Iki ataskaitinio mėn	Per ataskaitinį mėn.
I	2	3	4	5	6
	Garų izoliacinės plėvelės montavimas, su „šuku“CD12 sumontavimas	825	825	825	0
	GK papildomi apsiuvimai, vamzdynai, kolonos (korobai)	2250	2250	750	1500
	Papildomo GK pertvaros užsakant dviem sluoksniais įrengimas su apšiltinimu ir plevele	5075	0	0	0
	Stogo karnizo išardymas ir perdarymas(stogeliai)	1000	1000	0	1000
	Dazytu paviršiu aliejiniais dažais/ kreida skutimas gruntavimas	340	170	0	170
	Vidaus palangių įrengimas,pagal faktą (be medžiagos)	840	0	0	0
	Nešančios stogo konstrukcijos perdarymas mansardiniame aukšte	450	450	450	0
	Iš viso:	10780,000	4.695,00	2.025,00	2.670,00
	PVM 21%:	2.263,80	985,95	425,25	560,70
	Iš viso su PVM:	13.043,80	5.680,95	2.450,25	3.230,70

Rangovas: Direktor

2018 m. rugpjūčio m

A.V.

Užsakovas:

Pareigos, V.Pavardė, parašas

2018 m. rugpjūčio mėn. d.

144

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serijs FER Nr.001074-1

2018-08-01

Pardavėjas:

UAB "FERTIG"
Adresas: Eigulių g. 2, Vilnius
Įm. kodas: 302421079
PVM mokėt. kodas: LT 100004849816
a.s.: LT883920090033022532

Gavėjas:

UAB "INFES"
Adresas: Žirmūnų g.27, Vilnius
Įm. kodas: 302947360
PVM mokėt. kodas: LT100007393212

Apmokėti iki 2018-08-23

Kodas	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vnt.kaina, EUR	Suma, EUR
	Sąskaita pagal atliktų darbų aktą Nr.1 prie sutarties Nr.144S-180702/14 Papildomi darbai	vnt	1	2025	2025,00

Suma(be PVM) 2025,00

PVM 21%: 425,25

Bendra suma EUR: 2450,25

Viso EUR: 2450,25

PASTABA: Pagal PVM ĮSTATYMĄ 96 str. atvirkštinis apmokėjimas - PVM išskaito ir sumoka pirkejas.

Du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt EUR ir 25 ct

(suma žodžiais)

PVM sąskaitą faktūrą išrašė:

PVM sąskaitą faktūrą gavo:

30.08.2018

PAŽYMA Nr. 1

už 2018m. Rugpjūčio mėn.

Rangovas: **UAB "FERTIG"**Užsakovas: **UAB "INFES"**

Statybos pavadinimas: „Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10,“

Sutarties Nr. 144S-180702/14 papildomi darbai

Išlaidų kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina, EUR be PVM	Nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį mėn.	Iki ataskaitinio mėn	Per ataskaitinį mėn.
1	2	3	4	5	6
	Garo izoliacinės plėvelės montavimas, su „šukų“CD12 sumontavimas	825	825		825
	GK papildomi apsiuvimai, vamzdynai, kolonos (korobai)	2250	750		750
	Nešančios stogo konstrukcijos perdarymas mansardiniame aukšte	450	450		450
	Iš viso:	108045,135	2.025,00		2.025,00
	PVM 21%:	22.689,48	425,25		425,25
	Iš viso su PVM:	130.734,61	2.450,25		2.450,25

Ra

201

Užsakovas:

Pareigos, V.Pavardė, parašas

2018 m. rugpjūčio mėn. ____ d.

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.1
Už 2018 m. rugpjūčio mėn.

Rangovas:
Užsakovas:
Statybos pavadinimas:
Sutarties Nr.

UAB "FERTIG"
UAB "INFES"
Trakų meno mokyklos rekonstrukcijos darbai, Karaimų g.10,
144S-180702/14 papildomi darbai

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant ataskaitinį mėnesį)				Per 2018 m. liepos mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso EUR.	
3	Garų izoliacinės plėvelės montavimas, su „Šuklės“CD12 sumontavimas	m2	330	2,5	825,00	330	2,5	825,00	330	2,5	825	
4	GK papildomi apsiuvimai, vamzdynai, kolonos (korobai)	kompl	15	150	2250,00	5	150	750,00	5	150	750	
5	Nešančios stogo konstrukcijos perdarymas mansardiniame aukšte	kompl	1	450	450,00	1	450	450,00	1	450	450	
					3525,000			2.025,00			2.025,00	
					740,25			425,25			425,25	
					4.265,25			2450,25			2.450,25	
	Iš viso be PVM											
	PVM 21%:											
	Iš viso su PVM:											

Perdavė:

Rangovas: D

2018 m. rugp

Priėmė:

Užsakovas:

Pareigos V.Pavardė, parašas

2018 m. _____ mėn. _____ d. **INFES** A.V.



ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.02

2017 m. spalio mėn. 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo rugpjūčio 31d. iki spalio 31 d.

Rangovas: UAB Infes

Užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: T1-64

Sutarties pavadinimas: Meno mokyklos pastato rekonstravimo įrengiant patalpas pastogėje, patalpų perplanavimo, fasadų, stogo konstrukcijų remonto, stogo dangos keitimas Trakuose, Karaimų g. 10.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytus sutarties Nr. T1-64 etapą. Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos Eurais

Eil.Nr. pagal įkainotų veiklų sąrašą	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina, be PVM	Atliktų darbų (paslaugų) nuo statybų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
1.1.	Architektūros darbai	220 540,79	1,30	2 867,03	1,00	2 205,41	0,30	661,62
1.2.	Statinio konstrukcijos	62 133,95	4,00	2 485,36	0,00	0,00	4,00	2 485,36
1.3.	Šaltas vandentiekis	2 632,64	22,00	579,18	22,00	579,18	0,00	0,00
1.4.	Nuotekos	5 481,52	11,00	602,97	11,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Vėdinimas	5 565,57	2,00	111,31	2,00	111,31	0,00	0,00
1.6.	Elektros tinklai	18 957,09	0,30	56,87	0,30	56,87	0,00	0,00
1.7.	Apsauginė signalizacija	3 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Gaisrinė signalizacija	4 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Elektroniniai ryšiai	2 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Žaibosauga	1 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Renovavimo darbai	156 440,57	2,00	3 128,81	0,60	938,64	1,40	2 190,17
2.2.	Kanalai šild. vamzdinių tiesimui	11 730,00	39,00	4 574,70	35,00	4 105,50	4,00	469,20
2.3.	Karštas vandentiekis	4 253,72	14,00	595,52	14,00	595,52	0,00	0,00

2.4.	Šildymo sistema	18 509,29	10,00	1 850,93	10,00	1 850,93	0,00	0,00
2.5.	Elektros tinklai	5 549,99	1,00	55,50	1,00	55,50	0,00	0,00
2.6.	Šilumos punktas	8 558,21	4,00	342,33	4,00	342,33	0,00	0,00
3.1.	Lauko nuotekynės įrengimas	735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Lauko vandentiekio tinklai	5 957,81	5,00	297,89	5,00	297,89	0,00	0,00
Suma be PVM:		539 022,63 €		17 548,40 €		11 139,08 €		5 806,35 €
PVM (21%), suma		113 194,75 €		3 685,16 €		2 339,21 €		1 219,33 €
Suma su PVM		652 217,38 €		21 233,56 €		13 478,29 €		7 025,68 €

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Užsakovo

2017 m.

Techninė

2017 m.

Rangovo atstovas

2017 m.



Užsakovo
Techninė

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 6 Data 2020-08-20

Užsakovas: Alytaus rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188718528, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Rangovas: UAB "Infes", įmonės kodas 302947360, PVN mok. kodas LT100007393212, Žirniūnų g. 27, 09105 Vilnius
Objektas: „Mokslų paskirties pastato – Pastato-Mokyklos (unikalus KVR kodas 16014) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, kapitalinio remonto ir tvarkomųjų pavidlosaugos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmes pašalinimo) projektas“
Sudaryta už 2020 m. birželio-rugpjūčio mėn.

eil. Nr	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto parengimas	35,500.00	100.00	0.00	0.00
2	Tvarkybos darbų brėžinių ir techninių specifikacijų parengimas	17,700.00	100.00	0.00	0.00
3	Griovimo darbai	10,700.00	100.00	0.00	0.00
4	Statinio architektūros įrengimo darbai	53,000.00	100.00	0.00	0.00
5	Lauko ir vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai	39,000.00	100.00	0.00	0.00
6	Šildymo ir vėdinimo darbai	32,000.00	100.00	0.00	0.00
7	Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbai	75,500.00	100.00000	1.56246	1,178.99
8	Technologijos (virtuvės įrangos montavimo) darbai	650.00	100.00	100.00	650.00
9	Sklypo sutvarkymo darbai	20,500.00	100.00	0.00	0.00
10	Šilumos gamybos darbai	22,200.00	100.00	0.00	0.00
11	Gaisrinės saugos darbai	570.00	100.00	10.00	57.00
12	Restauravimo darbai	540,000.00	100.00	0.00	0.00
13	Rūsio patalpų įrengimo darbai	17,700.00	100.00	0.00	0.00
14	Rūsio inžinerinių sistemų įrengimo darbai	13,300.00	100.00	0.00	0.00
15	Tvarkybos darbai	180,000.00	100.00	0.00	0.00
16	Artezinio gręžinio įrengimo darbai	5,300.00	100.00	0.00	0.00
Suma be PVM (Eur):				PVM 21%:	1,885.99
					396.06
Bendra suma su PVM (Eur):					2,282.05

Užsą
Alyta

Rangovas:
UAB "Infes"

atimio s
angas
AM atestato Nr. 31584
KPD atestato Nr. 0019
d.

UAB "Infes"

2020 m.
