

2025-09-16; S-1647

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

SUTARTIES PAVADINIMAS		PIENIŲ G., DOMEIKAVOS K., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI- UŽSAKYMAS NR. 1	
SUTARTIES DATA		Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse	SUTARTIES NR. Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA			Paskutinio šalies parašo data nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA			V1
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA			Netaikoma
1. ŠALYS:			
1.1. Užsakovas (1.1.49 p.)	1.1.1. Pavadinimas	Kauno rajono savivaldybės administracija	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	188756386	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas	nėra	
	1.1.6. Banko sąskaita	LT914010042503135057	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+37037305502 info@krs.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Mantas Rikteris info@krs.lt	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Gintaras Vasilavičius Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjas +370 (37) 303 037 gintaras.vasilavicius@krs.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
1.2. Rangovas (1.1.29 p.)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Kauno keliai“	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)	Lietuvos Respublika	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas	135640993	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas	LT356409917	
	1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.)	LT51 7044 0600 0389 7125	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas	R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas	
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. + 370 61492158 El. p. info@kaunokeliai.lt	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	Kristina Mockapetrienė Tel. +370 698 08249 El.p. info@kaunokeliai.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.):			
2.1. Projektuotojas	2.1.1. Pavadinimas	MB „Inout.designstudio“	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas	305608454	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas	Polocko g. 56-59, 01205 Vilnius	

	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. +370 618 38182 El. p. info@sksp.lt
	2.1.5. Statinio projekto vadovas	Mindaugas Gaigalas
2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas	2.2.1. Pavadinimas	MB „Inout.designstudio“
	2.2.2. Juridinio asmens kodas	305608454
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas	Polocko g. 56-59, 01205 Vilnius
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. +370 618 38182 El. p. info@sksp.lt
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	Mindaugas Gaigalas
2.3. Techninės priežiūros rangovas	2.3.1. Pavadinimas	nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo pranešimu
	2.3.2. Juridinio asmens kodas	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	
	2.3.5. Techninis priežiūrėtojas	
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		
3.1. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Pienių gatvės rekonstravimas, Jungiamojo kelio rekonstravimas, Nuotekų šalinimo tinklai, Apšvietimo tinklai I etapas - darbai ruožui nuo Rytmečio g. iki Vyturių g.
	3.1.2. Adresas	Kelias (gatvė) - Pienių gatvė
	3.1.3. Unikalus Nr.	4400-2175-6790 (Kelias (gatvė) - Pienių gatvė), 4400-5097-6252 (Nuotekų šalinimo tinklai)
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Inžineriniai statiniai
3.2. Žemės sklypas	3.2.1. Pavadinimas	Žemės sklypas
	3.2.2. Adresas	Pienių g., Domeikavos k., Kauno r. sav.
	3.2.3. Unikalus Nr.	Žr. projektuose
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas
5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas
6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą
7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		Neribojama
8. KAINA:		
8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)		256 198,35
8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)		256 198,35
8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)		310 000,00
8.4. Pelnas, procentais (1.1.22 p.)		5%
8.5. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)		☒ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos
8.6. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.)		15% Pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio
8.7. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)		☐ – pažymėti, jeigu <u>netaikoma</u> Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu <u>netaikomas</u> pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu <u>nėra ribojamas</u> peržiūros dažnumas

8.8. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristatčius		Netaikoma
9. AVANSAS:		
9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)		Netaikoma
9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)		Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)		Netaikoma
11. TERMINAI (11.1.1 p.):		
11.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)		Darbai turi būti atlikti per 120 kalendorinių dienų nuo statybvietės perdavimo dienos.
12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):		
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 5 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas
12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)		10 metų
12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams		20 metų
12.4. Įrenginio Garantinis terminas		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 2 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; (iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas
13. DRAUDIMAS:		
13.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	13.1.1. Statybos darbų draudimo suma	Statybos darbų atkuriamoji vertė
	13.1.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita	Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
	13.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
	13.1.4. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita	Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
14. ATSAKOMYBĖ:		
14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai, darbų vykdymas neatitinkant pirkimo sąlygų priede „VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI“ aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo reikalavimų)		500 EUR už kiekvieną atvejį
14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų)		5 000 EUR
14.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdančys asmenys)		5 000 EUR už kiekvieną atvejį
14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)		500 EUR už kiekvieną atvejį
14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)		500 EUR už kiekvieną atvejį
14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai)		5000 EUR už kiekvieną atvejį
14.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)		100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną
14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)		100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną
14.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)		0,04% nuo sekančią dieną po termino suėjimo neatliktų darbų vertės be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną

14.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.	0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
14.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas)	100 EUR už kiekvieną atvejį
14.12. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)	100 EUR už kiekvieną atvejį
15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:	
15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	☒ – banko garantija ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas
15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4. p.)	5 % nuo Pradinės sutarties vertės
15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
16. GINČO KALBA (29.9 p.)	Lietuvių kalba
17. PRIEDAI:	
17.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau) – priedas nepridedamas, dokumentai skelbiami CVP IS;
17.2. Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis (pirkimo dokumentų Techninė specifikacija su priedais);
17.3. Priedas Nr. 3	Statinio projektas – priedas nepridedamas, perduodamas įsigaliojus Sutarčiai
17.4. Priedas Nr. 4	Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas – priedas netaikomas;
17.5. Priedas Nr. 5	Darbų kainų žiniaraštis - priedas atskirai nepridedamas, Darbų kainų žiniaraštis yra Rangovo pasiūlymo dalis (Priedas Nr. 6);
17.6. Priedas Nr. 6	Rangovo pasiūlymas;
17.7. Priedas Nr. 7	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis – priedas netaikomas;
17.8. Priedas Nr. 8	Subrangovų sąrašo forma;
17.9. Priedas Nr. 9	Specialistų sąrašas;
17.10. Priedas Nr. 10	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;
17.11. Priedas Nr. 11	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
17.12. Priedas Nr. 12	Atliktų darbų akto forma;
17.13. Priedas Nr. 13	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;
17.14. Priedas Nr. 14	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;
17.15. Priedas Nr. 15	Susitarimo forma.
18. NUORODA Į BENDRAŠIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):	skelbiama CVP IS kartu su kitais Pirkimo dokumentais
19. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos):	
Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai:	
1. Bendrųjų sąlygų 16.2.11 punkte nurodytas 15 dienų atsiskaitymo terminas keičiamas į 30 dienų. 2. Bendrųjų sąlygų 6.4.8 punktas keičiamas taip: „Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Turi būti naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, todėl Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą ne mažiau nei vieną kompiuterinę darbo vietą, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą. Elektroninį statybos darbų žurnalą nuperka Rangovas ir perleidžia Užsakovui su visomis teisėmis ne vėliau kaip iki statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. 3. Bendrųjų sąlygų 1.1.3 punkto pastaba panaikinama.	

Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektriniais parašais

PAGRINDINĖS SUTARTIES PRIEDAS NR. 1
PIRKIMO DOKUMENTAI

Skelbiami CVP IS , pirkimo Nr. 3069612

<https://viesiejiirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3069612>

VIEŠOJO PIRKIMO „PIENIŲ G., DOMEIKAVOS K., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI“ (SKELBTA 2025-04-07 CVP IS, PIRKIMO NR. 3069612) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

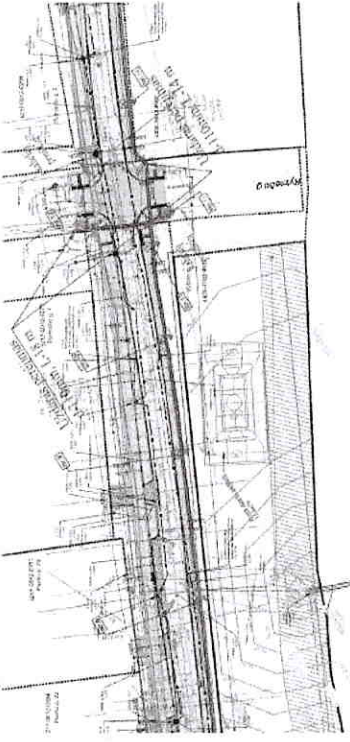
Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
1	2025-06-11 237109	Pirkimo sąlygos	Prašome įkelti į CVPIS SPS priedą 11.1.7. Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui.	Pateikta.	2025-07-02
2	2025-06-13 241623	Pasiūlymo forma	Gal būtų galimybė - pateikti excel failą "atrakintą"?	Pasiūlymas turi būti pateiktas Excel faile neatlikus jokių formos pakeitimų, todėl turi būti teikiamas užrakintas.	2025-07-02
3	2025-06-13 241742	Pirkimo sąlygos	Prie konkurso dokumentų pridedamoje TDP projekto Nuotekų šalinimo dalyje paminėta, kad "Detali geologinių tyrimų ataskaita pateikta projekto pridedamuosiuose dokumentuose." Ar galite pateikti šią ataskaitą ?	Geologinė ataskaita yra Bendrojoje dalyje.	2025-07-02
4	2025-06-16 242505	Techninė specifikacija	Priede Nr. 2 "Pasiūlymo forma" 1.5 eilutėje numatyta Kertamų medžių atkuriamoji vertė. 19 305,00 įrašyta į kiekis stulpelį, bet galimai tai kertamų medžių atkuriamoji vertė. Ar šią vertę 1305,00 eur Rangovai turi įrašyti ir stulpelį "Suma Eur, be PVM. ir priskutuoti prie bendros darbų vertės?	Medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia. Pataisytas kiekis žiniaraštis	2025-07-02
5	2025-06-16 242505	Techninė specifikacija	Ar keičiami arba naujai dedami šulinių liukai turi būti su miesto simbolika ?	Be miesto simbolikos.	2025-07-02
6	2025-06-16 242539	Techninė specifikacija	Del kabelių apsaugojimo. Projekte, susisiekimo dalyje, numatyta apsauginiai surenkami HDPE D100 mm vamzdžiai ryšių ir elektros kabeliams	Ryšių kabelių apsaugojimas nenumatomas šiuo projektu. Ryšių tinklai apsaugomi ir iškeliamos spintos kitu projektu.	2025-07-02

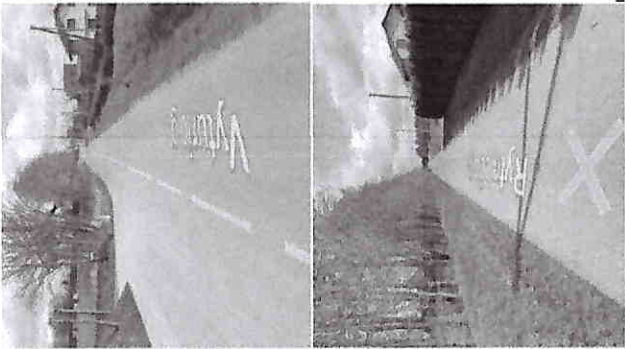
7.3	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai ryšių kabeliams	m	1730
7.4	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams	m	19

Tuo tarpu Priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ numatyta tik apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams, o ryšių kabeliams nenumatyta 1730 m. Prašome patikslinti ar ryšių kabelių apsaugoti nereiks?

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
7	2025-06-16 242618	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti koks turės būti asfalto viršutinis sluoksnis. Pastūlymo formoje numatyta AC 11 VN, tuo tarpu SMG projekto TS ir skersiniuose AC 8 VN.	Turi būti naudojamas AC 11 VN, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje (P2308-XX-R-TDP-SMG-TS, p. 11)	2025-07-02
8	2025-06-16 242654	Techninė specifikacija	Projekto SMD TS pateikta reikalavimai dangos šiuurkštinimui (II ASFALTAS 24). Pastūlymo formoje, kiekuose, dangos pašiuurkštinimas nenumatytas. Prašome papildyti dangos šiuurkštinimo kiekaiais arba patvirtinti, kad šių darbų atlikti nereikalausite.	Ne, nebus reikalaujama. Tačiau įrengta dangą privalo atitikti IT 2025-07-02 ASFALTAS 08 reikalavimus dėl dangos struktūros ir sukibimo (žr. P2308-XX-R-TDP-SMG-TS, p. 13).	
9	2025-06-16 242779	Techninė specifikacija	Prašau pateikti projektuojamų suoliukų specifikacijas.	P2308-XX-R-TDP-SMG-TS 11 skyriuje pateikta suoliuko 2025-07-02 specifikacija.	
10	2025-06-16 243198	Techninė specifikacija	Ar teisingai nurodytas pozicijų 3.2.3 ir 3.2.6 kiekiai (jungiamojo kelio dangos konstrukcijos įrengimas). Nes m ir m2 kiekis vienodas.	Pateiktas P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ kiekių žiniaraštis punktai 3.2.3 ir 3.2.6 su patikslintu kiekiu	2025-07-02
11	2025-06-16 243198	Techninė specifikacija	Dangų plane pavaizduota šios ardomos dangos - Ardoma asfalto danga; - Ardoma žvyro danga; - Ardoma trinkelų danga; - Ardoma betono danga;	Žvyro dangą įvertinta žemės darbų 2.5 punkte grunto kasimas. 2025-07-02 Pridedamas P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ kiekių žiniaraštis su betono dangos išardymu 1.9 punktas	
Tačiau pastūlymo formoje numatyta tik asfalto dangos ir plytelių išardymas. Prašome paaiškinti kurioje pozicijoje numatyta žvyro dangos ardymas ir betono dangos ardymas.					
12	2025-06-16 243248	Techninė specifikacija	Ar nesidubliuoja 3.8 ir 3.9 skyrių darbai?	3.8 ir 3.9 Dubliuojasi kiekiai. Pridedamas kiekių žiniaraštis P2308-XX-R-TDP-SMG-SŽ, kiekis nurodytas punkte 3.8. Sumažinamas žemės darbų planiravimo ir tankinimo plotų kiekiai punktai 2.7, 2.8, 2.9	2025-07-02
13	2025-06-16 243869	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra demontuojami tinklai. Prašome nurodyti ar bus galima injekuoti tinklus jų neiškasant? arba tik užaklinti galus šuliniuose?	Projekte pažymėti tinklai demontuojami, statybos darbų metų, 2025-07-02 atsikasus ir įvertinus esamų tinklų būklę, projekte nepažymėtus demontuoti esamus, veikiačius tinklus išsaugoti. Esamus nepažymėtus demontuoti neveikčiantčius/nenaudojamus tinklus galima injekuoti jų neiškasant.	
14	2025-06-16 243869	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra demontuojami šuliniai. Prašome nurodyti ar bus galima jų pilnai nedemontuoti?, o demontuoti tik viršutinę šulinių dalį (perdangą ir paaukštėjimais), o apatinę dalį užpilti gruntu?	Taip. Tai technologškai priimtina, jei užpylimas atliktas pagal STR ir P2308-XX-R-TDP-NS.TS reikalavimus, užtikrinant grunto sutankinimą.	2025-07-02

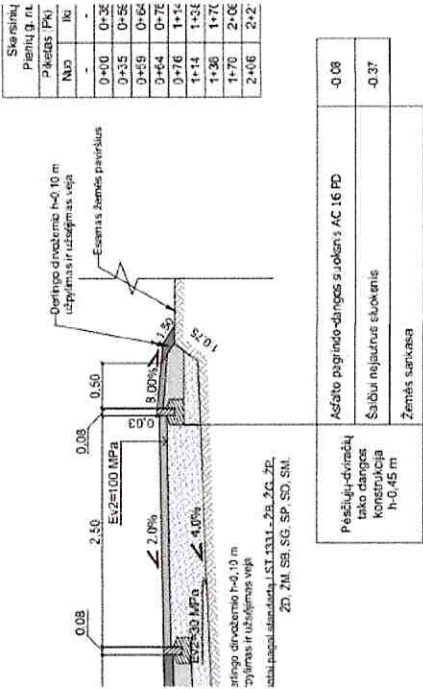
Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiurtimo tiekėams data
15	2025-06-16 244031	Techninė specifikacija	Nuotekų šalinimo dalies projekto žiniaraštyje yra g/b d700 mm šuliniai su kaliaus ketaus grotelėmis, bordiūrinėmis grotelėmis bei kaliaus ketaus dangčiais, kurių visų bendra suma 61 vnt, bet pagal brėžinius ir šulinių pateiktą lentelę g/b d700 mm šulinių yra 50 vnt. Prašome nurodyti kuris kiekis yra teisinga, kiek iš viso reikia vertinti g/b d700 mm šulinių?	P2308-XX-R-TDP-NS.SŽ išimti pertekliniai šuliniai. Pateikti atnaujinti kiekiai punktuose 2.1, 2.2, 2.19, 2.21, 2.22, 2.25, 2.31, 2.35. Visi šuliniai nužymėti pateikti P2308-XX-R-TDP-NS.B-03 8 lape. Šuliniai tikslūs pateikti P2308-XX-R-TDP-NS.B-02 brėžinyje.	2025-07-02
16	2025-06-17 244945	Techninė specifikacija	Ar galimas vamzdyno įrengimo būdo pakeitimas iš atviro į uždara?	Rangovas pasirenka įrengimo būda	2025-07-02
17	2025-06-17 245425	Techninė specifikacija	Ar asfaltas AC 16 PD projekte numatytas natūralios spalvos?	AC 16 PD projekte numatytas natūralios spalvos.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tikėjams data
18	2025-06-17 245466/245485	Techninė specifikacija	Neaiški vieta lietaus tinklų pajungimui. Projekte lietaus tinklas jungiamas prie esamo šulinio. Bet pajungimo vietoje - panašiai šioje vietoje aš randu (nuotraukoje) tokius vamzdžius ir griovį. Projekte nesimato kas čia per vamzdžiai. Ar tikrai yra lietaus šulinys?  	Lietaus nuotekų tinklų trasa projekto pabaigoje yra pajungžiama į kitu projektu įrengtą šulinį. Dabartinė situacija, nesutampa su žemiau paveikslė pateiktais sprendiniais.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiurtimo tiekėams data
19	2025-06-17 245466/245485	Techninė specifikacija	Lietus kerta Vyčio ir Rytmečio gatvės asfaltuotas, ar joms yra numatytas asfalto atstatymas? Projekte įrengiami visi lietaus tinklai atviru būdu, o elektros kabelius nurodyta uždaru būdu įrengti. 	Sankryžose su Vyčio ir Rytmečio gatvėmis numatomas naujos dangos įrengimas, vietose, kuriose sprendiniai įrengiami už sankryžos zonos ribos, lietaus nuotekų įrengimo darbus siūloma įrengti uždaru būdu.	2025-07-02
20	2025-06-18 247199	Techninė specifikacija	S dalies projekto DKŽ yra įtraukta 1730 m surenkamų 110 HDPE vamzdžių ryšių kabelių apsaugai įrengimas. Pasiūlymo formoje šios pozicijos nebėra. Kodėl?	S dalies projekto DKŽ pašalintas 1730 m surenkamų HDPE vamzdžių ryšių kabeliams apsaugojimas.	2025-07-02
21	2025-06-18 247199	Techninė specifikacija	Pasiūlymo formos 3.11; 3.12 ir 3.15 skyriuose nėra galimybės rinktis dviejų konstrukcijos variantų. Kodėl?	Papildytas sanaudų kiekių žiniaraščio 2 variantas nurodant ŠNS dangą p. 3.10, 3.11, 3.14.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
----------	--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------

22	2025-06-18 248190	Techninė specifikacija	SMG skersiniuose profiliuose (variantas 2) numatyta tokia tako dangos konstrukcija AC16 PD asfaltas h=8 cm, ŠNS h=37, žemės sankasa.	S dalies projekte dviračių-pėsčiųjų take nurodyta dangos konstrukcija: 0,08 m asfalto sluoksnis ir 0,37 m šaltiui nejautus sluoksnis. Tuo tarpu brėžiniuose matoma kita konstrukcija – su skaldos pagrindu ir mažesniu šaltiui atspariu sluoksniu. Kodėl skirtingi konstrukcijos?‘‘	2025-07-02
----	-------------------	------------------------	--	---	------------



Atsakymas:
 Projekte numatytos dvi alternatyvios dviračių-pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos, parinktos vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis. Abi jos yra techniškai pagrįstos ir įtrauktos į aiškinamąjį raštą:

- Pagrindinis variantas, naudojamas daugumoje trasos (nurodytas brėžiniuose):
- 0,08 m asfalto danga (AC 16 PD)
 - 0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis
 - 0,17 m šaltiui atsparus sluoksnis

Alternatyvusis (2-asis) variantas, kuriuo dažnai vadovaujamosi rengiant pasiūlymo formas (supaprastinta struktūra):

- 0,08 m asfalto danga
- 0,37 m šaltiui nejautus sluoksnis

Šis sprendinys taip pat nurodytas projekte kaip galimas pasirinkimas, atitinkantis reikalavimus šaltiui ir apkrovoms.

Tuo tarpu priedas Nr. 5 numatyta kita konstrukcija

3.11 Bendro pėsčiųjų dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas:

3.11.1	Apsauginis šaltui atsparus sluoksnis, h=0,17 m įrengimas	m²	307	0,00
3.11.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesuristų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,45; h=0,20 m įrengimas	m²	1 390	0,00
3.11.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, ribklos 70-100, h=0,08 m įrengimas	m²	1 390	0,00

Prašoma patikslinti kokia turi būti tako konstrukcija .

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiurtimo tiekėjams data
22	2025-06-19 249114	Techninė specifikacija	Tikrinant šulinių kiekius, techninio darbo projekto išilginiuose profiliuose (4. P2308-XX-R-TDP-NS) ir pateiktame užpildymui „7_2025-06-05 Priedas Nr 5 Pasiūlymo forma“ žiniaraštyje, yra neatitikimų. Žiniaraštyje numatomas g/b d700 šulinių kiekis 61 vnt., pagal projekto išilginius profilius yra 39 vnt. Prašome patikslinti pasiūlymo formos žiniaraštį.	Atlikus patikrinimą, nustatyta, kad techninio darbo projekto išilginiuose profiliuose (P2308-XX-R-TDP-NS) suprojektuota 39 vnt. g/b D700 mm šulinių, kas atitinka projektinį sprendinį ir aiškinamąjį raštą. Pasiūlymo formos žiniaraštyje nurodyti 61 vnt. g/b šuliniai yra pertekliniai, todėl ištrinami. Patikslinta pasiūlymo pateikimo forma Excel formatu pridedama (žr. 2025-06-05 Priedas Nr5 Pasiūlymo forma_2025-07-02_redakcija.xlsx).	2025-07-02
23	2025-07-01 262173	Pirkimo sąlygos	Koks numatomas šio pirkimo biudžetas?	Pirkimo biudžetas neskelbiamas.	2025-07-02
24	2025-07-01 262250	Pasiūlymo forma	Pasiūlymo formoje išskirtas I ir II variantai. Ar tiekėjas pasiūlymo formoje turi užpildyti abu variantus ir tuomet PO rinksis, kurį variantą pirkti? Ar tiekėjas turi užpildyti tik kažkurį vieną variantą, savo nuožiūra (arba I arba II variantą), o kito varianto laukelius palikti tuščius ?	Tiekėjas pasirenka viena variantą, o kito varianto langelius palieka tuščius.	2025-07-02
25	2025-07-01 262475	Pirkimo sąlygos	Ar sutarties užtikrinimas gali būti pateikiamas iš draudimo bendrovės?	Negali. Perkančioji organizacija pasirinko sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą (banko garantija) dėl toliau nurodomų priežasčių. VPI komentare nurodoma, kad <...> pati perkančioji organizacija sprendžia, kokius reikalavimus, susijusius su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, įtvirtinti pirkimo sąlygose, gali būti nurodomi tokie reikalavimai, taikomi praktikoje: pasiūlymo galiojimas užtikrinamas (i) besąlygine ir neatšaukiamąja garantija, kai perkančiajai organizacijai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių pagrįstumo ir dydžių, arba (ii) sąlygine, kai perkančioji organizacija, siekiant pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, turi įrodyti, kad realiai patyrė nuostolių. Šio Pirkimo metu Perkančioji organizacija yra pasirinkusi taikyti pirmąją aukščiau minėtą alternatyvą reikalaujanti garantijos, kai perkančiajai organizacijai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių pagrįstumo ir dydžių. Lietuvoje veikiančių draudimo bendrovių taisyklės numato, kad draudimo objektas yra nuostolių draudimas, tokiu būdu, sutarties įvykdymo užtikrinimas neatliktų savo funkcijos - baudos sumokėjimo už sutartyje numatytus pažeidimus.	2025-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
26	2025-07-03 265014	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Atsakydami į klausimą (2025-06-16; 244031), pateikėte, kad bus išimti pertekliniai d700 mm šuliniai iš žiniaraščio ir žiniaraštis yra patikslintas, bet žiniaraštis nėra patikslintas. Prašome pateikti patikslintą paviršinių nuotekų tinklų dalies žiniaraštį.	Pateikiami atnaujinti kiekių žiniaraščiai SMG ir NŠ dalies.	2025-07-11
27	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Pasiūlymo formos 3.8 skyrelyje ištrynėte beveik visą trinkelį kiekį. Liko tik 4 m2. Prašome patikslinti.	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
28	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	3.8 skyrelyje atsiųję pateiktas 1008 m2, nors projekte 1088 m2. Prašome patikslinti.	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
29	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	1.11 ir 1.12 pozicijas pažymėjote geltonai nors jose pakeitimų nematome. Kas jose pakeista?	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
30	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	3.10; 3.11 ir 3.14 skyrius papildėte naujais variantais, bet abu variantus įvardijote kaip I variantas. Prašome pataisyti.	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
31	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Atsakymuose nurodėte, kad atkuriamosios vertės vertintis nereikia, bet projekto DKŽ ją palikote. Prašome pašalinti.	Vadovautis pateiktu žiniaraščiu.	2025-07-11
32	2025-07-03 265224	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Projekto DKŽ palikote asfalto dangos pašukštinimo pozicijas, nors atsakymuose nurodėte, kad jo atlikti nereikia. Prašome patikslinti.	Vadovautis pateiktu žiniaraščiu. Ir 8 klausimu su atsakymu.	2025-07-11

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiurtimo tiekėams data

33	2025-07-03 265515	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Atsakymuose į klausimus niekur nepaminėta, kad kartu su atsakymais pateikiama nauja miesto gatvių susisiekimo dalies versija, kurioje atsirado 7 naujos pozicijos - PE ir plieniniai dėklai dujotiekio vamzdžiams. Nėra aišku, ar čia perkamos tik medžiagos (dėklai), o dujotiekio darbus atliks pvz ESO, ar reikia įsivertinti ir dujotiekio perkėlimo/apsaugojimo darbus?	Reikia įvertinti ir medžiagas ir darbus. Vadovautis pridėtu atnaujintu projektu ir TS	2025-07-11
----	----------------------	--	---	---	------------

Nors laiks tiekējām klausīties jau pasibaigēs, taču su atsakymais pateikta nauja pirkimo dokumentu versija (atitinkamai Pasūlymo formoje naujos pozīcijas), tādēļ prašome patikslinti kā reikia isivertinti šīs pozīcijās (pozīcijas 7.4-7.10 prie 7.Kiti darbai).

34	2025-07-03	Pirkimo dokumentai	Nepateikė šio dokumento "11.1.7 Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekeiui".
----	------------	--------------------	--

[illegible]

35	2025-07-03	Pasiūlymo forma/ 265569 Techninė	Įdėta atsakymo Nr. 8 I 2024-04-10 2024 pasirinkta remiantis biuro sprendimu (PRAK. 2024-04-10, p. 15) Be to, nurodoma, kad pagal patal. Nr. 2024-04-10 AS-045-01 pasirašyti techninė dalis AS-045-01 reikavimus dėl laipsniško ir vidutinio Įrengta dangų privačio atitiktį JT ASFALTAS 24 reikalavimus dėl dangos struktūros ir sukibimo (žr. P2308-XX-R-TDP-SMG-TS, p. 13).	2025-07-11
----	------------	---	--	------------

Asakmės nurodyta negaliojantis normatyvinis dokumentas. Patvirtinkite, kad atliekant darbus laimejimo atveju reikės vadovautis asakmės nurodytomis asfalto įrengimo taisyklėmis JT ASFALTAS 08.

36	2025-07-03 265569	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	2. šios pozicijos pažymėtos kaip patikslinto, tačiau nematomo pasikeitimų. Patikslinkite kiek turejo būti pasikeitimai.	2025-07-11										
			<table> <tr> <td>1.11</td><td>Gatvės bordiūrų su gaminiams demontavimas</td><td>m</td><td>44</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>1.12</td><td>Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betonų pagrindo po bordais išvežimas rūgštvio pasirinkta vieta (iki 30 km atstumu)</td><td>t</td><td>7</td><td>0,00</td></tr> </table>	1.11	Gatvės bordiūrų su gaminiams demontavimas	m	44	0,00	1.12	Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betonų pagrindo po bordais išvežimas rūgštvio pasirinkta vieta (iki 30 km atstumu)	t	7	0,00	Techninė klaidą. Žiniaraštis išaištytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.
1.11	Gatvės bordiūrų su gaminiams demontavimas	m	44	0,00										
1.12	Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betonų pagrindo po bordais išvežimas rūgštvio pasirinkta vieta (iki 30 km atstumu)	t	7	0,00										

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data																																										
37	2025-07-03 265569	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	2. Šios pozicijos pažymėtos kaip patikslinto, tačiau nematome pasikeitimų. Patikslinkite kokie turėjo būti pasikeitimai.	Klausimas kartojasi, toks pats kaip 36	2025-07-11																																										
			<table><tr><td>1.11</td><td>Gavėsi bordiūrų su pamatais demontavimas</td><td>m</td><td>44</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.12</td><td>Esančių betoninių (gavėsi) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvalymas rangovo pasirūpinta vieta (da 30 km atstumu)</td><td>t</td><td>7</td><td>0,00</td></tr></table>	1.11	Gavėsi bordiūrų su pamatais demontavimas	m	44	0,00	1.12	Esančių betoninių (gavėsi) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvalymas rangovo pasirūpinta vieta (da 30 km atstumu)	t	7	0,00																																		
1.11	Gavėsi bordiūrų su pamatais demontavimas	m	44	0,00																																											
1.12	Esančių betoninių (gavėsi) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvalymas rangovo pasirūpinta vieta (da 30 km atstumu)	t	7	0,00																																											
38	2025-07-03 265569	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	3. Ar teisingas kiekis 3.8.4 pozicijoje, nes atsių pastuoksnio 1008 m2, o trinkelų tik 4 m2	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11																																										
			<table><tr><th colspan="6">3.8 Naujų ir atstatinjamų šalies apsauginio stiklo ir trinkelų dangos įrengimas:</th></tr><tr><td>3.8.1</td><td>Apsauginis šaltiniu atsparus sluoksnis, h=0,34 m įrengimas</td><td>m²</td><td>481</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>3.8.2</td><td>Šalies pagrindo sluoksnis iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,45, h=0,20 m įrengimas</td><td>m²</td><td>1 088</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>3.8.1</td><td>Šaltiniu atsparus sluoksnis, h=0,29 m įrengimas</td><td>m²</td><td>410</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>3.8.2</td><td>Zvyro pagrindo sluoksnis iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,45, h=0,25 m įrengimas</td><td>m²</td><td>1 088</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>3.8.3</td><td>Pastuoksnio iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,5, h=0,03 m įrengimas</td><td>m²</td><td>1 008</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>3.8.4</td><td>Betoninių lygiaviminių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas</td><td>m²</td><td>4</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	3.8 Naujų ir atstatinjamų šalies apsauginio stiklo ir trinkelų dangos įrengimas:						3.8.1	Apsauginis šaltiniu atsparus sluoksnis, h=0,34 m įrengimas	m ²	481	0,00		3.8.2	Šalies pagrindo sluoksnis iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,45, h=0,20 m įrengimas	m ²	1 088	0,00		3.8.1	Šaltiniu atsparus sluoksnis, h=0,29 m įrengimas	m ²	410	0,00		3.8.2	Zvyro pagrindo sluoksnis iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,45, h=0,25 m įrengimas	m ²	1 088	0,00		3.8.3	Pastuoksnio iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,5, h=0,03 m įrengimas	m ²	1 008	0,00		3.8.4	Betoninių lygiaviminių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas	m ²	4	0,00			
3.8 Naujų ir atstatinjamų šalies apsauginio stiklo ir trinkelų dangos įrengimas:																																															
3.8.1	Apsauginis šaltiniu atsparus sluoksnis, h=0,34 m įrengimas	m ²	481	0,00																																											
3.8.2	Šalies pagrindo sluoksnis iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,45, h=0,20 m įrengimas	m ²	1 088	0,00																																											
3.8.1	Šaltiniu atsparus sluoksnis, h=0,29 m įrengimas	m ²	410	0,00																																											
3.8.2	Zvyro pagrindo sluoksnis iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,45, h=0,25 m įrengimas	m ²	1 088	0,00																																											
3.8.3	Pastuoksnio iš nesuvirščių mineralinių medžiagų mišinio fr. 0,5, h=0,03 m įrengimas	m ²	1 008	0,00																																											
3.8.4	Betoninių lygiaviminių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas	m ²	4	0,00																																											

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėams data
39	2025-07-03 265569	Techninė specifikacija	Pildėte pasiūlymo formą dujotiekio vamzdžių apsaugojimo darbais 7.4-7.10 pozicijos. Ar šiuos darbus atliks ESO operatorius ar Rangovai turi įsivertinti? Brėžinyje yra parašyta, kad dujotiekio darbai vykdomi Užsakovo lėšomis. Prašome pateikti suderinimo sąlygas.	Pridedamos suderinimo sąlygos: 1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Prieš darbų pradžią išsikviesti ESO atstovą šulinėlio (kapos) būklės įvertinimui. Įtaiso apsauginio šulinėlio aukštis reguliuojamas priderinant prie naujos dangos altitudės. Jei reikia, atlikti kapų aukščio reguliavimo darbus pritaikant prie naujų dangų altitudžių dėl šių darbų privaloma kreiptis į ESO. Darbai vykdomi užsakovo lėšomis. 4. Prašome prieš 2-3 mėn. iki darbų pradžios, kreiptis į ESO dėl dujų tinklų apsauginės dangos patikrinimo, esant poreikiui sudaryti sąlygas ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki dangų įrengimo. Neatsižvelgus į šią pastabą užsakovas turės padengti visas naujų dangų ardymo/atstatymo išlaidas. 5. Keičiant žemės paviršiaus altitudes ties dujų apskaitos spintelėmis, kreiptis į ESO dėl spintelės pakėlimo/pažeminimo. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-07-18.	2025-07-11
40	2025-07-03 265569	Pirkimo sąlygos	Prašome atsižvelgti į tai, kad yra daug pasikeitimų nuo pirminės pirkimo dokumentacijos ir nukelti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikui, palikti pakankamai laiko konkurencingo pasiūlymo paruošimui. Rangovai, siekiant pateikti konkurencingą, mažiausią kainą turi atlikti papildomas medžiagų, subrangovų apklausas po patikslinimų, o tam reikalingas papildomas laikas. Taip pat prašome atsižvelgti į tai, kad galutiniam pasiūlymo pateikimui lieka tik dvi darbo dienos, nes patenka dvi savaitgalio dienos.	Prašome atsižvelgti į tai, kad yra daug pasikeitimų nuo pirminės pirkimo dokumentacijos ir nukelti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikui, palikti pakankamai laiko konkurencingo pasiūlymo paruošimui.	2025-07-11
41	2025-07-03 265727	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Dėl paviršinių nuotekų tinklų dalies: Atsakėte į klausimus, tačiau nepakoregavote kiekių pasiūlymo formoje, prašome pakoreguoti.	Žiniaraščiai pakoreguoti pagal paskutinę projekcinę medžiagą, kuri kartu pridedama.	2025-07-11

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
42	2025-07-03 265770	Techninė specifikacija	Jeigu dujotiekio apsaugojimo darbus turės atlikti Rangovai ir įsivertinti pasiūlyme, prašome pateikti TS dėklų ir plokščių.	Papildytas TS 9 skyrius dujotiekio apsauginiais dėklais ir G/b plokštemis.	2025-07-11
43	2025-07-03 266360	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Pasiūlymo forma, eilutė 3.8.4. - nurodyta betoninių lygiabriaunių trinkelų dangos įrengimas 4 m2. Tai čia yra raudonos spalvos įrengimas? Nėra eilutės "Betoninių lygiabriaunių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas" - 1084 m2.	Techninė klaidą. Žiniaraštis ištaisytas. Vadovautis paskutiniu pateiktu žiniaraščiu ir pakoreguotais naujomis projekto dalimis.	2025-07-11
44	2025-07-03 266360	Pasiūlymo forma/ Techninė specifikacija	Pasiūlymo formoje atsirado naujos eilutės 7.4 - 7.10 - apsauginiai surenkami dėklai, gelžbetoninės plokštės dujotiekio vamzdžiams. Klausimuose - atsakymuose apie šiuos naujai įtrauktus darbus nėra aprašyta. Prašome paaiškinti - patikslinti, ar reikia vertinti šiuos darbus.	Darbus reikia vertinti. Vadovautis pridėtomis naujomis TS, žiniaraščiu ir projekto dalimis.	2025-07-11
45	2025-07-03 266360	Pirkimo sąlygos	Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui atsižvelgiant į išdėstytus klausimus.	Žr. 40 klausimą.	2025-07-11
46	2025-07-04 267055	Techninė specifikacija	Atidžiau susipažinus su gautais atsakymais ir atsiradusiais papildymais dėl dujotiekio dėklų Susisiekimo miesto gatvių dalyje (dokumentas "P2308-XX-R-TDP-SMG"), siunčiame šiuos pastebėjimus ir komentarus. Pasikonsultavus su miesto skirstomųjų dujotiekio įrengimo atestuotais specialistais, gautas konkretus atsakymas - "Pagal pridėtą projektą ESO neleis vykdyti dujotiekio apsaugojimo". Pagal ESO reikalavimus, dujotiekio apsaugojimui (pertvarkymui) turės būti gautos ESO techninės sąlygos ir pagal jas paruoštas apsaugojimo (pertvarkymo) projektas. Projektą turi patvirtinti ESO. Tokie sprendiniai, kaip surenkamų dėklų naudojimas dujotiekio apsaugojimui išvis negalimi, nes ESO nenaudoja surenkamų dėklų dujotiekio apsaugojimui (naudoja tik elektros kabelių apsaugojimui) Maža to, minėtoje projekto dalyje dėklų specifikacijos pateiktos kaip darbinių dujotiekio vamzdžių reikalavimai, o ne reikalavimai dėklams. Patikslinkite, prašau, kaip elgtis šioje situacijoje ir kaip įvertinti šiuos darbus pasiūlymo formoje ?	Vadovautis pridėtomis naujomis TS, žiniaraščiu ir projekto dalimis.	2025-07-11

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiurtimo tikėjams data
47	2025-07-14 278125	Techninė specifikacija	Prašome galutinai patvirtinti ar bus reikalaujamas asfalto dangos šiuurštiniimas ir koku IT ASFALTU reikia vadovautis, nes viename atsakyme nurodytas 08 o kitame 24.	Vadovautis JT ASFALTAS 24.	2025-07-21
48	2025-07-14 278693	Techninė specifikacija	1. Į 2025-07-11 pateiktuose atsakymuose nurodėte, kad papildomas TS 9 skyrius: AČ 2025 m. 01 mėn. 29 d. Tiekiamas kaip techninis dokumentas, kuris yra dalis bendrojo projekto TS 9 skyriaus aprašo ir turi būti įtrauktas į projektą. Prašome patikslinti, kur ieškoti TS g/b plokščių. Nes TS 9 g/b plokštės nerandame. Pakartotinai prašome pateikti g/b plokščių duomenų plokščių tiekėjai negali pateikti kainų. Nėra aišku ar plokštės armuotos, jei armuotos, koks ir kokios armatūros kiekis, iš kokio betono pagamintos plokštės. Prašome pateikti detalesnius duomenis. Taip pat prašome visus papildymus pateikti prie klausimų atsakymų, aiškiai nurodant kurioje projekto dalyje ieškoti pakeltųjų, nes priešingu atveju Rangovai turėtų iš naujo ieškoti kur pateikti patikslinimai/papildymai ir skaityti visas projekto dalis iš naujo. Atnaujintas SMG nebuvo pridėtas prie patikslinimo, nors SMG dalis ir buvo papildyta TS 9. Pažymime, kad pirmo dokumentai turi būti aiškūs ir be dviprasmybių.	TS 9.3 skyriuje pateikta plokštė, kaip gaminy P-8-11, tartin su gamintoju. Dujotiekio apsauginiai dėklai pateikti 9 skyriaus lentelėje "Pleniniai su apsaugine dangą apsauginiai dėklai" reikalavimais dėklam pagal ESO dujų tinklų apsaugojimo reikalavimus.	2025-07-21
49	2025-07-14 278693	Techninė specifikacija	Nepateikėte ESO suderinimo sąlygų dujotiekio apsaugojimo tinklam, kur matytusi patvirtinimai ir suderinimai ESO. Pakartotinai prašome pateikti. Tik esant išduotoms sąlygomis Rangovai bus užtikrinti, kad ESO šiuos darbus leis vykdyti. Pateikėte tik nuorašą iš brėžinių, o ne pačias sąlygas. Projekto prieduose nerandame sąlygų, kaip atskiro dokumento.	Pateikiama ESO dujų tinklų peržiūrėti sprendiniai su derinio pastabomis atskirai.	2025-07-21
50	2025-07-14 278693	Techninė specifikacija	Dėl 35 atsakymo. Atsakėte, kad įrengta asfalto dangą turi atitikti JT ASFALTAS 24 reikalavimus dėl dangos struktūros ir sukibimo. Šis atsakymas prieštariauja prieš tai pateiktiems, kad nereikalausite atlikti dangos šiuurštiniimo. Neatlikus dangos šiuurštiniimo Rangovas negali užtikrinti, kad dangą atitiktų JT ASFALTAS 24 reikalavimų. Projekto TS 5.38 taip pat pateikta reikalavimai dangos šiuurštinimui, vadinasi Rangovai turi vadovautis TS. Prašome papildyti Pasiūlymo formą dangos šiuurštiniimo darbais.	Šiuurštiniimo vertinti nereikia dėl triukšmo lygio reikalavimu.	2025-07-21
51	2025-07-14 278693	Techninė specifikacija	ĮSMG-1 yra pateikta: Esančių elektros tinklų apsaugojimo, potvėlio ar rekonstravimo darbai vykdomi pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK25-44269, parengtos 2025-04-24. Sąlygos pateiktos projekto bendrosios dalies pridedamuose dokumentuose. Prašome pateikti ir elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr. ISK25-44269. Projekto bendrosios dalies pridedamuose dokumentuose nerandame. Kas vykdytys elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo darbus ?	Sąlygos pateiktos bendroje dalyje. Pridedamos elektros tinklų sąlygos atskirai	2025-07-21

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeičimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
52	2025-07-14 278693	Techninė specifikacija	Kuriuo etapu (I ar II) numatyta atlikti dujotiekio apsaugojimo darbus. Nes rašote, kad per 2-3 mėn iki darbų pradžios, kreiptis į ESO dėl dujų tinklų apsauginės dangos patikrinimo. Ar šie terminai įvertinti nurodant darbų atlikimo terminus visam objektui.	Šie terminai įvertinti nurdant darbų atlikimo terminus visam objektui. ESO dujų tinklų suderinimo pastabų terminai. Prieš atliekant statybos darbus.	2025-07-21
53	2025-07-14 278693	Pirkimo sąlygos	Atsižvelgiant į tai, kad yra nepateiktų TS ir negalime vykdyti medžiagų kainų užklausų, prašome pratešti pasiūlymų pateikimo terminą.	Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-07-28.	2025-07-21
54	2025-07-14 278810	Techninė specifikacija	Papildėte pasiūlymo formą 7.4-7.10 pozicijomis, tačiau žemės darbų papildomai neatsirado. Prašome paaiškinti kuriose pozicijose įvertinta žemės darbai apsauginių surenkamų dėklų įrengimui.	Esamu kabelių tiklūs gyliai, pagal esamą situaciją nėra aiškūs, todėl tikslių kiekių nustatyti negalime.	2025-07-21
55	2025-07-15 279876	Pirkimo sąlygos	Prašome nurodyti koks tikras yra pasiūlymo pateikimo terminas. Klausimu/atsakymu priede - 2025-07-18. Pagr. psl. 2025-07-18. Pakeitime - 2025-07-16.	Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-07-28.	2025-07-21
56	2025-07-15 280061	Techninė specifikacija	Prašome nurodyti konkretaus gamintoją, kurio TS pateikta projekte dujotiekio apsauginių dėklų. Kadangi susidūrėme su problema - Tiekėjams nėra aišku kokio medžiagiškumo dėklai turi būti.	Projekte nėra nurodyti konkretaus gamintojo dujotiekio apsauginiai dėklai. Rangovas turi naudoti dėklus, kurie atitinka projekte keliamus reikalavimus. Projektuotojai yra pateikę informaciją, kad keliamus reikalavimus atitinkančius dėklus gamina ne vienas gamintojas. Perkančioji organizacija nėra įsipareigojusi ieškoti rangovams medžiagų ir teikti tokią informaciją.	2025-07-21
57	2025-07-22 289454	Techninė specifikacija	Kadangi atsakėte, kad žemės darbų kiekių nustatyti negalite, prašome patvirtinti, kad už šiuos darbus bus apmokama papildomai, vykstant sutartį.	Už atliktus darbus bus apmokama pagal faktinius kiekius, kaip ir kitų darbų atveju. Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 8.5 punkte nurodyta, kad Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) - Fiksuoto įkainio.	2025-07-23

PAGRINDINĖS SUTARTIES PRIEDAS NR. 6
RANGOVO PASIŪLYMAS

PRIEDAS NR. 2 „PASIŪLYMO FORMA“

PIENIŲ G., DOMEIKAVOS K., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI

Kam: Kauno rajono savivaldybės administracija

2025-07-28

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "Kauno keliai"
Tiekėjo kodas:	135640993
Tiekėjo adresas:	R. Kalantos 85, LT-52310 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT356409917
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB bankas
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Vaidas Dėdelė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	+37068631096
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	vaidas.dedele@kaunokeliai.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Projektų direktorius , +370€ , @kaunokeliai.lt

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto technines specifikacijas ir brėžinius (pirkimo sąlygų 1 priedas).

2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievolės ir išpareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks nėsitaikyti).
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.
6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.
7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas:

Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
I. SUSISIEKIMO DALIS					
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Geodezinis trasos nužymėjimas	km	0.985	2385	2,349.23
1.2	Ø16-24 cm medžių kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	21	27.75	582.75
1.3	Ø32-45 cm medžių kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	42	55.51	2,331.42
1.4	Nukirstų medžių ir kelmų, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	t	22.40	77.38	1,733.31
1.6	Esamų šulinių aukščių reguliavimas iki projekcinio aukščio ir dangčių pakeitimas į kalas ketaus 40t apkrovoms	vnt.	64	315.58	20,197.12
1.7	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas hvid-0,08 m	m ²	291	2.62	762.42
1.8	Nufrezuotos asfalto dangos (frezuotų asfalto granulių) išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	t	56	6.77	379.12

1.9	Betoninės dangos hvid-0,10 m demontavimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km atstumu)	m ²	42	2.74	115.08
1.10	Betoninių plytelių/trinkelų dangų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km atstumu)	m ²	94	2.74	257.56
1.11	Gatvės bordiūrų su pamaitais demontavimas	m	44	4.05	178.20
1.12	Esamų betoninių (gatvės) bordiūrų bei betono pagrindo po bortais išvežimas rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	t	7	10.83	75.81
1.13	Esamų viensteinčių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į rangovas pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	vnt.	3	14.45	43.35
1.14	Esamų daugiastiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į rangovas pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	vnt.	4	21.67	86.68
1.15	Esamos metalinės tvoros išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	m	5.50	20.03	110.17
1.16	Esamų gelžbetoninių D300 mm pralaidų demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	m	7	12.7	88.90
1.17	Esamų plastikinių D400 mm pralaidų demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu)	m	17	12.7	215.90
2. Žemės darbai					
2.1	Esamo augalinio sluoksnio nukasimas h=0,10 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu	m ³	2,536	3.52	8,926.72
2.2	I krūvas sustumto augalinio sluoksnio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)	m ³	1,858	2.2	4,087.60
2.3	Augalinio sluoksnio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas vietoje	m ³	1,858	9.51	17,669.58
2.4	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m ³	678	3.41	2,311.98
2.5	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (perteklinis gruntas)	m ³	8,565	6.61	56,614.65

2.6	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas sankasos įrengimui)	m ³	200	21.45	4,290.00
2.7	Žemės sankasos, išvalomų griovių, šlaitų, bei pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	9,766	0.31	3,027.46
2.8	Žemės sankasos, išvalomų griovių, šlaitų, bei pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu	m ²	1,085	0.93	1,009.05
2.9	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu	m ³	3,255	0.83	2,701.65
2.10	Šlaitų ir pakelės plotų užsėjimas žole	m ²	5,910	0.49	2,895.90
2.11	Gruntų užpylimas (gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu) h-0,25 m (ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, SB, SG, SP, SD)	m ²	6,945	4.29	29,794.05
3. Dangos konstrukcijų įrengimas					
3.1 Pienių gatvės ir apsisukimo aikštelės dangos konstrukcijos įrengimas:					
3.1.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,33 m įrengimas	m ³	2,124		0.00
3.1.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	4,950		0.00
3.1.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,23 m įrengimas	m ³	1,480	21.72	32,145.60
3.1.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas	m ²	4,950	15.42	76,329.00
3.1.3	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	919	2.02	1,856.38
3.1.4	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	4,950	13.97	69,151.50
3.1.5	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį)	m ²	4,950	0.36	1,782.00
3.1.6	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	919	2.02	1,856.38
3.1.7	Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas	m ²	4,950	8.84	43,758.00
3.2 Jungiamojo kelio dangos konstrukcijos įrengimas:					
3.2.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,33 m įrengimas	m ³	140		0.00
3.2.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	326		0.00

3.2.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,23 m įrengimas	m ³	97	23.76	2,304.72
3.2.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas	m ²	326	16.5	5,379.00
3.2.3	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	66	2.02	133.32
3.2.4	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	326	14.77	4,815.02
3.2.5	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį)	m ²	326	0.42	136.92
3.2.6	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	66	2.02	133.32
3.2.7	Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas	m ²	326	9.65	3,145.90
3.3 Rytmečio gatvės sankryžos dangos konstrukcijos įrengimas:					
3.3.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,33 m įrengimas	m ³	86		0.00
3.3.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	201		0.00
3.3.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,23 m įrengimas	m ³	60	23.27	1,396.20
3.3.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas	m ²	201	16.5	3,316.50
3.3.3	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	38	2.02	76.76
3.3.4	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	201	14.77	2,968.77
3.3.5	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį)	m ²	201	0.42	84.42
3.3.6	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	38	2.02	76.76
3.3.7	Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas	m ²	201	9.65	1,939.65
3.3.8	Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/l cm sluoksnio storiui)	m	11	2.02	22.22
3.4 Mokslo gatvės sankryžos dangos konstrukcijos įrengimas:					
3.4.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,33 m įrengimas	m ³	17		0.00

3.4.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	39		0.00
3.4.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,23 m įrengimas	m ³	12	23.52	282.24
3.4.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas	m ²	39	16.5	643.50
3.4.3	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	16	2.02	32.32
3.4.4	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	39	14.77	576.03
3.4.5	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį)	m ²	39	0.42	16.38
3.4.6	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	16	2.02	32.32
3.4.7	Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas	m ²	39	9.65	376.35
3.4.8	Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui)	m	16	2.02	32.32
3.5 Vyturio gatvės sankryžos dangos konstrukcijos įrengimas:					
3.5.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,33 m įrengimas	m ³	82		0.00
3.5.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	190		0.00
3.5.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,23 m įrengimas	m ³	57	23.52	1,340.64
3.5.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas	m ²	190	16.5	3,135.00
3.5.3	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	38	2.02	76.76
3.5.4	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	190	14.77	2,806.30
3.5.5	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį)	m ²	190	0.42	79.80
3.5.6	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	38	2.02	76.76
3.5.7	Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas	m ²	190	9.65	1,833.50

3.5.8	Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui)	m	11	2.02	22.22
3.6 Jungiamojo kelio sankryžos dangos konstrukcijos įrengimas:					
3.6.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,33 m įrengimas	m ³	44		0.00
3.6.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	102		0.00
3.6.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,23 m įrengimas	m ³	30	23.27	698.10
3.6.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas	m ²	102	16.5	1,683.00
3.6.3	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	24	2.02	48.48
3.6.4	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, riškis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	102	14.77	1,506.54
3.6.5	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį)	m ²	102	0.42	42.84
3.6.6	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	24	2.02	48.48
3.6.7	Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, riškis 70/100, h-0,04 m įrengimas	m ²	102	9.65	984.30
3.7 Nuovažų su pilna gatvės dangos konstrukcija įrengimas:					
3.7.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,33 m įrengimas	m ³	21		0.00
3.7.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	49		0.00
3.7.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,23 m įrengimas	m ³	15	23.52	352.80
3.7.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas	m ²	49	16.5	808.50
3.7.3	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	24	2.02	48.48
3.7.4	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, riškis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	49	14.77	723.73
3.7.5	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį)	m ²	49	0.42	20.58
3.7.6	Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį)	m	24	2.02	48.48

3.7.7	Asfalto viršutinio sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas	m ²	49	9.65	472.85
3.8 Nuovažų ir užvažiuojamos salelės apsisukimo aikštelėje iš trinkelio dangos įrengimas:					
3.8.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,34 m įrengimas	m ³	481		0.00
3.8.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	1,088		0.00
3.8.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,29 m įrengimas	m ³	410	23.52	9,643.20
3.8.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,25 m įrengimas	m ²	1,088	14.54	15,819.52
3.8.3	Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas	m ²	1,088	3.49	3,797.12
3.8.4	Betoninių lygiabriaunių trinkelio 20.10.8 cm dangos įrengimas	m ²	1,084	24.22	26,254.48
3.8.5	Betoninių raudonos spalvos lygiabriaunių trinkelio 20.10.8 cm dangos įrengimas stovėjimo vietoms įrengimas	m ²	4	34.02	136.08
3.9 Dviračių takų per nuvažas iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas:					
3.9.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,37 m įrengimas	m ³	86		0.00
3.9.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	178		0.00
3.9.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,27 m įrengimas	m ³	62	23.52	1,458.24
3.9.2	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,30 m įrengimas	m ²	178	16.5	2,937.00
3.9.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	178	15.99	2,846.22
3.10 Bendro pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas:					
3.10.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas	m ³	307		0.00
3.10.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas	m ²	1,390		0.00
3.10.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,37 m įrengimas	m ³	669	24.9	16,658.10
3.10.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas	m ²	1,390	15.99	22,226.10

3.11 Šaligatvių ir techninių šaligatvių įrengimas:					
3.11.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas	m ³	481		0.00
3.11.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas	m ²	1,687		0.00
3.11.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,34 m įrengimas	m ³	860	24.9	21,414.00
3.11.3	Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas	m ²	1,687	3.49	5,887.63
3.11.4	Betoninių lygiabriaunių trinkelų 20.10.8 cm dangos įrengimas	m ²	1,605	23.66	37,974.30
3.11.5	Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelų 20.10.8 cm įrengimas	m ²	44	32.24	1,418.56
3.11.6	Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelų 20.10.8 cm įrengimas	m ²	38	32.24	1,225.12
3.12 Kelkraščių įrengimas:					
3.12.1	Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,06 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio 85/15% įrengimas	m ²	637	4.77	3,038.49
3.13 Bordiūrų įrengimas:					
3.13.1	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	m	1,508	27.67	41,726.36
3.13.2	Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	m	839	27.03	22,678.17
3.13.3	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	m	2,248	14.32	32,191.36
3.13.4	Bordiūrų užsandinimas bitumine juosta h-0.04 m	m	4,595	2.15	9,879.25
3.14 Šlaito tvirtinimo ažūrinėmis trinkelėmis įrengimas:					
3.14.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas	m ³	3		0.00
3.14.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas	m ²	14		0.00
3.14.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio, h-0,34 m įrengimas	m ³	6	24.9	149.40
3.14.3	Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas	m ²	14	5.63	78.82
3.14.4	Ažūrinių trinkelų 60.40.8 cm dangos įrengimas	m ²	14	33.43	468.02

3.14.5	Trinkelų tarpų užpildymas skaldažolės mišiniu, h=0,08 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas 70-30	m ²	14	16.5	231.00
4. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai):					
4.1	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	42	80	3,360.00
4.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	vnt.	105	65.2	6,846.00
5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklinimas):					
5.1	Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Siaura ištisinė linija“ įrengimas	m	44	5	220.00
5.2	Horizontaliojo ženklinimo 1.13.1 „Pėsčiųjų perėja „Zebras““ įrengimas	m ²	84	22	1,848.00
6. Eismo saugumo priemonių įrengimas:					
6.1	Apsauginės cinkuoto plieno tvorelės pėstiesiems ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	m	225	53.5	12,037.50
7. Kiti darbai:					
7.1	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	5	315.83	1,579.15
7.2	Suoliukų įrengimas	vnt.	5	631.67	3,158.35
7.3	Apsauginiai surenkami HDPE D110 mm vamzdžiai elektros kabeliams	m	19	22.46	426.74
7.4	Apsauginiai surenkami Dėklai PE D32 mm dujotiekio	m	51	22.55	1,150.05
7.5	Apsauginiai surenkami Dėklai PE D110 mm dujotiekio	m	27	41.49	1,120.23
7.6	Apsauginiai surenkami Dėklai PE D160 mm dujotiekio	m	84	58.19	4,887.96
7.7	Apsauginiai surenkami Dėklai PE D225 mm dujotiekio	m	179	80.47	14,404.13
7.8	Plieninis D159 mm dėklas su apsaugine PE danga	m	16	86.04	1,376.64
7.9	Plieninis D219 mm dėklas su apsaugine PE danga	m	180	113.88	20,498.40
7.10	Gelžbetoninės plokštės 2990x1160x10 cm apsaugoti dujotiekio tinklams įrengimas	vnt.	163	258.98	42,213.74
Iš viso I žiniaraštyje:					829,757.02
II. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DALIS					
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Esamų g/b D1000 šulinių su dangčiu demontavimas	vnt.	27	100	2,700.00
1.2	G/b atliekų išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t	52	35.15	1,827.80
1.3	Esamų plastikinių D110 mm vamzdžių demontavimas	m	39	2	78.00

1.4	Esamų plastikinių D160 mm vamzdžių demontavimas	m	53	3	159.00
1.5	Esamų plastikinių D200 mm vamzdžių demontavimas	m	222	3	666.00
1.6	Esamų plastikinių D300 mm vamzdžių demontavimas	m	198	3.5	693.00
1.7	Esamų plastikinių D400 mm vamzdžių demontavimas	m	355	4	1,420.00
1.8	Plastiko atliekų išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t	0.64	35.15	22.50
2. Paviršinio ir konstrukcinio vandens nuvedimo sprendiniai:					
2.1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m ³	4,926	9	44,334.00
2.2	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas užpylimui vamzdžiams, šuliniams)	m ³	4,036	21	84,756.00
2.3	Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas	m	1,708	17.4	29,719.20
2.4	Drenažo D113/126 mm pajungimas į šulinius	vnt.	48	68	3,264.00
2.5	Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas	m ²	3,416	7	23,912.00
2.6	Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas	m ³	273	48.12	13,136.76
2.7	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių "SN8" klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas.	m	579	25.1	14,532.90
2.8	PP D200 mm vamzdžių pajungimas į šulinius	vnt.	154	64.72	9,966.88
2.9	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių "SN8" klasės vamzdžių DN 250 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas.	m	6	30.3	181.80
2.10	PP D250 mm vamzdžių pajungimas į šulinius	vnt.	2	68.08	136.16

2.11	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių "SN8" klasės vamzdžių DN 315 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas.	m	9	35.3	317.70
2.12	PP D315 mm vamzdžių pajungimas į šulinius	vnt.	2	76.72	153.44
2.13	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių "SN8" klasės vamzdžių DN 400 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas.	m	824	44.3	36,503.20
2.14	PP D400 mm vamzdžių pajungimas į šulinius	vnt.	72	87.04	6,266.88
2.15	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių "SN8" klasės vamzdžių DN 500 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas.	m	82	61.5	5,043.00
2.16	PP D500 mm vamzdžių pajungimas į šulinius	vnt.	8	110.56	884.48
2.17	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių "SN8" klasės vamzdžių DN 600 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas.	m	108	81.5	8,802.00
2.18	PP D600 mm vamzdžių pajungimas į šulinius	vnt.	10	140.68	1,406.80
2.19	G/b D700 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija) iki 1,4 m gylio <u>su kaliaus ketaus grotelėmis 40t</u> apkrovai įrengimas, tiekimas, sumontavimas.	Kompl.	2	718.48	1,436.96
2.20	G/b D700 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija) iki 2,9 m gylio <u>su bordiūrinėmis grotelėmis 40t</u> apkrovai įrengimas, tiekimas, sumontavimas.	Kompl.	34	804.21	27,343.14
2.21	G/b D700 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija) iki 2,9 m gylio <u>su kaliaus ketaus dangčiu 40t</u> apkrovai įrengimas, tiekimas, sumontavimas.	Kompl.	4	757.01	3,028.04

2.22	G/b D1000 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija, plieninės lipinės) iki 3,9 m gylio <u>su kaliaus ketaus dangčiu 40t apkrovai</u> įrengimas, tiekimas, sumontavimas.	Kompl.	21	1327.97	27,887.37
2.23	G/b D1500 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija, plieninės lipinės) iki 3,00 m gylio <u>su kaliaus ketaus dangčiu 40t apkrovai</u> įrengimas, tiekimas, sumontavimas.	Kompl.	24	1682.87	40,388.88
2.24	PP D425 mm šulinių iki 2,80 m gylio <u>su kaliaus ketaus dangčiu 40t apkrovai</u> įrengimas, tiekimas, sumontavimas.	Kompl.	19	462.81	8,793.39
2.25	Smėlio pagrindo h-0,15 m šuliniams įrengimas	m ³	16	31	496.00
2.26	Smėlio pagrindo h-0,10 plastikiniams vamzdžiams įrengimas	m ³	91	31	2,821.00
2.27	Pirminis smėlio užpylimas lietaus nuotekų vamzdžių įrengimui h-0,20 m	m ³	181	25	4,525.00
2.28	Lietaus nuotekų tinklų praplovimas be dezinfekavimo.	m	1,599	2.5	3,997.50
2.29	Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas	m	1,599	2.5	3,997.50
2.30	Tinklų TV diagnostika	m	1,599	2.5	3,997.50
2.31	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	vnt.	104	62.56	6,506.24
2.32	Polimerinio latako 1000x235x290 mm D400 apkrovos klasės ant betoninio pagrindo $\geq$ C25/30 pagal LN EN 206-1 su kaliaus ketaus grotelėmis įrengimas	m	10	398.14	3,981.40
2.33	Polimerinio latako su dėže (su sąrašų nešvarumų indu įtekėjimo dėžei) 500x235x710 mm D400 apkrovos klasės ant betoninio pagrindo $\geq$ C25/30 pagal LN EN 206-1 su kaliaus ketaus grotelėmis ant betoninio pagrindo $\geq$ C25/30 pagal LN EN 206-1 įrengimas	kompl.	1	376.18	376.18
2.34	Polimerbetonio latako 1000x150x305 D400 apkrovos klasės ant betoninio pagrindo $\geq$ C25/30 pagal LN EN 206-1 su kaliaus ketaus grotelėmis įrengimas	m	35	267.69	9,369.15
2.35	Bordiūrinio latako dėžės 550x425x370 mm su apatinė dėžės dalimi 500x322x365 mm (su sąrašų nešvarumų indu įtekėjimo dėžei) D400 apkrovos klasei ant betoninio pagrindo $\geq$ C25/30 pagal LN EN 206-1 įrengimas	kompl.	5	799.18	3,995.90

2.36	Bordiūrinio latako dėžės 500x390x505 mm su apatinė dėžės dalimi 500x322x715 mm (su sąrašų nešvarumų indu įtekėjimo dėžei) D400 apkrovos klasei ant betoninio pagrindo $\geq C25/30$ pagal LN EN 206-1 įrengimas	kompl.	5	852.62	4,263.10
2.37	Perkritimo stovų iš PP movinių savitakinių "SN8" klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas.	m	64	105.06	6,723.84
2.38	Aklių PP moviniams savitakiniais "SN8" klasės vamzdžių DN 200 mm įrengimas	vnt.	6	19	114.00
Iš viso II žiniaraštyje:					454,925.59
ELEKTROTECHNIKOS DALIS					
I SKYRIUS. MEDŽIAGOS					
1	Apšvietimo atrama kūginė, cinkuota, h-8 m	vnt.	35	156.22	5,467.70
2	Gembė 1,0x1,0 m	vnt.	35	34.72	1,215.20
3	Gnybtinas SV-15	vnt.	35	16.2	567.00
4	Automatinis išjungėjas montuojamas atramoje 1P C2A	vnt.	35	5.79	202.65
5	Apšvietimo atramos pamatas su guma, VGAP-3	kompl.	35	63.65	2,227.75
6	Apšvietimo atramų įžeminimas 30Ω: Elektrodai d20x1,5 m – 4 vnt; Antgalis – 1 vnt. Plieninė cinkuota juosta 40x4 – 2 m; Kryžminė jungtis – 1 vnt; Antikorozinė pasta;	kompl.	35	57.86	2,025.10
7	1kV kabelis Al - 5x16 XLPE izoliacija montavimui žemėje	m	1,176	1.91	2,246.16
8	Signalinė juosta „Kabelis“	m	951	0.23	218.73
9	Galinės movos kabeliui Al 5x16	kompl.	68	4.63	314.84
10	1kV kabelis Cu – 3x1,5 XLPE izoliacija montavimui atramoje	m	385	0.61	234.85
11	Elektrotechninis HDPE apsauginis vamzdis d75	m	951	1.27	1,207.77
12	Elektrotechninis HDPE apsauginis vamzdis d110 uždarui klojimui	m	111	4.63	513.93

13	Gatvės apšvietimo LED šviestuvai, 4000K, 50W, IP66, IK09	kompl.	35	133.08	4,657.80
14	Metalinis skydelis atramoje	kompl.	1	156.22	156.22
15	Kabelio apsaugos metalinis gaubtas GK, 2,5 m su apkabomis	kompl.	1	138.86	138.86
II SKYRIUS. DARBAI					
16	Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas	vnt.	35	45.44	1,590.40
17	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt.	35	5.53	193.55
18	Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt.	35	18.66	653.10
19	Apšvietimo atramos montavimas	vnt.	35	80.08	2,802.80
20	Gembės montavimas	vnt.	35	15.18	531.30
21	Pamato atramai montavimas	vnt.	35	56.97	1,993.95
22	Tranšėjos kasimas/užkasimas , mechanizuotai/rankiniu būdu	m	845	5.22	4,410.90
23	Tranšėjos kasimas/užkasimas ,rankiniu būdu	m	106	7.15	757.90
24	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	100m ³	3.08	423.33	1,303.86
25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 3kg	m	1,176	2.19	2,575.44
26	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg	m	385	0.87	334.95
27	Galinės movos iki 70mm ² montavimas	vnt.	99	13.57	1,343.43
28	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.951	53.03	50.43
29	Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	m	950	1.86	1,767.00
30	Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas uždarų būdu	m	111	33.89	3,761.79
31	Ižeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	35	39.92	1,397.20
32	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	35	9.88	345.80
33	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	3	10.55	31.65
34	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	kompl.	35	1.98	69.30
35	Geodezinė nuotrauka, trąsos nužymėjimas	kompl.	3	204.15	612.45

36	Išpildomoji dokumentacija	kompl.	3	70.15	210.45
37	Ižeminimo įrenginių kontaktinių jungčių	kompl.	1	60.15	60.15
38	PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai	kompl.	1	60.15	60.15
39	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai	kompl.	1	370.15	370.15
40	Skydelio montavimas atramoje	vnt.	1	40.89	40.89
41	Apsauginio kabelio gaubto montavimas atramoje	vnt.	1	17.68	17.68

Iš viso III žiniaraštyje: **48,681.23**

IV. STATYBOS UŽBAIGIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

1	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas	kompl.	1	6950	6,950.00
2	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	kompl.	1	920	920.00
3	Atlikti statinių statybos užbaigimo procedūrą ir pateikti eksperto patvirtintas ir IS „Infostatyba“ užregistruotas deklaracijas apie šių statinių statybos užbaigimą	kompl.	1	100	100.00
4	Kiti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai	kompl.	1	100	100.00
5	Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui)	kompl.	1	100	100.00
6	Nekilnojamo turto registracija Registrų centre	kompl.	1	100	100.00

Iš viso VI žiniaraštyje: **8,270.00**

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: **1,341,633.84**

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos rašta dėl PVM netaikymo paaiškindamas.

PVM tarifas (%)

21.00

PVM suma, Eur:

281,743.11

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM* **1,623,376.94**

Ar bus taikoma alkoholio kontrolės darbe sistema?

Taip

Reikšmė:

2,500.00

Ar bus taikoma darbo laiko apskaitos sistema statybvietėje?

Taip

Reikšmė:

2,500.00

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina (ekonominis naudingumas), Eur su PVM*

1,618,376.94

Pasiūlymo priedai, subteikėjai ir kita informacija nurodomi sekančiame lape >>>

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kval. reikalavimo Nr.

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas (jei žinoma)	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
UAB "Elektros automatika"	302504984, Ringuvos g. 65, LT-45245	Ekektrotechnikos dalies darbai	3.63%
UAB "Detas"	300920539, Alytaus g. 12, Babtai, LT-	Nuotekų šalinimo dalies darbai	33.91%
UAB "Baltuvos projektai"	Margirio g. 12, Ringaudai, LT-53335 Kauno r	Ženklinimo darbai	1.81%

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumentas (jame pateikta dalis informacijos) yra konfidencialūs? (Taip / Ne)
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	Ne
2	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Ne

3	Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų	Ne
4	Subtiekimų sutartis, ketinimų protokolai, preliminarinės sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)	Ne
5	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	—

Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtieėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.



SISTEMŲ
REGISTRAS

SERTIFIKATAS

Nr. SRS22/069

2022-05-17

UAB „Elektros automatika“

Ringuvos g. 65, LT-45245 Kaunas, Lietuva

vadybos sistema atitinka žemiau išvardintų standartų reikalavimus:

LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Sertifikavimo sritys:

YPATINGOJO STATINIO STATYBOS RANGOVAS.

STATINIAI: GYVENAMIEJI IR NEGYVENAMIEJI PASTATAI, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INŽINERINIAI TINKLAI (KOLEKTORIAI, BOKŠTAI, STIEBAI IR KITI INŽINERINIAI STATINIAI, SKIRTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLAI), KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI.

STATYBOS DARBŲ SRITYS: ŽEMĖS DARBAI (TRANŠĖJŲ KASIMAS IR UŽPYLIMAS); STATINIO ELEKTROS INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS; PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS; STATINIO NUOTOLINIO RYŠIO (TELEKOMUNIKACIJŲ) INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS; STATINIO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS

Šis sertifikatas galioja iki 2025-05-16

Direktore

Gabija Zarevičienė



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ISO 14001:2015

Sr. 1A20405



UAB „Sistemų registras“
Įmonės kodas 302834882
Taikos pr. 131B, Kaunas
LT-51127 Lietuva
info@sertifikuoti.lt
www.sertifikuoti.lt

EUROMATAS

VŠĮ

ATITIKTIES CERTIFIKATAS

išduotas

UAB „Detas“

Vytauto per. 27, LT-47197 Kaunas

Drobės g. 62, LT-45181 Kaunas

Šiuo sertifikatu VŠĮ "Euromatas" patvirtina, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Sistema taikoma (sertifikavimo sritis)

Neypatingų ir ypatingų statinių (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (galvės); inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai) statybos darbai:

- bendrieji statybos darbai;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;
- betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas;
- statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- šilumos tiekimo tinklų tiesimas;
- statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- dujų tinklų tiesimas;
- statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Sertifikatas galioja nuo 2023-06-23 iki 2026-06-22
Sertifikato Nr. 14/65

Direktorius

Karolis Kyga

Vilnius
2023-06-23



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

UAB "BALTUVOS PROJEKTAI"

Margirio g.12, Ringaudai, Kauno raj., LT-53335 Kauno raj.

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis


Inžinerinių statinių vertikalus ir horizontalus ženklavimas, eismo saugumo priemonių įrengimas.

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:	2022-03-03
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:	-
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:	2022-01-28
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data:	2022-03-03
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:	2025-03-02

Sertifikato numeris: **LT005896**

Versija: **1**

Išdavimo data: **2022-03-03**





0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75



SERTIFIKATAS



TUV
UOLEKTIS

**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015
ir LST EN ISO 45001:2023**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „Kauno keliai“

**R. Kalantos g. 85
LT-52310 Kaunas
Lietuva**

Sertifikavimo sritis:


Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių, kitų inžinerinių statinių, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, statyba. Bendrieji statybos darbai, inžinerinių tinklų tiesimas ir statinių inžinerinių sistemų įrengimas. Statinių griovimas. Statybinio laužo perdirbimas. Statybos produktų gamyba ir pardavimas.

Sertifikato reg. Nr.: TU 15 100 0026
TU 15 104 0026
TU 15 118 0024

Galioja iki: 2027-08-20
Galioja nuo: 2024-08-21

Audito ataskaitos Nr.: 3330 264S V0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis sertifikavimo įstaigos audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu. Sertifikavimo įstaiga veikia pagal ISO/IEC 17021-1:2015 standarto reikalavimus.


TUV Uolektis, UAB
sertifikavimo įstaiga
(TUV Thüringen e.V. sistemų
ir personal sertifikavimo
įstaigos padalinys Lietuvoje)



TUV
UOLEKTIS

Kaunas, 2024-08-21

DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU
IR DĖL IŠTEKLIŲ PRIEINAMUMO SUTARTIES GALIOJIMO METU

2025-07-03

Patvirtinu, kad UAB „Detas“ sutinka būti UAB „Kauno keliai“ subtiekėju Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomame pirkime „Pienių g., Domeikavos k., Kauno r. sav., rekonstravimo rangos darbai“ ir vykdyti šiuos sutartinius įsipareigojimus: vykdyti nuotekų šalinimo dalies darbus.

Patvirtinu, kad mano ištekliai bus prieinami Tiekėjui viso Sutarties galiojimo metu.

Direktorius Egidijus Račkauskas

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)



DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU
IR DĖL IŠTEKLIŲ PRIEINAMUMO SUTARTIES GALIOJIMO METU

2025-07-03

Patvirtinu, kad UAB „Elektros automatika“ sutinka būti UAB „Kauno keliai“ subtiekėju Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomame pirkime „Pienių g., Domeikavos k., Kauno r. sav., rekonstravimo rangos darbai“ ir vykdyti šiuos sutartinius įsipareigojimus: vykdyti elektrotechnikos darbus.

Patvirtinu, kad mano ištekliai bus prieinami Tiekėjui viso Sutarties galiojimo metu.

Direktorius
Aidas Čerka

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU
IR DĖL IŠTEKLIŲ PRIEINAMUMO SUTARTIES GALIOJIMO METU**

2025-07-02

Patvirtinu, kad UAB „Baltuvos projektai“ sutinka būti UAB „Kauno keliai“ subtiekęju Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomame pirkime „Pienių g., Domeikavos k., Kauno r. sav., rekonstravimo rangos darbai“ ir vykdyti šiuos sutartinius įsipareigojimus: dangų ženklavimo darbai.

Patvirtinu, kad mano ištekliai bus prieinami Tiekėjui viso Sutarties galiojimo metu.

Direktorius Linas Vasiljevas
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
