

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/552202

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energinės skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,
- 1.2. **Rangovas:** UAB „Energetikos ranga“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304758522, PVM mokėtojo kodas LT100011447913, registruotos buveinės adresas Parko g.1A, Avižieniai, LT-14198 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-07-21
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **E1E5500024**.
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.8.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:

(2025-ESO-955) 10 kV KL TR1-TR2 rekonstravimo darbus (Šaltupio g. 50A, Anykščiai)

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Pateiks. Nurodoma Techninės specifikacijos arba SD priede
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks.
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks.
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.

3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu):	Aktavimas etapais
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Vienas etapas
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Netaikoma
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	Per 150 (k. d.)
3.11.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras kartų skaičius.).	Nurodoma 1
3.12.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras laikas, valandomis).	Nurodoma 4
3.13.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	Taikoma

**Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike.*

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina – 113.347,96 EUR (šimtas trylika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 96 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 93.676,00 EUR (devyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 0 ct);
 - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 19.671,96 EUR (devyniolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt vienas euras 96 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamasias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos**.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.

- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
- 5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
- 5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinės sumos suderinimo.
- 5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 8.
- 5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami **Šaltupio g. 50A, Anykščiai**.
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas.
- 6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trių tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
- 6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.

- 6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
- 6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.
- 6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso aprašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas.
- 6.12. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
 - 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
 - 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai;
 - 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
 - 8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas;
 - 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
 - 8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
 - 8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
 - 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai;
 - 8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija;
 - 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
 - 8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai;
 - 8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Energetikos ranga“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darbų tipas	Vardas, Pavardė	Padalinys	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2. Rangovo kontaktai:

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

3. Vardas, Pavardė	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

Atsakingi asmenys, kuriems bus reikalingos prieigos* teisės prie informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

Vardas, Pavardė	Pareigos	Rolė (Rangova s/Tiekėjas)	Įmonės darbuotojas / Subrangovas	El. paštas	Tel. numeris	„Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir/arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“****

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

4. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu: partneriai@eso.lt.

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangova iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus pasitelkiami šio pirkimo sutarčiai (toliau – Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Elmetrika“ 302897669;	Darbų kodas: 3.1, 3.4
UAB „Žemės matavimo centras“ 300582945;	geodeziniai darbai kadastras
Nežinomas	tranšėjų kasimas, vamzdžio klojimas uždaru būdu, gerbūvio atstatymas
Nežinomas	Pagal darbų kodus 1.2, 3.2.3

Atkreipiame dėmesį, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po Sutarties sudarymo galės būti pasitelkti Sutarčiai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai iš anksto ir tinkamai informavus užsakovą.

Nauji subrangovai, kurie nėra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sąraše, galės būti pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitimą.

Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Elmetrika“ 302897669;	Darbų kodas: 3.1, 3.4
UAB „Aedilis“ 300056767;	Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3
UAB „Žemės matavimo centras“ 300582945;	geodeziniai darbai kadastras
UAB „Kultūros vertybių paieška“ 300608151;	archeologiniai tyrinėjimai
UAB „Balis“ 304106897;	melioracija
UAB „Elinijos“ 305206929;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB „Trendas“ 302859914;	10, 11

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 3x1x240	m	906

Pastabos:

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „**Užsakovo teikiamų medžiagų perdavimo sąlygos**“. Šią tvarką rasite skiltyje:

Elektros darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikės tiekimo sutartis.](#)

Dujų darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikės tiekimo sutartis.](#)

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje

Elektros darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikės tiekimo sutartis.](#)

Dujų darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikės tiekimo sutartis.](#)

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje.

Elektros darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikės tiekimo sutartis.](#)

Dujų darbai - „[Partneriams](#)“ -> [Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikės tiekimo sutartis.](#)

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju.

Bendrinė ESO teikiamų medžiagų informacija:
Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo medžiagų atsiėmimo punkto.
Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO tinklalapyje: https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciau-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos sutarties pasirašymo.
Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m.
Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju.
Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę.

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */_____*, PVM mokėtojo kodas */_____*, registruotos buveinės adresas */_____*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */_____* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 202_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

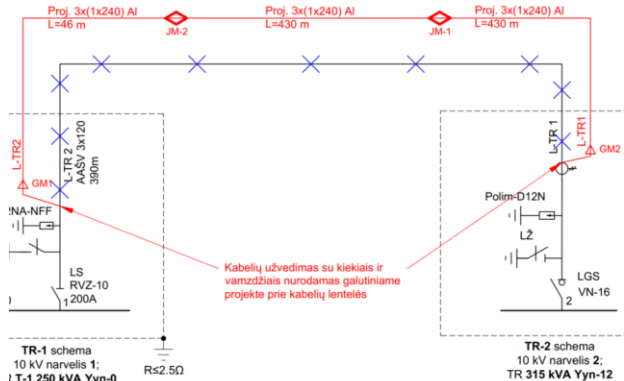
(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Grafiko pateikimo terminai

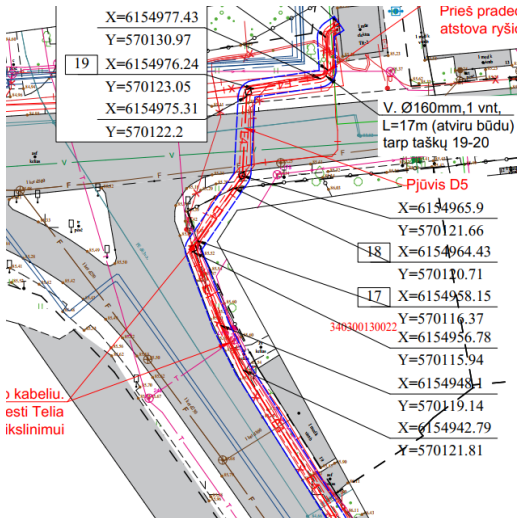
Grafikas pateikiamas per (k.d.):	Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.):
10	iki 120
20	nuo 121 iki 200
30	nuo 201

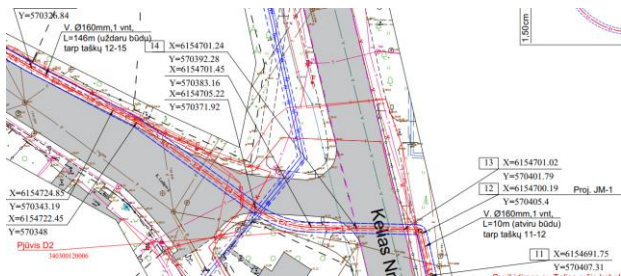
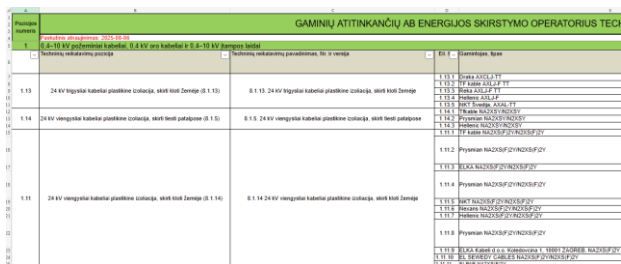
Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

Eil. Nr.	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą	Siūloma korekcija / klausimas	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą
1.			Prašome tikslinti, ESO tiekia 24 kV 1x240 mm² – 2718 viengyslį kabelį, nors projekte nurodyta montuoti suvytą kabelį 3x(1x240 mm²) 906 m, atitinkamai jam ir parinktas vamzdis D160 mm². Kokį kabelį turės montuoti Rangovas, viengyslį ar suvytą? Naudoti vamzdį D-160 mm² ar D-110 mm²?	Pakoreguota SDKŽ 9.2.3 eilutė ESO tiekiamas kabelis 906 m ir pakeista sutarties priede ESO teikiamos medžiagos į suvytą 24 kV kabelį 3x1x240 mm² – 906 m. Kabelio klojimui naudoti 160mm vamzdį.
2.			Prašome patvirtinti, kad Rangovas turi vertintis 10 kV vidaus movą, o ne kištukinę vidaus movą.	Atsakome, kad movos - vidaus tipo (narveliai seno tipo).
3.			Trasos brėžinyje nurodyta kryptinį gręžimą daryti D-160 mm² – 738 m., tačiau kabelių lentelėje nurodyta 592 m., prašome tikslinti, kiek kabelio klojimą uždaro būdu turi vertintis Rangovas?	Uždaru būdu klojamo kabelio ilgis 592 m.
4.			Prašau patvirtinti, kad Rangovas neturi vertintis archeologinių darbų, o jiems prireikus, bus suteikti papildomi pinigai.	Atsakome, kad jei reikės atlikti archeologinius tyrimus, bus apmokėta papildomai.
5.			Prašome patvirtinti, kad Rangovui reikės sėti žolę 150 m².	Patvirtiname, kad reikės sėti žolę 150 m² plote.
6.			Ar Rangovas turi vertintis sandariklius nueinantiems kabeliams į TR ar užteks užsandarinti su putomis?	Atsakome, kad užteks užsandarinti su putomis.
1.	Kita	Principinės schemos br. 2024/369-XX-TDP-E.B-01	Ar turime įsivertinti esamo kabelio demontavimo darbus, nes principinėje schemoje parodyta, o demontavimo darbų žiniaraštyje nėra? 	Atsakome, kad kabelį reikalinga palikti po žeme, demontuoti nereikia.

2.	Kita	Trasos planas br. 2024/369-XX-TDP-E.B-02	Ar gerai suprantame, kad melioracijos darbai bus papildomi darbai, nors ir yra aprašyti pastabose, nes SDKŽ, darbų ir medžiagų žiniaraščiuose šių darbų nėra? 4. Projektuojamo statinio susikirtimo vietose su esamais melioracijos statiniais numatomas drenažo rinktuvų atstatymas atitinkamomis medžiagomis, vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“. Pažeidus drenažo sausintuvus pakeisti atitinkamo diametro naujomis medžiagomis, vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai“.	Atsakome, kad pastaba yra neaktuali. Visoje trasoje nėra melioracijos tinklų, jų atstatyti nereikės.																																																		
3.	Kita	Trasos planas br. 2024/369-XX-TDP-E.B-02	Ar gerai suprantame, kad archeologiniai darbai bus papildomi darbai, nors ir yra aprašyti pastabose, nes SDKŽ, darbų ir medžiagų žiniaraščiuose šių darbų nėra? 5. Objektas patenka į Kultūros paveldo teritoriją "Anykščių senoji miesto vieta", unikalus kodas 17147 ir "Anykščių miesto istorinė dalis", unikalus kodas 17071. Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. <...> Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.	Atsakome, kad jei reikės atlikti archeologinius tyrimus, bus apmokėta papildomai.																																																		
4.	Kita		Prašome papildyti DŽ ir MŽ vamzdžio d160mm klojimas uždaru būdu-592m <table><tr><th rowspan="3">Kabelio markė ir skerspjūvis</th><th rowspan="3">Viso ilgis (m)</th><th colspan="5">Kabelio montavimas</th></tr><tr><th colspan="3">Tranšėjoje</th><th rowspan="2">Uždaru būdu D75mm vamzdyje</th><th rowspan="2">Uždaru būdu D160mm vamzdyje</th></tr><tr><th>Atviru būdu be vamzdžio</th><th>Atviru būdu D75mm vamzdyje</th><th>Atviru būdu D160mm vamzdyje</th></tr><tr><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>6</th><th>7</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>3x(1x240) AL Suvytas</td><td>430</td><td></td><td></td><td>255</td><td></td><td>170</td></tr><tr><td>3x(1x240) AL Suvytas</td><td>430</td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td>398</td></tr><tr><td>3x(1x240) AL Suvytas</td><td>46</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td>24</td></tr><tr><td>Viso:</td><td>906</td><td>0</td><td>0</td><td>304</td><td>0</td><td>592</td></tr></table>	Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Kabelio montavimas					Tranšėjoje			Uždaru būdu D75mm vamzdyje	Uždaru būdu D160mm vamzdyje	Atviru būdu be vamzdžio	Atviru būdu D75mm vamzdyje	Atviru būdu D160mm vamzdyje	4	5	6	6	7	9	10	3x(1x240) AL Suvytas	430			255		170	3x(1x240) AL Suvytas	430			32		398	3x(1x240) AL Suvytas	46			17		24	Viso:	906	0	0	304	0	592	Pridedame papildytus medžiagų ir darbų žiniaraščius.
Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Kabelio montavimas																																																				
		Tranšėjoje				Uždaru būdu D75mm vamzdyje	Uždaru būdu D160mm vamzdyje																																															
		Atviru būdu be vamzdžio	Atviru būdu D75mm vamzdyje	Atviru būdu D160mm vamzdyje																																																		
4	5	6	6	7	9	10																																																
3x(1x240) AL Suvytas	430			255		170																																																
3x(1x240) AL Suvytas	430			32		398																																																
3x(1x240) AL Suvytas	46			17		24																																																
Viso:	906	0	0	304	0	592																																																
5.	Kita		Prašome patikslinti kokį turime įsivertinti kabelį, nes Rangovui teikiamų medžiagų sąrašė 1x240, o AR, MŽ ir kabelių montavimo lentelėje suvytas 3x(1x240)?	Pakoreguota SDKŽ 9.2.3 eilutė ESO tiekiamas kabelis 3x1x240 mm2 906 m ir pakeista sutarties priede ESO teikiamos medžiagos į 24 kV																																																		

			RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI <table><tr><th>Eil. Nr.</th><th>Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos</th><th>Mato vnt.</th><th>Kiekis</th></tr><tr><td>1</td><td>24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 1x240</td><td>m</td><td>2718</td></tr></table> 4.2 ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI 1) Tarp transformatorinių TR1-TR2 pakeisti esamą 10kV kabelių liniją į naują naudojant suvytą 3x1x240mm kabeli. <table><tr><th colspan="4">Kabelio protarpis</th></tr><tr><th>Eil. Nr.</th><th>Kabelio pradžia</th><th>Kabelio pabaiga</th><th>Kabelio markė ir skerspjūvis</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>1.</td><td>TR-1</td><td>Proj. JM-1</td><td>3x(1x240) AL Suvytas</td></tr><tr><td></td><td>Proj. JM-1</td><td>Proj. JM-2</td><td>3x(1x240) AL Suvytas</td></tr><tr><td>2.</td><td>Proj. JM-2</td><td>TR-2</td><td>3x(1x240) AL Suvytas</td></tr></table><table><tr><td>1.</td><td>Techniniai reikalavimai 24 kV viengysliams kabeliams plastikine izoliacija, skirtiems kloti žemėje: -Laidininkų skaičius – 3; -Laidininkas - 2 klasės suvytas, supresuotas apvalus aliuminio (Al) laidininkas pagal LST EN Al 1x240 mm2; -Kabelio suvyniojimas ant būgno - suvyniojimas ant būgno trys supinti viengysliai „triplex“ pozicija (3x1x240 mm2)</td><td>AL3z1x240 mm²</td><td>m</td><td>906</td></tr></table>	Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	1	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 1x240	m	2718	Kabelio protarpis				Eil. Nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis	1	2	3	4	1.	TR-1	Proj. JM-1	3x(1x240) AL Suvytas		Proj. JM-1	Proj. JM-2	3x(1x240) AL Suvytas	2.	Proj. JM-2	TR-2	3x(1x240) AL Suvytas	1.	Techniniai reikalavimai 24 kV viengysliams kabeliams plastikine izoliacija, skirtiems kloti žemėje: -Laidininkų skaičius – 3; -Laidininkas - 2 klasės suvytas, supresuotas apvalus aliuminio (Al) laidininkas pagal LST EN Al 1x240 mm2; -Kabelio suvyniojimas ant būgno - suvyniojimas ant būgno trys supinti viengysliai „triplex“ pozicija (3x1x240 mm2)	AL3z1x240 mm²	m	906	kabelį 3x1x240 mm2 – 906 m. Pridedami aktualūs dokumentai.
Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis																																						
1	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 1x240	m	2718																																						
Kabelio protarpis																																									
Eil. Nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis																																						
1	2	3	4																																						
1.	TR-1	Proj. JM-1	3x(1x240) AL Suvytas																																						
	Proj. JM-1	Proj. JM-2	3x(1x240) AL Suvytas																																						
2.	Proj. JM-2	TR-2	3x(1x240) AL Suvytas																																						
1.	Techniniai reikalavimai 24 kV viengysliams kabeliams plastikine izoliacija, skirtiems kloti žemėje: -Laidininkų skaičius – 3; -Laidininkas - 2 klasės suvytas, supresuotas apvalus aliuminio (Al) laidininkas pagal LST EN Al 1x240 mm2; -Kabelio suvyniojimas ant būgno - suvyniojimas ant būgno trys supinti viengysliai „triplex“ pozicija (3x1x240 mm2)	AL3z1x240 mm²	m	906																																					
6.	Kita		Ar nepadaryta klaida MŽ nurodant, kad vamzdis d160mm -vario vielų? <table><tr><td>4.</td><td>Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai - vario vielų;</td><td>160mm²</td><td>m</td><td>304</td><td>9.3</td></tr></table>	4.	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai - vario vielų;	160mm²	m	304	9.3	Pakoreguota. Per klaidą iš projektuotojo pusės buvo parašyta vario vielų.																															
4.	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai - vario vielų;	160mm²	m	304	9.3																																				
7.	Kita		Prašome papildyti DŽ vamzdžio d160mm klojimas atviru būdu-304m	Papildytas darbų žiniaraštis.																																					

			<table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Kabelio I</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Tranšėjoje</td></tr><tr><td>Kabelio markė ir skerspjūvis</td><td>Viso ilgis (m)</td><td>Atviru būdu be vamzdžio</td><td>Atviru būdu D75mm vamzdėje</td><td>Atviru būdu D160mm vamzdėje</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>3x(1x240) AL Suvytas</td><td>430</td><td></td><td></td><td>255</td></tr><tr><td>3x(1x240) AL Suvytas</td><td>430</td><td></td><td></td><td>32</td></tr><tr><td>3x(1x240) AL Suvytas</td><td>46</td><td></td><td></td><td>17</td></tr><tr><td>Viso:</td><td>906</td><td>0</td><td>0</td><td>304</td></tr></table>			Kabelio I					Tranšėjoje			Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Atviru būdu be vamzdžio	Atviru būdu D75mm vamzdėje	Atviru būdu D160mm vamzdėje	4	5	6	6	7	3x(1x240) AL Suvytas	430			255	3x(1x240) AL Suvytas	430			32	3x(1x240) AL Suvytas	46			17	Viso:	906	0	0	304	
		Kabelio I																																										
		Tranšėjoje																																										
Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Atviru būdu be vamzdžio	Atviru būdu D75mm vamzdėje	Atviru būdu D160mm vamzdėje																																								
4	5	6	6	7																																								
3x(1x240) AL Suvytas	430			255																																								
3x(1x240) AL Suvytas	430			32																																								
3x(1x240) AL Suvytas	46			17																																								
Viso:	906	0	0	304																																								
8.	Kita		Ar turime įsivertinti asfalto dangos atstatymo darbus prie TR-1, nes DŽ nėra?	Papildytas darbu žiniaraštis.																																								
9.	Kita	Trasos planas br. 2024/369-XX-TDP-E.B-02	Sunkiai įsivaizduojame, kaip praktiškai pakloti kabelį uždaru būdu tarp taškų 16-19, nes nurodytas grėžimas ištisai. Reikėtų daryti grėžimus atkarpomis, numatant prieduobes ir ardant esamas dangas (trinkeles). Prašome patikslinti projekto sprendinius. 	Atsakome, jog vykdant darbus reikalinga nusimatyti papildomų prieduobių kryptiniam grėžimui. Projekto sprendiniai nebus koreguojami.																																								
1.	Kita	Trasos planas br. 2024/369-XX-TDP-E.B-02	Kartojame klausimą į kurį negavome atsakymo: Sunkiai įsivaizduojame, kaip praktiškai pakloti kabelį uždaru būdu tarp taškų 12-15, nes nurodytas grėžimas ištisai. Reikėtų daryti grėžimus atkarpomis, numatant prieduobes ir ardant esamas	Patiksliname, kad kabelis turi būti paklotas uždaru būdu taip, kaip numatyta projekte. Projekto sprendiniai nebus koreguojami.																																								

			dangas (trinkeles). Prašome patikslinti projekto sprendinius. 			
2.	Kita	Trasos planas br. 2024/369-XX-TDP-E.B-02	Kartojame klausimą į kurį negavome atsakymo: Projekte turi būti pateikti pjūviai, kur projektuojamas kabelis kerta kitas komunikacijas, nurodant kertamų komunikacijų altitudes ir minimalius atstumus iki jų. Prašome pateikti susikirtimų pjūvius.	Atsakome, kad susikirtimų pjūvių pateikti negalime. Inžinerinių tinklų gylio nustatymu turės pasirūpinti pats Rangovas.		
3.	Kita		Jei paaiškės, kad trinkelės paklotos už ES lėšas (jų garantija yra 5m.) ir savivaldybė neleis ardyti trinkelėlių – ar objekto atlikimo terminas bus stabdomas iki kol baigsis garantija ir bus galima ardyti trinkeles? Priešingu atveju objektas taptų neįgyvendinamas, nes pakloti kabelį uždaru būdu ištaisai (kaip nurodyta projekte) tarp taškų 12-15, 16-19, neardant trinkelėlių ir nedarant tarpinių prieduobių yra neįmanoma.	Patiksliname, kad tuo atveju jei savivaldybė neleis darytis prieduobių dėl ES lėšomis įrengtos trinkelėlių dangos, projektą reikės stabdyti ir laukti termino pabaigos.		
4.	Kita		Atsakymuose patikslinta, kad klojamas kabelis bus suvytas 3x1x240. Tačiau tokio kabelio nėra ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašė.  Kokius techninius reikalavimus turi atitikti kabelis – 8.1.14? Ar tikrai šį kabelį tiek ESO, nes mes nežinome kokį tiksliai kabelį įsivertinti, taigi nežinome ir tikslios kabelio kainos. Ar tikrų kabelis pvz. - AHXCMK-WTC/PE(WTR)-10-3x240/25?	Patiksliname, kad 3x1x240 kabelį patieks AB ESO, tačiau turite įsivertinti ir jūsų siūlomą kainą tam atvejui, jei darbų vykdymo metu ESO negalės pateikti minėto kabelio. 3x1x240 kabelio techniniai reikalavimai yra 8.1.14. Jų aprašyme yra pateikta ši informacija: <table><tr><td>15.</td><td>Kabelio suvyniojimas ant b</td></tr></table> Taip pat patiksliname, kad kabelis AHXCMK-WTC/PE(WTR)-10-3x240/25 netinka.	15.	Kabelio suvyniojimas ant b
15.	Kabelio suvyniojimas ant b					

1.	Kita		Prašome patikslinti dėl 24kV kabelio. Jei ESO netieks kabelio ir Rangovas pats turės tiekti kabelį – ar tiks kabelis AXLJ-TTCL TSLF Triplex 3x1x240/35? Tokio kabelio nėra ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše ir kabelio tiekimo terminas 3-4 mėn. Taipogi - jei kabelį turės tiekti Rangovas – ar darbų vykdymo terminas bus pratęstas/nukeltas?	Patiksliname, kad kabelio AXLJ-TTCL TSLF Triplex 3x1x240/35 siūlyti negalima, nes jo nėra ESO patvirtintų medžiagų sąraše. Tuo atveju, jei kabelį turės pateikti Rangovas, jo pristatymo terminas suderinamas su Užsakovu vadovaujantis 6.9.1. punktu, to pasėkoje darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas pagal sutarties BD 6.9.2 punktą: "Užsakovas ir Rangovas sudaro raštišką susitarimą tarp Šalių dėl termino keitimo. "
2.	Kita		Prašome atnaujinti prie pirkimo dokumentų pridėtus dokumentus: „2.2 Sutarties BD projektas“ ir „2.3 Sutarties SD projektas“, nes dauguma juose esančių nuorodų yra arba neveikiančios (paspaudus ant nuorodos, rašo „Atsiprašome, puslapio kurio ieškote nėra.“), arba klaidingos (paspaudus ant nuorodos, nukreipia į neteisingą puslapį). Pvz. Sutarties SD priedas Nr. 4 esančios nuorodos.	Ačiū už pastabą, pridedame atnaujintas Sutarties SD ir BD.
