
DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40500/571470

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

Jungtinės veiklos partneriai Uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“, Uždaroji akcinė bendrovė „Geovizija“, Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“, Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekis“ - **Uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **124552684**, PVM mokėtojo kodas **LT245526811**, registruotos buveinės adresas **Ateities pl. 45D, LT-52119 Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **UAB „Geovizija“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **300810466**, PVM mokėtojo kodas **LT100003215414**, registruotos buveinės adresas **Europos pr. 60, LT-46362 Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **133276384**, PVM mokėtojo kodas **LT332763811**, registruotos buveinės adresas Elektrėnų g. 7, **LT-51193 Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekis“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **132121146**, PVM mokėtojo kodas **LT321211419**, registruotos buveinės adresas **Partizanų g. 83, LT-50310 Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **atstovaujami Uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ gamybos direktoriaus Mykolo Radvilavičiaus**, veikiančio pagal 2017 m. balandžio 12 d. jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis 2017 m. kovo 31 d.
 - 1.2.2. Rangovo 2017 m. balandžio 18 d. pasiūlymu Nr.170418 bei 2017 m. gegužės 10 d. galutiniu pasiūlymu Nr.170510.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti – **(14335) Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 100.000,00 EUR be PVM, Kauno regione** (toliau kartu vadinama Darbais) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai, kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas:
 - 3.1.1. Dujotiekio įvadų projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 95 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.
 - 3.1.2. Skirstomųjų dujotiekių projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 140 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.
- 3.2. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai, kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas:
 - 3.2.1. Dujotiekio įvadų projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 71 kalendorinę dieną nuo Užsakymo pateikimo dienos.
 - 3.2.2. Skirstomųjų dujotiekių projektavimo Paslaugai ir Darbams atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.
- 3.3. Vartotojų dujų sistemų įrengimo Darbus Tiekėjas atlieka per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per:
 - 3.3.1. 30 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai topografinę nuotrauką Tiekėjas turi arba ją pateikia Užsakovas.

3.3.2. 45 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai Tiekėjas topografinės nuotraukos neturi ir Užsakovas negali jos pateikti ir ją reikia užsakyti papildomai.

3.3.3. Vidaus dujų sistemos montavimo darbus Tiekėjas atlieka ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Užsakovo gavimo dienos, kad klientas yra įsirengęs dujinį (-ius) prietaisą (-us) ir turi visą reikiamą dokumentaciją (dėl dujinių prietaisų, ventiliacijos angų, dūmtraukių įrengimo).

4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI

4.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **6.050.000,00 EUR** (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių EUR 00 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:

4.1.1. Darbų kaina – 5.000.000,00 EUR (penki milijonai EUR 00 ct);

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 1.050.000,00 EUR (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct).

4.2. Apmokėjimo už Darbus tvarka ir terminai pateikti Sutarties BD 11 dalyje.

5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS

5.1. Sutarties SD priede Nr. 3 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties SD priede Nr. 8 ir Sutarties BD nurodytomis sąlygomis.

6. MEDŽIAGOS

6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas medžiagas (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedas Nr.3): NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ be spintas laikančių rėmų; požeminius uždarymo įtaisus; apsauginius šulinėlius su pagrindais; dujotiekių žymėjimo ženklus; stulpelius ženklams; dujų srauto ribotuvus (stop movas).

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.

7.2. Sutarties garanto dydis: **15.000,00 EUR**.

8. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

8.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus:** _____.

8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5.

8.3. Sutartis iš Rangovo pusės bus vykdoma 2017 m. balandžio 12 d. tarp Rangovo ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Geovizija“, Uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“, Uždarnosios akcinės bendrovės „Dujotiekis“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties garanto pateikimo dienos**.

9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.

9.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo darbų užsakymas;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo objekto apimtys;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai;

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;

10.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;

10.2.6. Priedas Nr. 6 – Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema;

10.2.7. Priedas Nr. 7 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);

10.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;

10.2.9. Priedas Nr. 9 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;

10.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija;

10.2.11. Priedas Nr. 11 – Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė;

10.2.12. Priedas Nr. 12 – Pavyzdinis dujotiekio techninis darbo projektas;

10.2.13. Priedas Nr. 13 – Preliminari dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų sąmata.

10.2.14. Pirkimo objekto teritorijos žemėlapis.

10.2.15. Spintelių techninė specifikacija.

10.2.16. Užrašo pavyzdys.

10.2.17. Spintelių pavyzdinės schemos su pavyzdiniu sumontavimu.

11. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“

A.S. LT91 7180 5000 2346 7869

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, banko kodas 7180

Tel. 8 37 385550

El.paštas: info@labasgas.lt

Gamybos direktorius

Mykolas Radvilavičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

Generalinė direktorė

Dalia Andrulionienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____ priedas
prie 20__ m. _____ sutarties
Nr. _____

**PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ
UŽSAKYMAS**

Data: _____

Užsakovas, įmonės kodas: _____

Rangovas, įmonės kodas: _____

Objekto pavadinimas: _____

Darbų pabaiga (gavus statybos užbaigimo dokumentus/vartotojo dujų sistemai - VEI pažymą): _____

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Vartotojų kontaktiniai duomenys	
2	Žemės sklypo(-ų) planas	
3	Žemės sklypo(-ų) nuosavybės pažymėjimas (-ai)	
4	Prisijungimo sąlygos	
5	Topografinė nuotrauka (jeigu turime)	
6	...	

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

Pirkimo objekto apimtys

Eil. Nr.	Skelbiamų darbų zonos	Preliminarūs kiekiai 3 metams	
		Min. objektų skaičius, vnt.	Max. objektų skaičius, vnt.
1	Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbai Kauno regione.	10	15.000

Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos dujos“
dujų tinklo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 2-7

VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20.... m. d.

Užsakovas: _____

Rangovas: _____

Eil. Nr.	Vertybių kodas	Perduodamos vertybės (medžiagos) pavadinimas ir jos charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Rangos sutarties data

Viso:

Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo.

Išduoti leido: _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vertybes išdavė: _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20.... m. d.

A.V.

Vertybes priėmė: _____


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20.... m. d.

A.V.

Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema

1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema.

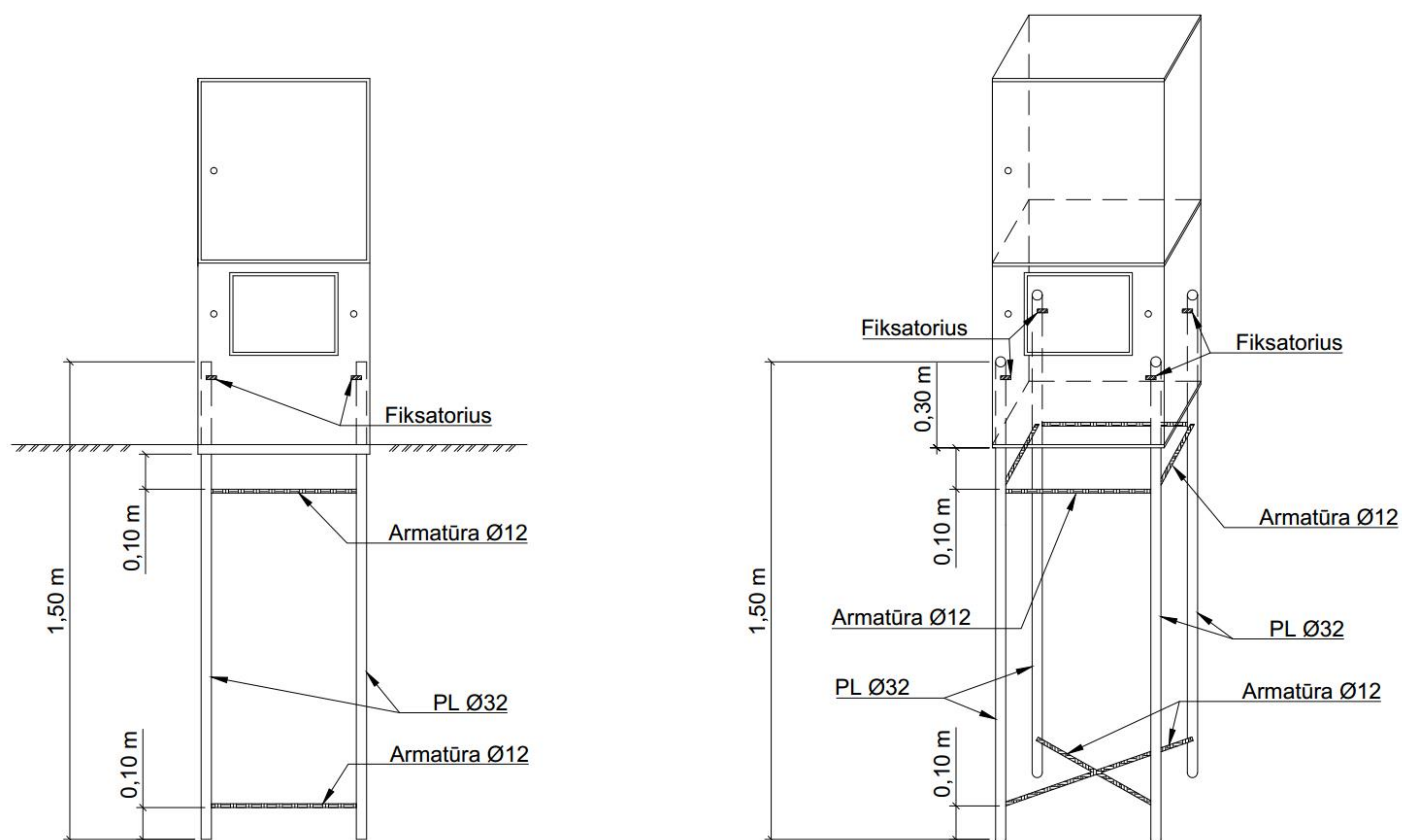

Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis *Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.

RANGOS BŪDU ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS (F-2)

Užsakovas, įmonės kodas:

Rangovas, įmonės kodas:

Objekto pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm		Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
2	Požeminio PE dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
3	Požeminio PE dujotiekio su sustiprinta apsaugine danga ir fasoninių dalių montavimo darbai, dujotiekį montuojant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
4	PL dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (iki d _{is} 375,0 mm)	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
5	Dujotiekio demontavimas	m'	d ₁				0,00
		m'	d ₂				0,00
		m'	d _n				0,00
6	Dėklo montavimas						
6.1	Dėklo montavimas uždaru būdu (įkainis pagal išorinį dėklo diametrą)	m'	d _n				0,00
6.2	Dėklo montavimas atviru būdu (įkainis pagal išorinį dėklo diametrą)	m'	d _n				0,00

6.3	Dėklo montavimas atviru būdu (įkainis pagal išorinį dėklo diametrą) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus	m'	d _n				0,00
7	Vartotojo dujų sistemos pastate montavimas						
7.1	Vidaus dujų sistemos montavimo darbai	obj	d _n				0,00
7.2	Požeminio dujotiekio dalies per pastato pamatą įrengimas (visi reikalingi darbai ir medžiagos)	obj	d _n				0,00
7.3	PL dujotiekio įrengimas bendrojo naudojimo patalpose (daugiabučių laiptinėse ir pan.) (visi reikalingi darbai, įskaitant pastato statybinių konstrukcijų kirtimą ir visos medžiagos (įskaitant vamzdžius, dėklus))	m'	d _n				0,00
7.4	Konsultacija vidaus dujotiekio įrengimo klausimais (aplankant objektą)	vnt	-				0,00
8	Pirminis dujų paleidimas	obj	d _n				0,00
9	Dangų ardymas ir atstatymas						
9.1	asfalto dangos	m2	d _n				0,00
9.2	asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymui	m2	d _n				0,00
9.3	žvyro dangos	m2	d _n				0,00
9.4	šaligatvio (plytelių)	m2	d _n				0,00
9.5	trinkelio dangos atstatymas	m2	d _n				0,00
9.6	akmens grindinio	m2	d _n				0,00
9.7	vejos (visų tipų)	m2	d _n				0,00
9.8	betono dangos	m2	d _n				0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės, reguliavimo ir apskaitos įtaisų montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos)						
10.1	Pakabinamos spintelės	vnt	d _n				0,00
10.2	Pastatomos spintelės	vnt	d _n				0,00
10.3	Spintelės keitimas	vnt	d _n				0,00
11	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės su reguliavimo įtaisais						
11.1	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu	vnt	-				0,00
11.2	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (1-2 apskaitos įtaisams)	vnt	-				0,00
11.3	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	vnt	-				0,00
11.4	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu	vnt	-				0,00

11.5	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu (1-2 apskaitos įtaisams)	vnt	-				0,00
11.6	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	vnt	-				0,00
12	Uždarnosios požeminės armatūros montavimo darbai	vnt	d _n				0,00
13	Požeminė uždarojoji armatūra	vnt	d _n				0,00
14	Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį (įpjova)						
14.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais įpjovos, izoliavimo darbais ir medžiagomis)	vnt	d _n				0,00
14.2	Į požeminį PL dujotiekį (frezavimo būdu), kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais įpjovos, izoliavimo darbais ir medžiagomis)	vnt	d _n				0,00
14.3	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt	d _n				0,00
15	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
15.1	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 50,00 m.	projektui	-				0,00
15.2	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 50,01 - 500,00 m.	projektui	-				0,00
15.3	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥ 500,01 m.	projektui	-				0,00
15.4	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 50,00 m.	obj	-				0,00
15.5	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 50,01 - 500,00 m.	obj	-				0,00
15.6	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥ 500,01 m.	obj	-				0,00
15.7	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 50,00 m.	obj	-				0,00
15.8	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 50,01 - 500,00 m.	obj	-				0,00
15.9	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥ 500,01 m.	obj	-				0,00
15.10	Vartotojo dujų sistemos projektavimo paslaugos (požeminio dujotiekio/vidaus dujų sistemos daliai)	projektui	-				0,00
15.11	Trasos nužymėjimas	obj	-				0,00
16	Kitos statinio išlaidos						
16.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj	-				0,00
16.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą požeminiam dujotiekiui	pažymai	-				0,00

16.3	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą vidaus dujų sistemai	pažymai	-				0,00
16.4	Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai (dujinio katilo pridavimui)	obj	-				0,00
16.5	Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikra ir patikros akto paruošimas	vnt	-				0,00
16.6	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę	obj	-				0,00
16.7	Kelių ženklų pastatymas	obj	-				0,00
16.8	Statybinio laužo išvežimas	t	-				0,00
Suma be PVM							0,00
PVM 21%							0,00
Viso su PVM							0,00

Užsakovas:

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

(parašas, data)

A.V.

A.V.

Įkainių perskaičiavimo sąlygos

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metų paskutinį mėnesį;

1.2. Jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;

1.3. Pirmą kartą perskaičiuojant ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

C_{pn} – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

S_n – Sutartyje numatytas Darbui taikomas įkainis

I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;

1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus Įkainius.

Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Sąskaitos pateikiamos: kaunas.saskaitos@eso.lt, Kauno regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė, Chemijos g. 4, Kaunas.
- 1.2. Paslaugos rezultatai pateikiami: Kauno regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė, Chemijos g. 4, Kaunas.
- 1.3. Aktai pateikiami: Kauno regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė, Chemijos g. 4, Kaunas.
- 1.3. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas: Kauno regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė, Chemijos g. 4, Kaunas.
- 1.4. Medžiagų perdavimas – priėmimas: priėmimas: Atsakingas asmuo- Kauno regiono dujų tinklo projektų valdymo grupės projektų vadovas. Išdavimo adresas - Chemijos g. 23, Kaunas.
- 1.5. Darbų techninę priežiūrą vykdydys: Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus techninės priežiūros inžinierius.

2. Rangovo kontaktai:

- 2.1. Informacijai apie Darbų trūkumus pranešti: UAB "LabasGAS" Mykolas Radvilavičius tel.nr. 8-612-75951.
- 2.2. Statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų kontaktai:
 - UAB"Dujotiekis" Jonas Rezgys te.nr. 8-698-32301
 - UAB"Geovizija" Rimantas Verikas tel.nr. 8-699-07514
 - UAB"Kauno dujotiekio statyba" Giedrius Kiškionis tel.ne. 8-686-71636
 - UAB"LabasGAS" Marius Jakubauskas tel.nr. 8-620-49929.

Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė

Gamtinių dujų skirstymas esamiems vartotojams gali būti apribotas ar nutrauktas vadovaujantis Sutarties BD sąlygomis. Maksimali gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė, priklausomai nuo atjungiamo dujotiekio diametro, pateikta lentelėje:

Atjungiamo dujotiekio sąlyginis skersmuo	Maksimali atjungimo trukmė, val.
≤DN50	2
DN60	2
DN80	2
DN100	3
DN125	3
DN150	3
DN200	3
DN250	4
≥DN300	4
