

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/542028

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Perspektyvos g. 18, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-09-03.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **E1T2100002**.
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.8.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.
- 2.10. Objektas gali būti dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklą „Pažangiųjų energetikos sistemų skaitmeninio valdymo sistemų diegimas, pritaikant elektros energijos skirstomuosius tinklus AEI plėtrai“ Nr. 03-015-T.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:
(2024-ESO-816) 35/10 kV Ariogalos TP rekonstravimo darbus, Raseinių r sav. Ariogala, Taurupio g. 24

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Nepateiks.
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks.
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu):	Aktavimas etapais
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Netaikoma
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Trys etapai
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	Per 610 (k. d.) 1 etapas - Darbo projektas, 2 etapas - Įtampos įjungimas į 35 kV ir 10 kV skirstyklos, bei pirmą naujai sumontuotą galios transformatorių, 3 etapas - Įtampos įjungimas į antrą naujai sumontuotą galios transformatorių, gerbūvio sutvarkymo darbai, kadastrinių matavimų byla, statybos užbaigimo deklaracija.
3.11.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras kartų skaičius.).	Nenurodoma
3.12.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras laikas, valandomis).	Nenurodoma
3.13.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	Taikoma

**Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike.*

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina – 3.191.905,21 EUR (trys milijonai šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penki eurai 21 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 2.637.938,19 EUR (du milijonai šeši šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 19 ct);
 - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 553.967,02 EUR (penki šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai 2 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.

- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.**

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus.**
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
- 5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
- 5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinų sumų suderinimo.
- 5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 7.
- 5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. **Darbai atliekami Taurupio g. 24, Ariogala, Raseinių r. sav.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi

- (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 12). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 8 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas.
- 6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trių tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
- 6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.
- 6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
- 6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.
- 6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso aprašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas.
- 6.12. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietas paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.
- 7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**
- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinų klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradėdant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
 - 8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
 - 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai;
 - 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninių atitikimų lentelės;
 - 8.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
 - 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
 - 8.2.7. Priedas Nr. 7 - Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
 - 8.2.8. Priedas Nr. 8 - Grafiko pateikimo terminai;
 - 8.2.9. Priedas Nr. 9 - Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
 - 8.2.10. Priedas Nr. 10 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai.
 - 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darbų tipas	Vardas, Pavardė	Padalinys	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2. Rangovo kontaktai:

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

Vardas, Pavardė	Pareigos	Rolė (Rangovas/Tiekėjas)	Įmonės darbuotojas/ Subrangovas	El. paštas	Tel. numeris	„Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir/arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt.

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Aedilis“	4.2 (iki 10 kV) 4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 4.3 1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbus.
UAB "Relinės apsaugos ekspertai"	4.2 (iki 10 kV) 4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 4.3 1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą.
UAB "Elektros inžinerija"	4.2 (iki 10 kV) 4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 4.3 1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą.
UAB "Elinijos"	1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)).

	1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos.
UAB "Energetikos projektai"	1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos.
Uždaroji akcinė bendrovė "HOLO PROJECTS "	1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji

	pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos.
Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris"	1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymo darbams pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas. 1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas atliekas) pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas
UAB "KRS"	1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbus.

Subtiekėjo pavadinimas¹	Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis, kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
UAB „Labas GAS“	<u>Gerbūvio sutvarkymas</u>
UAB „EWEX projektas“	<u>Transformatorių remontas, įrangos tiekimas</u>

¹ Nurodomas konkretus Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Prašymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „Nežinomas“.

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 202_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):	Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.):
10	iki 120
20	nuo 121 iki 200
30	nuo 201

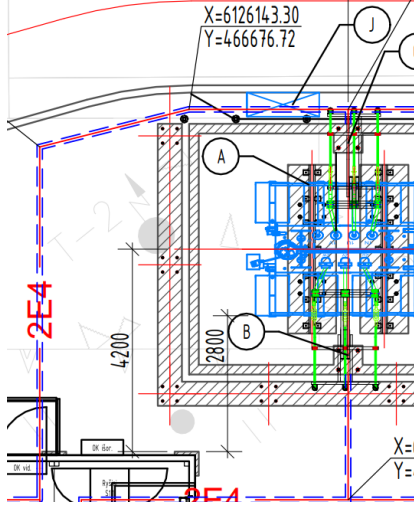
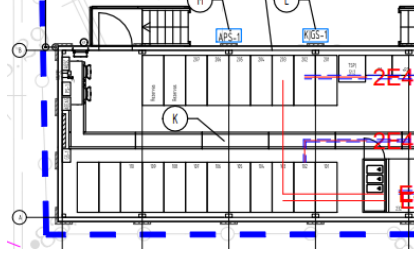
Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

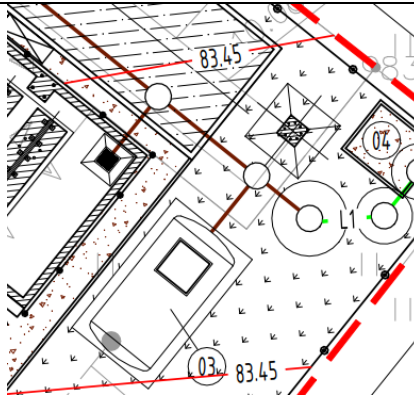
Eil.N r.**	<i>Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*</i>	<i>Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas</i>	<i>Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas</i>	<i>Atsakymai</i>
1.	05_2021-49-XX-RTP-E-0	Sąnaudų žiniaraštis p.1.1.226	Rangovai teiraujasi, ar galima giluminiam įžemikliui naudoti vamzdį 100x100x4mm?	Atsakome, kad giluminiam įžemikliui galima naudoti vamzdį 100x100x4mm.
1.	* Kita	2021-49-XX-RTP-E.B-01	Prašome pateikti patikslintą principinę schemą, kurioje būtų matyti 42 kV ir 24 kV kabelių atstumai tarp įrenginių.	Atsakome, kad techniniame projekte yra numatyti kiekiai. Atstumai turės būti tikslinami darbo projekto metu.
2.	* Kita	2021-49-XX-RTP-E.SŽ, 1.1.241 ir 1.1.242 punktai	Prašome patikslinti galios ir kontrolinių kabelių kiekius. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra numatyti sumontuoti 1'100m galios ir kontrolinių kabelių, kas yra ženkliai permažai tokio dydžio objektui.	Kiekiai patikslinti. Pridedame patikslintą bylą.
3.	* Kita	2021-49-XX-RTP-E.SŽ, 1.1.45, 1.1.105, punktai	Prašome patikslinti ar galime siūlyti 42 kV viengyslius kabelis trijų gamintojų?	Paaiškiname, kad negalima siūlyti trijų gamintojų 42 kV kabelių.
4.	* Kita	2021-49-XX-RTP-E.SŽ, 2.4.1. punktas	Prašome patikslinti kaip detalai turės būti demontuojami 10 kV narveliai? Ar kokios nors įranga turės būti gražinta į AB ESO sandėlį?	Ką iš išmontuojamos esamos skirstyklos reikės gražinti į Užsakovo sandėlį, bus patikslinta Darbo projekto rengimo metu.
5.	* Kita	Techninio projekto patikslinimai, 59 punktas	Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti Schneider Electric, GHA įrangos gamintojo mokymo kursų? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose?	Paaiškiname, kad Schneider Electric GHA mokymo kursų įsivertinti nereikia. Informuojame, kad Užsakovas planuoja dalyvauti gamykliniuose bandymuose.
6.	* Kita	Techninio projekto patikslinimai, 59 punktas	Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti Siemens, NXPLUS įrangos gamintojo mokymo kursų? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose?	Paaiškiname, kad Siemens NXPLUS mokymo kursų įsivertinti nereikia. Informuojame, kad Užsakovas planuoja dalyvauti gamykliniuose bandymuose.
7.	* Kita	Techninio projekto patikslinimai, 59 punktas	Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti UAB „ELGA“, USN-10/150 įrangos gamintojo mokymo kursų? Taip pat ar užsakovo atstovai	Paaiškiname, kad ELGA USN-10/150 mokymo kursų įsivertinti nereikia. Informuojame, kad Užsakovas planuoja dalyvauti gamykliniuose bandymuose.

			planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose?	
8.	* Kita	Techninio projekto patikslinimai, 59 punktas	Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti Elektromontaz, „ODRA“ įrangos gamintojo mokymo kursų? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose?	Paaiškina, kad Elektromontaz ODRA mokymo kursų įsivertinti nereikia. Informuojame, kad Užsakovas planuoja dalyvauti gamykliniuose bandymuose.
9.	* Kita	2021-49-XX-RTP-RAV.SŽ, 1.3. punktas	Prašome pateikti transformatoriaus aikštelės gnybtų spintos (TAGS) principinę schemą.	Paaiškina, kad TAGS spinta projektuojama darbo projekto metu.
10.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.B-03.	Pateiktoje schemoje nurodoma, kad reikia pakeisti 9 atramas sumontuojant vertikalius skyriklius. Prašome patikslinti kokio tipo/aukščio turi būti montuojamos atramos? Pateiktoje schemoje ar sąnaudų kiekių žiniaraštį atramos tipai nenurodomi.	Paaiškina, kad atramos standartinės, pateiktos ir viešai prieinamos AB „Energijos skirstymo operatorius“ internetiniame puslapyje 0,4 - 10 KV TIPINIŲ PROJEKTŲ ALBUMUOSE.
11.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.B-02, 1 lapas iš 11	Projekte nurodoma, kad yra demontuojama tarpinė atrama Nr. 100/11 ir vietoje jos sumontuojama nauja galinė atrama, tačiau nuo šios atramos yra OL atšaka L-115. Prašome patikslinti kas atliks šios linijos permaitinimo darbus? (šie darbai nėra minimi šio projekto apimtyse).	Patikslina, kad minėtus permaitinimo darbus turi įsivertinti ir atlikti Rangovas.
12.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 100/11 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 565m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 594m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
13.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 100/11 vamzdžio d75mm, 1250N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3+1xd75mm) yra numatyta 126m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3+1xd75mm) yra 124m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
14.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 200/13 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 416m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02)	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.

			vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 528m.	
15.	<i>* Kita</i>	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 200/13 vamzdžio d75mm, 1250N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3+1xd75mm) yra numatyta 118m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3+1xd75mm) yra 114m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
16.	<i>* Kita</i>	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 1000/7 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 514m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 541m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
17.	<i>* Kita</i>	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 500/4 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 415m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 418m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
18.	<i>* Kita</i>	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 900/7 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 374m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 377m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
19.	<i>* Kita</i>	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 600/3 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 174m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 177m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
20.	<i>* Kita</i>	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 700/5 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 337m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02)	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.

			vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 367m.	
21.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 300/6 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 299m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 327m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
22.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – atrama Nr. 400/3 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 201m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 204m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
23.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.B-05 ir 2021-49-XX-RTP-EL.B-02	Prašome patikslinti atkarpos Ariogalos TP – L-MTA802 kabelio JM2 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 11m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 26m.	Pridedama aktuali byla, kurioje kiekiai sutampa.
24.	* Kita	2021-49-XX-RTP-E.B-02	Prašome pateikti metalo konstrukcijų brėžinius. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra nurodyti metalo konstrukcijų brėžiniai tačiau nėra pateikta joks konstrukcijų brėžinys.	Paaiškiname, kad Techninio projekto metu metalo konstrukcijos nedetalizuojamos, tai darbo projekto apimtis.
25.	* Kita	2021-49-XX-RTP-SK-0.B-03	Prašome patikslinti kaip turės būti aptverti 35 kV įtampos transformatoriai JT-31 ir JT-32?	Paaiškiname, kad JT-31 ir JT-32 turi būti aptverti narvelių aukščio tvorele.
26.	* Kita	2021-49-XX-RTP-E.B-02, 2021-49-XX-RTP-SK-0.B-11	Prašome paaiškinti kaip turės būti užvedamas 35 kV kabelis į transformatorių T-2?	Paaiškiname, kad ugniasienės pamate yra numatyta ertmė vamzdžių pravedimui. Užvedimas detalizuojamas darbo projekto metu. Ugniasienės brėžinys su matmenimis pateiktas SK. B-11 dokumente.

			 Pagal pateiktą brėžinį prie galios transformatoriaus T-2 bus montuojama ugniasienė, kurios aukštis virš žemės 3500mm ir pamato padas 2000mm pločio bei 1500mm gylis?	
27.	* Kita	2021-49-XX-RTP-SK-0.B-04	Prašome pateikti transformatoriaus T-2 duobės montavimo brėžinį, kadangi pateiktas brėžinys yra tinkamas tik T-1 duobės įrengimui. Prie T-2 bus montuojama ugniasienė.	Projektas papildytas transformatoriaus T-2 duobės montavimo brėžiniu, SK.B-04, 2 lapas.
28.	* Kita	2021-49-XX-RTP-E.B-02	Prašome patikslinti, koku tikslu yra montuojamas antžeminis kabelių kanalas po VP pastatu? 	Paaiškiname, kad kanalai numatyti tam, kad jėgos ir kontroliniai kabeliai nebūtų klojami tiesiai ant žemės.
29.	* Kita	2021-49-XX-RTP-SK-0.B-01	Prašome patikslinti lietaus nuotekų sprendinį, kadangi toks pajungimas kampu, o ne statmenai yra negalimas (Naftos skirtuvas-mėginių paėmimo šulinys).	Sprendinys patikslintas, atnaujintas brėžinys SK.B-01.

				
1.	* Kita		Ar konkursą laimėjusiam rangovui bus pateikta visos trasos ir TP topografinė nuotrauka?	Taip, laimėjusiam Rangovui bus pateikta visos trasos ir TP topografinė nuotrauka.
2.	* Kita	2021-49-XX-RTP-E.TS 112 lapas iš 114	Prašome patikslinti kokias vamzdžio montuojamo atviru būdu technines specifikacijas reikia pildyti: pateiktas prieduose 2021-49-XX-RTP-E.TS ir 2021-49-XX-RTP-EL.TS ar pateiktas AB ESO puslapyje, kurios galioja nuo 2024-09-18d?	Paaiškiname, kad turi būti pildomos naujos techninės specifikacijos, pateiktos AB ESO puslapyje, kurios galioja nuo 2024-09-18 d.
3.	* Kita	2021-49-XX-RTP-EL.TS 15 lapas iš 22	Prašome patikslinti kokias vamzdžio montuojamo uždaru būdu technines specifikacijas reikia pildyti: pateiktas priede 2021-49-XX-RTP-EL.TS ar pateiktas AB ESO puslapyje, kurios galioja nuo 2024-09-18d?	Paaiškiname, kad turi būti pildomos naujos techninės specifikacijos, pateiktos AB ESO puslapyje, kurios galioja nuo 2024-09-18 d.
4.	* Kita	Atsakymai į klausimus (09-30), 1 atsakymas	Prašome patvirtinti, kad darbo projekto rengimo metu pailgėjus kabelių ilgiams užsakovas, konkursą laimėjusiam rangovui, sumokės papildomai.	Paaiškiname, kad bus aktuojama pagal faktą.
5.	* Kita	Atsakymai į klausimus (09-30), 4 atsakymas	Prašome paaiškinti kaip tiksliai rangovas turi įsivertinti darbų sąnaudas 10 kV narvelių išardymų jei išardymo detalumas turėtų paaiškėti tik darbo projekto rengimo metu?	Patiksliname kokia įranga turės būti grąžinama Užsakovui: 1.KRT-11 vežimėlis su SION jungtuvu, 2.Įtampos tr-riai, 2 kompl.; 3.Jungtuvai, 13 vnt.; 4.Ribotuvai ; 5.TPL srovės transformatoriai; 6.SRT, 2 vienetai; 7.Akumuliatorių įkroviklis.
6.	* Kita	Atsakymai į klausimus (09-30), 10 atsakymas	Prašome patikslinti ant kokių tiksliai atramų reikia montuoti 10 kV vertikalius skyriklius? Ant S110-34,3 ar ant S130-68,6? Pagal tipinius projektų albumus skyrikliai galimi montuoti ant abiejų tipų atramų priklausant nuo poreikio/aukščio.	Paaiškiname, kad montuoti reikia ant S110-34,3 atramų.

7.	* Kita	Atsakymai į klausimus (09-30), 12 atsakymas	Prašome patikslinti 12 atsakymą, kadangi kabelių montavimo lentelė šioje atkarpoje nėra atnaujinta: Ariogalos TP – atrama Nr. 100/11 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 570m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 694m. Kadangi vamzdžio kiekiai didėja, atitinkamai turi didėti ir kabelio ilgis.	Kiekis montavimo lentelėje pateiktas geras. $570+124=694$ m. Brėžinyje nurodytas bendras ilgis: $33+661=694$ m. Montavimo lentelėje: Atviru būdu vamzdžio ilgis: 570 m Uždaru : 124 m.
8.	* Kita	Atsakymai į klausimus (09-30), 14 atsakymas	Prašome patikslinti 14 atsakymą, kadangi kabelių montavimo lentelė šioje atkarpoje nėra atnaujinta: Ariogalos TP – atrama Nr. 200/13 vamzdžio d75mm, 750N montavimo kiekius. Pagal pateiktą kabelių montavimo lentelę vamzdžio trasos (3xd75mm) yra numatyta 414m, tačiau pagal kabelių paklojimo planą (2021-49-XX-RTP-EL.B-02) vamzdžio trasos (3xd75mm) yra 528m. Kadangi vamzdžio kiekiai didėja, atitinkamai turi didėti ir kabelio ilgis.	Kiekis montavimo lentelėje pateiktas geras. $414+114=528$ m. Brėžinyje nurodytas bendras ilgis: $33+27+468=528$ m. Montavimo lentelėje: Atviru būdu vamzdžio ilgis: 414 m Uždaru : 114 m.
9.	* Kita	2.1.1. PF Priedas Nr. 2. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ)	Prašome pateikti atnaujintą SDKŽ formą, kadangi pasikeitė 24 kV išeinančių linijų kabelių ilgiai.	Dėkojame už pastebėjimą. Pridedame patikslintą SDKŽ.
10.			Pastebėjome, kad Pirkime naudojamas standartinis AB ESO sutarties projektas, kur vis dar numatyta atskirai darbo projekto parengimas. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2024-11-01 keičiasi Statybos įstatymas ir atsiranda projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas, prašome paaiškinti kaip bus vykdomi sutarties projektavimo darbai? Ar galės atrinktas Rangovas pagal seną tvarką įvykdyti projektavimo darbus?	Paaiškiname, kad aktuosisime taip kaip numatyta šiame pirkime ir SDKŽ, reikės parengti darbo projektą.
1.	* Kita		Prašome patikslinti per kiek laiko užsakovas pateiks pastabas darbo projektui nuo projekto pateikimo?	Paaiškiname, kad ESO taikoma praktika – 5 d. d. pastabų patiekimui.
