

2015 - 06 - 03 d.

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. Administracijos direktoriaus pareigas Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, veikiančios pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 13 d. sprendimą Nr. 1-6 „Dėl pavedimo laikinai eiti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai“ ir Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

jungtinės veiklos partneriai Žiuko įmonė, juridinio asmens kodas 167573296, kurio registruota buveinė yra Vilniaus g. 103, LT 33112 Molėtai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir

UAB „Inžinerinis projektavimas“, juridinio asmens kodas 223973140, kurio registruota buveinė yra Rygos g. 44-46, LT-05272 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

atstovaujami Žiuko įmonės direktorės Rimos Žiukienės, veikiančios pagal 2015-05-15 jungtinės veiklos sutartį Nr. 2015/7 ir įmonės nuostatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „šalimis“, o kiekvienas atskirai – „šalimi“,

sudarė šią darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja atlikti stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų m., sausinimo darbus su projektavimu (toliau – Darbai). Perkami darbai ir jų apimtys yra aprašyti Sutarties 2 priede pateiktoje techninėje dokumentacijoje. Darbai finansuojami iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

1.2. Techninis darbo projektas turi būti parengtas per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbai turi būti atlikti ir perduoti Perkančiajai organizacijai per 1 mėnesį po techninio darbo projekto parengimo. Sutarties galiojimo terminas (su apmokėjimu) – iki darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiai.

1.3. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus g. 69, Širvintų m.

1.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

1.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

1.6. Sudaroma Sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.


II. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

2.1. Rangovas įsipareigoja:

2.1.1. savo jėgomis ir rizika už pasiūlytą kainą tinkamai ir laiku atlikti Darbus pagal Sutartį;

2.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytais terminais;

2.1.3. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;



2.1.4. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Darbų atlikimo ataskaitą, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, išskiriant konkrečias Darbų kainos sudėtinės dalis bei pateikiant papildomą su Darbų atlikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t.t.;

2.1.5. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint atlikti Darbus;

2.1.6. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

2.1.7. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus;

2.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

2.2. Rangovas turi teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti;

3.1.2. sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir būdu;

3.1.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

3.2. Užsakovas turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę;

3.2.2. Užsakovas turi kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

IV. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	2.	3.	4.	5.
Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų m., sausinimo darbai su projektavimu				
1.1.	Projekto parengimas	3 276,32	688,03	3 964,35
1.2.	Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų m., sausinimo darbai	47 128,64	9 897,01	57 025,65
	Iš viso	50 404,96	10 585,04	60 990,00

4.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Rangovas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant: visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, išlaidas, ir kt.

4.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

4.3.1. esant 8.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 8.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos tokiu būdu – konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir jo su susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

4.3.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

4.4. Sutarties kaina dėl kainų lygio pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Visą riziką dėl kainos padidėjimo prisiima Rangovas.

4.5. Užsakovas su Rangovu atsiskaito už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktus darbų atlikimo aktus bei sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų.

V. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

5.1. Rangovas perduoda darbus Užsakovui pagal atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktus.

5.2. Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui. Apie paslėptus Darbo trūkumus Užsakovas turi teisę pranešti Rangovui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Darbų priėmimo– perdavimo akto pasirašymo dienos arba per 3 mėnesius nuo paslėptų Darbų trūkumų nustatymo dienos.

5.3. Tarp Šalių kilus ginčams dėl Darbų trūkumų, trūkumų atsiradimo priežastis, Rangovo kaltę ir trūkumų piniginę išraišką nustato tretieji, nepriklausomi nuo šalių, kompetentingi (dirbantys toje srityje, kurioje nustatinėjami trūkumai) asmenys, pasirinkti šalių tarpusavio susitarimu.

5.4. Jeigu Darbai neatitinka kokybės reikalavimų, Užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti iš Rangovo neatlygintinai pašalinti Darbų trūkumus per protingą terminą, arba pats pašalinti Darbų trūkumus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 % nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas - įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.2. Jei Rangovas per 6.1. p. nustatytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju

Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius.

7.2. Rangovas laiku neįvykdęs Sutartyje numatytų įsipareigojimų, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną;

7.3. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su Rangovu pagal Sutarties sąlygas, moka Rangovui 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

7.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius.

VIII. PAKEITIMAI

8.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

8.1.1. bet kurios techninėje dokumentacijoje numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

8.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą taip pat darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

8.1.3. bet kuri papildomą darbą, įrangą, medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

8.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 8.1 punkte forminami tokia tvarka:

8.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 4.3.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;

8.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.3.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

8.3. Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais) bei raštu suderinamas su Užsakovu.

Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

8.4. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Užsakovas juos įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

8.5. Užsakovas numato galimybę pirkti neskelbiant apie pirkimą naujus darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę sutartį, skirtus tam pačiam projektui vykdyti, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 2 p. (papildomų pirkimų vertė – iki 830,00 Eur be PVM).

8.6. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

8.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techninėje dokumentacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninei dokumentacijai (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.


8.8. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninės dokumentacijos klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

IX. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA



10.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

10.2. Užsakovas prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas gali nutraukti Sutartį prieš 15 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.

10.3. Nutraukiant sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškinimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Rangovas darbams atlikti gali pasitelkti pasiūlyme nurodytus subrangovus – (nepasitelkiama). Pirkimo Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto, restruktūrizavimo bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina protokolu susitarimą dėl subrangovų pakeitimo, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus. Naujai pasitelkti subrangovai turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei nurodyti pasiūlyme. Rangovas yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

12.2. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios konfidencialios, komercinės,

dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

12.3. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.

12.4. Visi pranešimai ir kitas šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

12.5. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

12.7. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

12.8. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.

12.8.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja Rangovą.

12.8.2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Rangovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja Užsakovą.

12.9. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

12.10. Šiuo šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

12.11. Sutarties priedai:

12.11.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymo (be priedų) kopija;

12.11.2. Priedas Nr. 2 – Techninė dokumentacija.

Užsakovo vardu

Rangovo vardu

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 61, Širvintos
Kodas 188722373
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT27 4010 0420 0003 6688
Tel. (8 382) 51 442
Faks. (8 382) 30 270

Žiuko įmonė
Vilniaus g. 103, LT 33112 Molėtai
Įmonės kodas 167573296
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT70 4010 0455 0009 0406
PVM mokėtojo kodas LT675732917
Tel. (8 383) 51 109
Faks. (8 383) 51 109

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas
Ingrida Baltušytė-Metrauskienė

Direktore
Rima Žukienė

(parašas)

(parašas)

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Reikalavimų skyriaus vedėja

ŽIUKO ĮMONĖ

Širvintų rajono savivaldybės
administracijos Reikalavimų skyriaus vedėja

Roma Džiovanaite

Širvintų rajono savivaldybės
administracijos Reikalavimų skyriaus vedėja



Darbų viešojo pirkimo-pardavimo
sutarties priedas Nr. 1

ŽIUKO ĮMONĖ

Individuali įmonė. Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai; tel./faksas 8 383 51109 įmonės kodas 167573296.

PVM mokėtojo kodas LT675732917, el. p. ziuko.imone@takas.lt

Širvintų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL STADIONO VILNIAUS G. 69, ŠIRVINTŲ M., SAUSINIMO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU PIRKIMO

2015-05-15 Nr. 41
Molėtai

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Žiuko įmonė
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rima Žiukienė
Telefono numeris	8 383 51109, 8 687 55686
Fakso numeris	8 383 51109
El. pašto adresas	ziuko.imone@takas.lt

.Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us):

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	-
Pirkimo dalis, kuriai atlikti tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <http://pirkiniai.eviesiejiipirkiniai.lt>.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

[Handwritten signatures and stamps]

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	2.	3.	4.	5.
Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų m., sausinimo darbai su projektavimu				
1.1.	Projekto parengimas	3276,32	688,03	3964,35
1.2.	Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų m., sausinimo darbai	47128,64	9897,01	57025,65
Iš viso		50404,96	10585,04	60990,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 60990,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct), tame tarpe PVM sudaro 10585,04 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 04 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

[Šių sumų įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame sąraše nurodyti dokumentai yra konfidencialūs (kitus dokumentus perkančioji organizacija skelbs Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. IS-199 „Dėl Laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pastaba. Tiekėjui nemurdžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registų centro pažyma	4
2.	Registų centro išplėstinis išrašas	2
3.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	2
4.	Specialistų sąrašas (3 priedas)	1
5.	Kvalifikacijos atestatai, darbo (gyvenimo) aprašymai (CV)	13

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

[Handwritten signatures and stamps]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DARBAMS

1. Bendra informacija

1.1. *Statytojas*: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos.
1.2. *Projektas*: „Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų mieste, sausinimo darbai (su projektavimu)“.
1.3. *Statytojo reikalavimai projekto įgyvendinimui*: projektas bus įgyvendinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančio techninio reglamento „Statinio projektavimas“ (STR:1.05.06:2010) galiojančia redakcija, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais.

1.4. *Statinio kategorija*: inžineriniai (drenažo) tinklai.

1.5. *Finansavimo šaltinis*: iš Savivaldybės biudžeto.

1.6. *Projekto vieta*: Vilniaus g. 69, Širvintos.

1.7. *Statybos rūšis*: Naujo statinio statyba.

1.8. *Statinio kategorija*: Neypatingas statinys.

1.9. *Žemės sklypas*: kadastro Nr. 8955/0004:241, Vilniaus g. 69, Širvintų m. Bendras žemės sklypo plotas – 3,0284 ha, preliminarus sausinamas plotas – 1,380 ha. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų, bei statinių statybos.

1.10. *Nuosavybės teisė*: Žemės sklypas naudojamas panaudos pagrindu, panaudos gavėjas – Širvintų rajono savivaldybė.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Projektavimo paslaugos, projekto sudėtis ir apimtis pateikta projektavimo užduotyje, patvirtintoje Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-04 įsakymu Nr. 9-400 „Dėl projekto „Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų mieste, sausinimo darbai (su projektavimu)“ projektavimo užduoties tvirtinimo“.

2.2. Projektas turi atitikti Užsakovo tikslus, būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis, atitikti aukščiausius projektavimo paslaugų ir rangos darbų metu rinkoje taikomus profesinius standartus.

2.3. *Statinio statybos (rangos) darbai ir apimtis*: statybos darbai bus vykdomi Širvintų mieste Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos teritorijoje, netoli administracinių ir kitų pastatų. Rangos darbų apimtys – pagal parengto ir su Užsakovu suderinto techninio darbo projekto nustatytas apimtis (darbų kiekius).

2.4. Leidimai sklypo paruošimui ir statybai: Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius teisės aktus. Iš Užsakovo pagal perdavimo aktą perimti statybvietę (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 str.).

2.5. Statinio techninio projekto ekspertizė – neprivaloma.

2.6. Statinio statybos techninė priežiūra – privaloma.

Parengė: Žemės ūkio skyriaus vedėja

Marytė Kmitienė

Suderinta: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyresn. specialistas

Vytautas Šuminas

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Robertas Bartulis

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



**ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ISAKYMAS
DĖL PROJEKTO „STADIONO VILNIAUS G. 69, ŠIRVINTŲ MIESTE, SAUSINIMO
DARBAI (SU PROJEKTAVIMU)“
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES TVIRTINIMO**

2015 m. gegužės 4 d. Nr. 9-400
Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 41.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (redakcijos: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-808, 2014 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. D1-870) 7.2.2. papunkčiu:

1. T v i r t i n u supaprastinto projekto „Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų mieste sausinimo darbai (su projektavimu)“ projektavimo užduotį (priedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 9-384 „Dėl projekto „Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų mieste, sausinimo darbai (su projektavimu)“.

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas

Diana Rodzevič

Parengė
Žemės ūkio skyriaus vedėja

Marytė Kmitienė
2015-05-04

SUDERINTA:
Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji
specialistė

Jurga Kuzmaite
2015-05-04

Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė

Rima Nainienė
2015-05-04

PATVIRTINTA :
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015-05-04 įsakymu Nr. 9-410

**PROJEKTO „STADIONO VILNIAUS G. 69, ŠIRVINTŲ MIESTE, SAUSINIMO DARBAI
(SU PROJEKTAVIMU)“**


PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. Statytojas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos.
2. Objektas: Projekto metu numatoma nusausinti stadioną esanti Vilniaus g. 69, Širvintų mieste.
3. Projektavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-04-15 Nr. 9-336
4. Projekto rengimo stadija: techninis darbo projektas.
5. Statinio kategorija: inžineriniai (drenažo) tinklai.
6. Finansavimo šaltinis: iš Savivaldybės biudžeto.
7. Projekto vieta: Vilniaus g. 69, Širvintos.
8. Projektuojamo objekto charakteristika:
 - 8.1. Parengti drenažo tinklų statybos darbų techninį darbo projektą:
 - 8.2. Projektuojamo objekto charakteristika: Suprojektuoti drenažą stadiono, esančio Vilniaus g. 69, Širvintų mieste (kad. Nr. 8955/0004:241), nusausinimui. Bendras sklypo plotas – 3,0284 ha. Preliminarus sausinamas plotas – 1,380 ha pagal pateiktą projektavimo užduotį ir esamą planinę medžiagą, nustatyti esamų lietaus nuotekų nepatenkinamo veikimo priežastis, įvertinti esamų lietaus nuotekų techninę būklę, atlikti statybos vietos topografinius tyrinėjimo darbus, suprojektuoti drenažo tinklą stadiono nusausinimui.
- Sklype nustatyti šie apribojimai:
 1. – ryšių linijų apsaugos zonos – 0,0180 ha;
 2. – elektros linijų apsaugos zonos – 0,1567 ha;
 3. – dujotiekių apsaugos zonos – 0,0320 ha;
 4. – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – 1,4170 ha;
 5. – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – 0,3843 ha;
 6. – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,4011 ha;
9. Nurodymai dėl hidrotechnikos statinių projektavimo: techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikoje galiojančio techninio reglamento „Statinių projektavimas“ (STR:1.05.06:2010) galiojančia redakcija, kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais bei šia projektavimo užduotimi.
10. Nurodymai dėl projekto komplektacijos: parengti visas reikalingas techninio projekto dalis.
11. Numatoma statybos pradžia: 2015 metai.
12. Statybos rangovas: parenkamas nustatyta tvarka.
13. Suderintos projektinės dokumentacijos egzempliorių skaičius: statytojui pateikti 4 spausdinto projekto egz. ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (CD).
14. Projekto rengimo terminas: 1 mėnuo.
15. Projektuotojai turi gauti technines sąlygas, reikalingas projektavimui, iš institucijų, eksploatuojančių žemės sklype esančius inžinerinius tinklus.
16. Parengtą techninį projektą suderinti su visomis sąlygas išdavusiomis institucijomis.
17. Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius teisės aktus.


Parengė: Žemės ūkio skyriaus vedėja

Marytė Kmitienė



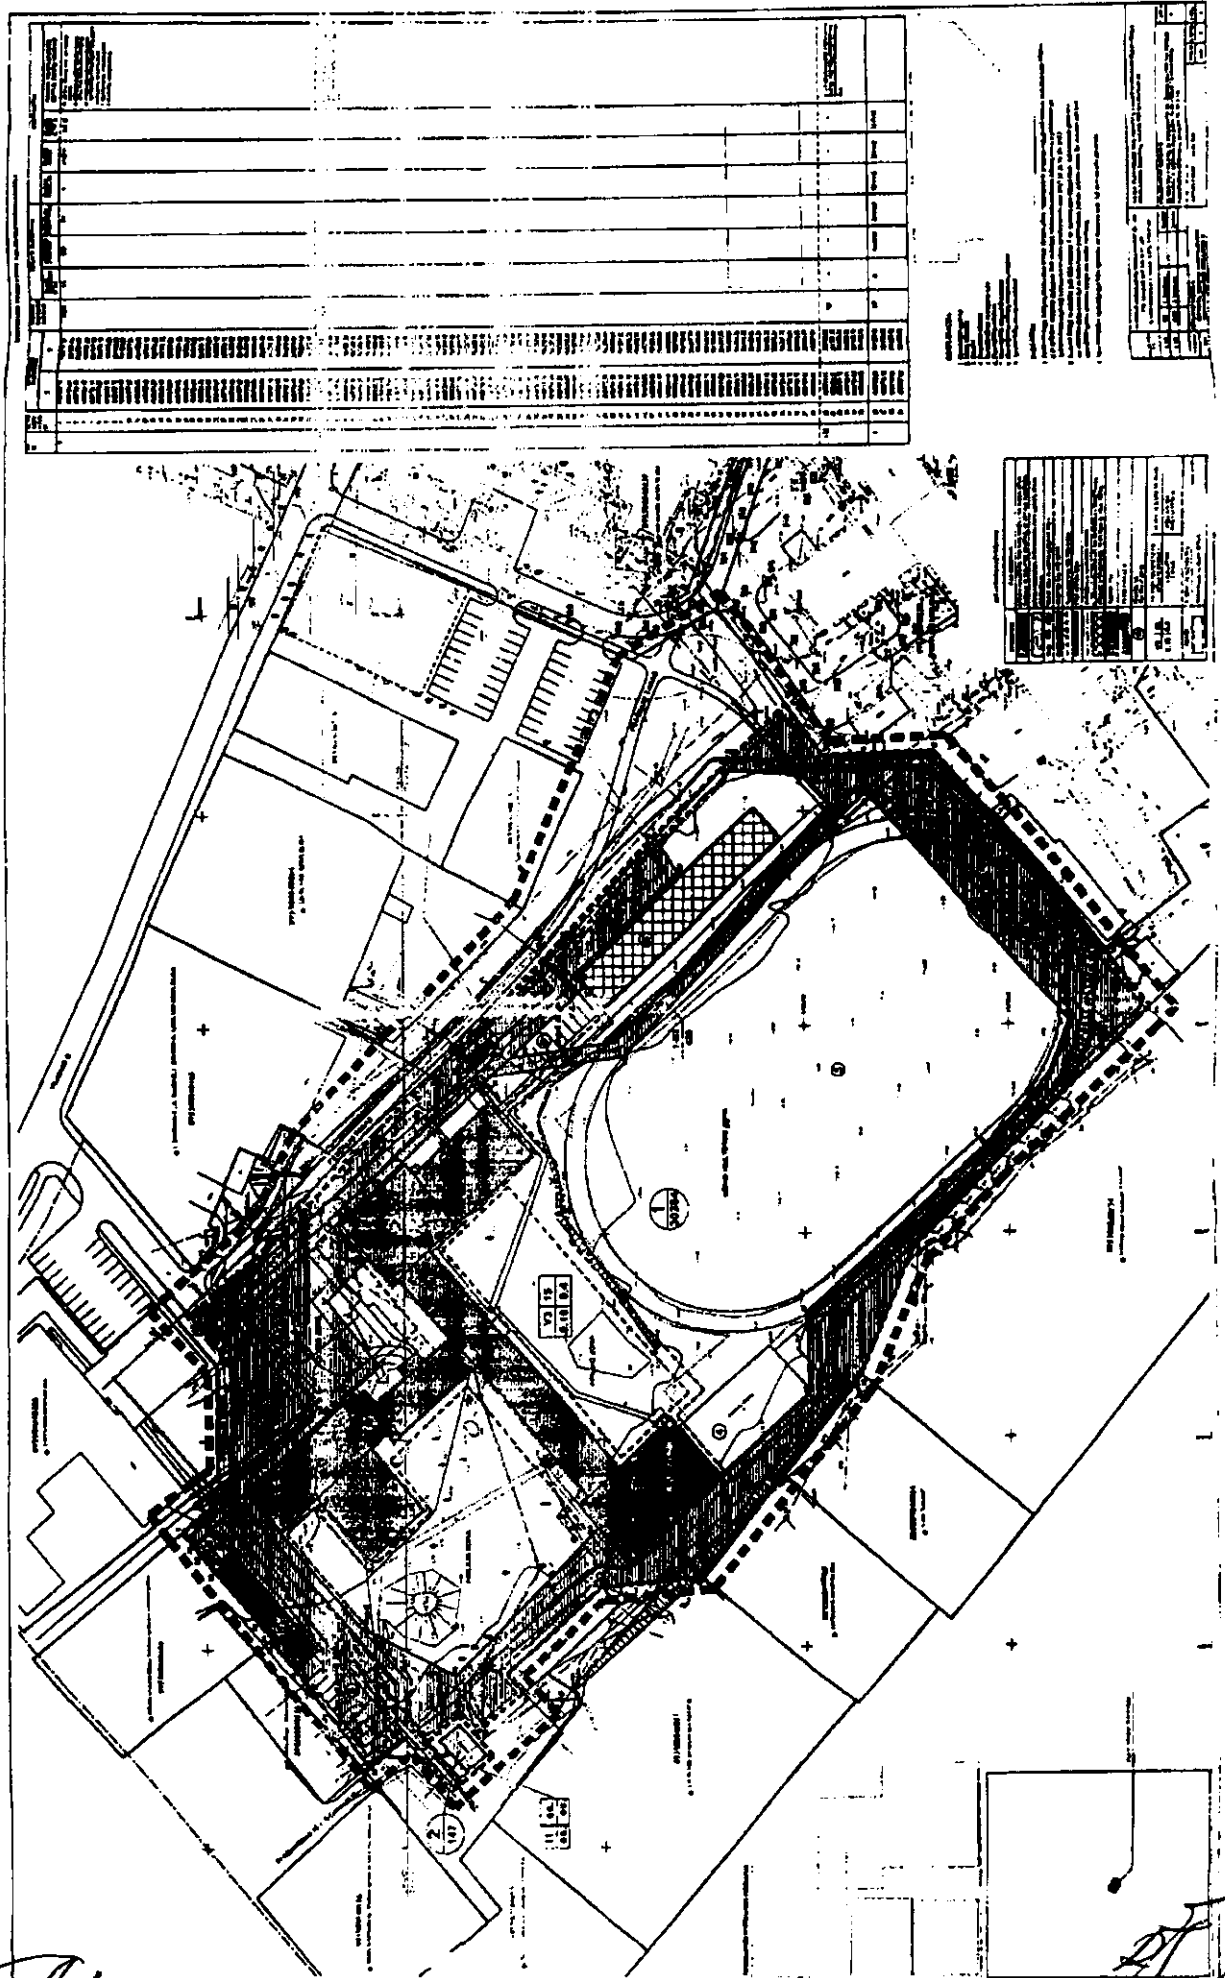

Handwritten signature: *Stacy for AFB [illegible] [illegible]*

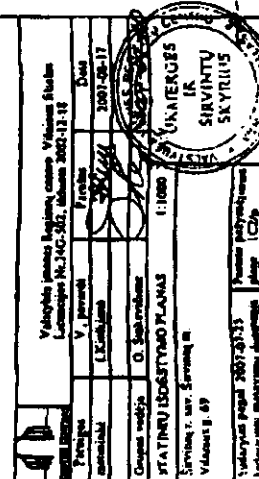

It was the A. J. Campbell

SKLYPO PLANAS M. 1. 2000

Sklym plots 30284 in 2

2emēs sklypo kadastro Nr

KOORDINĀCIJAS ZINĀRĀSTIS

Longitude		Latitude		LKS 1994		LKS 1995	
Table No	Table No	Table No	Table No	Table No	Table No	Table No	Table No
1	R/S	0100703 47	561331 24	76	NK	6100732 11	561317 05
2	R/S	0100782 14	561344 56	40	NK	6100703 82	561208 12
3	R/S	0100674 23	561348 56	41	NK	6100703 82	561208 12
4	R/S	0100445 19	561353 59	42	NK	6100680 81	561270 08
5	R/S	0100455 72	561403 82	43	NK	6100670 37	561230 40
6	R/S	0100510 80	561411 51	44	NK	6100671 52	561301 04
7	R/S	0100510 80	561422 56	45	NK	6100671 52	561311 41
8	R/S	0100510 80	561433 01	46	NK	6100671 52	561322 16
9	R/S	0100610 87	561444 56	47	NK	6100717 28	561308 05
10	R/S	0100610 87	561455 59	48	NK	6100717 28	561318 04
11	R/S	0100610 87	561466 59	49	NK	6100717 28	561328 05
12	R/S	0100610 87	561477 04	50	NK	6100717 28	561338 05
13	R/S	0100610 87	561487 04	51	NK	6100717 28	561348 05
14	R/S	0100610 87	561497 04	52	NK	6100717 28	561358 05
15	R/S	0100610 87	561507 04	53	NK	6100717 28	561368 05
16	R/S	0100610 87	561517 04	54	NK	6100717 28	561378 05
17	R/S	0100610 87	561527 04	55	NK	6100717 28	561388 05
18	R/S	0100610 87	561537 04	56	NK	6100717 28	561398 05
19	R/S	0100610 87	561547 04	57	NK	6100717 28	561408 05
20	R/S	0100610 87	561557 04	58	NK	6100717 28	561418 05
21	R/S	0100610 87	561567 04	59	NK	6100717 28	561428 05
22	R/S	0100610 87	561577 04	60	NK	6100717 28	561438 05
23	R/S	0100610 87	561587 04	61	NK	6100717 28	561448 05
24	R/S	0100610 87	561597 04	62	NK	6100717 28	561458 05
25	R/S	0100610 87	561607 04	63	NK	6100717 28	561468 05
26	R/S	0100610 87	561617 04	64	NK	6100717 28	561478 05
27	R/S	0100610 87	561627 04	65	NK	6100717 28	561488 05
28	R/S	0100610 87	561637 04	66	NK	6100717 28	561498 05
29	R/S	0100610 87	561647 04	67	NK	6100717 28	561508 05
30	R/S	0100610 87	561657 04	68	NK	6100717 28	561518 05
31	R/S	0100610 87	561667 04	69	NK	6100717 28	561528 05
32	R/S	0100610 87	561677 04	70	NK	6100717 28	561538 05
33	R/S	0100610 87	561687 04	71	NK	6100717 28	561548 05
34	R/S	0100610 87	561697 04	72	NK	6100717 28	561558 05
35	R/S	0100610 87	561707 04	73	NK	6100717 28	561568 05
36	R/S	0100610 87	561717 04	74	NK	6100717 28	561578 05
37	R/S	0100610 87	561727 04	75	NK	6100717 28	561588 05
38	R/S	0100610 87	561737 04	76	NK	6100717 28	561598 05
39	R/S	0100610 87	561747 04	77	NK	6100717 28	561608 05
40	R/S	0100610 87	561757 04	78	NK	6100717 28	561618 05

[illegible]

2012-02-23

Уд-М-Мэ окумушув А

2. Materials and Methods

There is a large number of people who are not aware of the importance of the environment and the need to protect it. They do not understand that the environment is a common resource and that it is our responsibility to take care of it. They do not see the need to take action to protect the environment and they do not understand the consequences of their actions. They do not see the need to take action to protect the environment and they do not understand the consequences of their actions.

of structure. Poverty is not caused primarily by inequalities of the distribution of income, but by the lack of access to the means of production.

the best and in some cases the only

et al., 1999). The results of the study suggest that the use of a structured approach to the development of a business plan can help to improve the quality of the plan and the success of the business.

SARADIN (M) (				
---	--	--	--	--



Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
I priedas

ŽIUKO ĮMONĖ

Individuali įmonė, Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai; tel./faksas 8 383 51109 įmonės kodas 167573296,
PVM mokėtojo kodas LT675732917, el. p. ziuko.imone@takas.lt

Širvintų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL STADIONO VILNIAUS G. 69, ŠIRVINTŲ M., SAUSINIMO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU PIRKIMO

2015-05-15 Nr. 41
Molėtai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Žiuko įmonė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rima Žiukienė
Telefonų numeris	8 383 51109, 8 687 55686
Fakso numeris	8 383 51109
El. pašto adresas	ziuko.imone@takas.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	-
Pirkimo dalis, kuriai atlikti tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <http://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	2.	3.	4.	5.
Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų m., sausinimo darbai su projektavimu				
1.1.	Projekto parengimas	3276,32	688,03	3964,35
1.2.	Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų m., sausinimo darbai	47128,64	9897,01	57025,65
Iš viso		50404,96	10585,04	60990,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM **60990,00** Eur (šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct), tame tarpe PVM sudaro **10585,04** Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 04 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

[Šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame sąraše nurodyti dokumentai yra konfidencialūs (kitus dokumentus perkančioji organizacija skelbs Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. IS-199 „Dėl Laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registru centro pažyma	4
2.	Registru centro išplėstinis išrašas	2
3.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	2
4.	Specialistų sąrašas (3 priedas)	1
5.	Kvalifikacijos atestatai, darbo (gyvenimo) aprašymai (CV)	13

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)



Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
2 priedas



ŽIUKO ĮMONĖ

Individuali įmonė. Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai; tel./faksas 8 383 51109 įmonės kodas 167573296,
PVM mokėtojo kodas LT675732917, el. p. ziuko.imone@takas.lt

Širvintų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2015-05-15 Nr. 41
Molėtai

Aš, direktorė Rima Žiukienė,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) Žiuko įmonė,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujančio (-ios) Širvintų rajono savivaldybės administracijos,
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame Stadiono Vilniaus g. 69, Širvintų m., sausinimo darbai su projektavimu,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
skelbtame
https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=236702&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp.

(nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą arba dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės	Taip	

	aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
2.	Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių konkurso sąlygų 11.1 punkte išvardytas veikas.	Taip	
3.	Tiekėjas turi teisę vykdyti statinio statybos darbus.	Taip	
	Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai		
4.	Tiekėjas turi: 1. turėti ne mažiau kaip vieną statinio statybos vadovą, turintį inžinerinį išsilavinimą bei bent 2 metų darbo patirtį per paskutinius 5 metus vykdant inžinerinių tinklų tiesimo darbus; 2. pasiūlyti bent vieną projekto vadovą, turintį bent 2 metų darbo patirtį per paskutinius 5 metus projektuojant inžinerinius tinklus.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.


Direktore

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Rima Žiukienė

(Vardas ir pavardė)





Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
3 priedas

ŽIUKO ĮMONĖ

Individuali įmonė, Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai; tel./faksas 8 383 51109 įmonės kodas 167573296,

PVM mokėtojo kodas LT675732917, el. p. ziuko.imone@takas.lt


SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas projekto vadovas:			
Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Išsilavinimas/ kvalifikacija	Projekto vadovo patirtis (metais) projektuojant inžinerinius tinklus per paskutinius 5 metus
1.	Lucija Mickevičienė	Hidromelioracija/ inžinierius-hidrotechnikas	5 m.
Siūlomas statybos darbų vadovas:			
Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Išsilavinimas/ kvalifikacija	Statybos darbų vadovo darbo patirtis (metais) vykdant inžinerinių tinklų tiesimo darbus per paskutinius 5 metus
1.	Saulius Gaižauskis	Inžinierius hidrotechnikas, aukštasis / Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigos	5 m.
2.	Algirdas Šikšnys	Technikas-hidrotechnikas, aukštesnysis/ Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas Ypatingo statinio statybos vadovo pareigos	5 m.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.16071

Lucija Mickevičienė

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai; hidrotechnikos statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

04283

Išduotas 2013 m. vasario 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. liepos 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2014 m. kovo 12 d.

Nr. T-88-MT

Vilnius

Algirdas Šikšnys

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministrė



A.V.

Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2019 m. kovo 12 d.

Atestavimo komisijos 2014 m. kovo 27 d.

protokolas Nr. 8D-147 (5.50)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkrėnų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32609

Algirdas Šikšnys

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos; kiti transporto statiniai; kiti statiniai;
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai (sąvartynai).

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. kovo 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. kovo 3 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

09293



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926. Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.21738

Saulius Gužauskis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialijų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialijų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius

Robertas Encius

05620

Išduotas 2013 m. balandžio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. gegužės 9 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. kovo 19 d.

Nr. S-462-MT

Vilnius

Saulius Gužauskis

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministrė



Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Saulius Jasius

Atestatas galioja iki 2018 m. birželio 20 d.

Atestavimo komisijos 2013 m. kovo 21 d.

protokolas Nr. 8D-133(5.50)
