

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 5-256
2016-07-29

ŠIRVINTŲ MIESTO VILNIAUS GATVĖS KAIRĖS PUSĖS ŠALIGATVIO ATKARPOS NUO VILNIAUS G. NR. 106 IKI NR. 110 KAPITALINIO REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių Elonos Pečiukaitienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurio registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyto Kromelio veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS, GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

1.1. Sutarties objektas – Širvintų m. Vilniaus gatvės kairės pusės šaligatvio atkarpos nuo Vilniaus g. Nr. 106 iki Nr. 110 kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga (toliau – Darbai). Statinio kategorija – nesudėtingas statinys.

1.2. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Užsakovas įsipareigoja priimti kokybišką Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą.

1.3. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatyto atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

1.4. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

1.4.1. šios Sutarties sąlygos;

1.4.2. techninė dokumentacija;

1.4.3. kiti dokumentai.

1.5. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus g., Širvintų m., Širvintų r.

1.6. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), Sutartis nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.7. Techninis projektas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos (numatoma galimybė šalių susitarimu pratęsti šį terminą 1 mėn.). Darbai turi būti atlikti per 1 mėnesius (numatoma galimybė šalių susitarimu pratęsti šį terminą 1 mėn.). Sutarties galiojimo terminas (su apmokėjimu ir galimais pratėsimais) – 6 mėnesiai.

II. DARBŲ KAINA, PAPILDOMI DARBAI

2.1. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, apskaičiuojama įvertinus vykdant Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus. Sutarties kaina nurodyta priede Nr. 2.

2.2. Kaina, nurodyta 2.1. punkte, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.3.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) (įkainis)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) (įkainis) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

2.4. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio keitimo perskaičiuojama nebus.

2.5. Papildomų darbų kaina nustatoma, esant 7.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal

7.2. punktą įforminus pakeitimą. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamu būdu:

2.5.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

2.5.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

2.5.3. arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis. Taikant ši papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

2.5.4. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 2.5.1.–2.5.3. punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbai finansuojami iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

3.2. Avansinis mokėjimas netaikomas. Užsakovas Rangovui apmoka už faktiškai atliktus Darbus, numatytus Sutartyje, pasirašius atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą-faktūrą, per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nes Užsakovas mokėjimus atlieka tik gavęs finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), o mokėjimų dokumentų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos. Rangovui sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimų dokumentų pateikimo dienos, kai mokama Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Darbų pirkimo sąlygų reikalavimai yra privalomi Užsakovui ir Rangovui.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

- 4.2.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;
- 4.2.3. apmokėti Rangovui už atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai;
- 4.2.4. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.
- 4.3. Užsakovas turi teisę:**
- 4.3.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;
- 4.3.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas nepašalina darbų trūkumų per 15 darbo dienų;
- 4.3.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;
- 4.4. Užsakovas turi ir kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
- 4.5. Rangovas įsipareigoja:**
- 4.5.1. atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka;
- 4.5.2. atlikti Darbus kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, Užsakovui vykdant darbų techninę priežiūrą;
- 4.5.3. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą Darbų metu, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius LST 1335 ir LST 1405 standartų reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose ir pan. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Rangovo atributais;
- 4.5.4. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų;
- 4.5.5. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;
- 4.5.6. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;
- 4.5.7. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;
- 4.5.8. atlikdamas Darbus Rangovas, neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;
- 4.5.9. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus;
- 4.5.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 4.6. Rangovas turi teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.
- 4.7. Sutarties įsipareigojimų vykdymui subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami šie subrangovai.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, GARANTIJOS

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą:



5.1.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procentų dydžio delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

5.1.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.1.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

6.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VII. PAKEITIMAI

7.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti:

7.1.1. bet kurios techninėje dokumentacijoje numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;


7.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą taip pat darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

7.1.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

7.2. Papildomų ar nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5. punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos



kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

7.3. Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

7.4. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Užsakovas juos įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti Sutartyje.

7.5. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

7.6. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techninėje dokumentacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninei dokumentacijai (Darbų apimčiai, techninei dokumentacijai). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

7.7. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninės dokumentacijos klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

7.8. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

7.8.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis;

7.8.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet keičiamas subrangovas turi juos atitikti.

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

8.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

8.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

8.3. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.



8.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 1.3. punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

9.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

9.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

9.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 9.2. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų;

9.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statyb vietės.

9.4. Nutraukus Sutartį pagal 9.3. punktą:

9.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

9.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delpinigių dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

9.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

9.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

9.5.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

9.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

9.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

9.6.1. per 90 dienų nuo Sutarties 3.2. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

9.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

9.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 9.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

9.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

9.7.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

9.7.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

9.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

X. GINČAI

10.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

11.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

11.3. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.

11.3.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja Rangovą.

11.3.2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Rangovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja Užsakovą.

11.4. Sutarties priedai:

11.4.1. Techninė dokumentacija;

11.4.2. Rangovo pasiūlymas (užpildyta pasiūlymo forma pagal pirkimo sąlygų 1 priedą).

11.5. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Kodas 188722373

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos

A.s. Nr. LT204010042000066690

tel. (8 382) 51 233, faksas. (8 382) 30 270

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavadojanti Administracijos direktorių

Elona Pečiukaitienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ūkio plėtros skyriaus vedėja

Rita Gujlienė

Dalia Mačiukaitė

RANGOVAS

UAB „Ukmergės keliai“

Įmonės kodas 182816983

PVM mokėtojo kodas LT828169811

Deltuvos g.26, LT-20122 Ukmergė

A.s. Nr. 74 4010 0429 0003 0166

Tel./faks. (8 340) 63 257

Generalinis direktorius

Vytas Kromelis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Leidžiamai naudoti Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Būhalterijos poskyrio vedėjos pareigas

Gabijė Krupauskienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIRVINTŲ M. VILNIAUS GATVĖS KAIRĖS PUSĖS ŠALIGATVIO ATKARPOS NUO VILNIAUS G. NR. 106 IKI NR. 110 KAPITALINIO REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA

1. **Statinys** – Širvintų m. Vilniaus gatvės kairės pusės šaligatvio atkarpos nuo Vilniaus g. Nr.106 iki Nr. 110 kapitalinis remontas.
2. **Statinio kategorija** – Nesudėtingas
3. **Lėšų pobūdis** – Širvintų rajono savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
4. **Statytojas (užsakovas)** – Širvintų rajono savivaldybės administracija.
5. **Techninio projekto rengėjas** – Rangovo samdytas projektuotojas.
6. **Paslaugų ir darbų apimtys.**

6.1. Projektavimas:

Vadovaujantis projektavimo sąlygomis parengti Širvintų m. Vilniaus gatvės kairės pusės šaligatvio atkarpos nuo Vilniaus g. Nr. 106 iki Nr. 110 kapitalinio remonto projektą:

6.1.1. Atnaujinti topografinę nuotrauką;

6.1.2. Detalizuoti sprendinius pagal pasikeitusius teisės aktų reikalavimus.

6.1.3. Gauti visus būtinus derinimus ir pritarimus.

6.1.4. Suprojektuoti statinį (šaligatvį) – Širvintų m. Vilniaus gatvės kairės pusės atkarpoje (preliminarus ilgis apie 140 m; plotis apie 1,9-2,9 m). Numatyti šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimą, numatyti esančių kelmų pašalinimą, numatyti gatvės bortų pakeitimus.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, Projektuotojas privalės neatlygintinai taisyti techninį projektą pagal pateiktas pastabas.

Projektuotojas privalo organizuoti Statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą: teikti dokumentaciją Širvintų rajono savivaldybės administracijai, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Užsakovą iki kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas.

Neatlygintinai pakeisti, papildyti, pataisyti techninio projekto sprendinius, jeigu darbų pirkimo metu ir/ar darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.

Statybą leidžiančio dokumento gavimą, už išlaidas biuro patalpoms, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su projekto rengimu susijusioms veikloms atsakingas Tiekėjas. Jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

6.2. Darbai.

Darbai atliekami pagal parengtą kapitalinio remonto projektą, projekte nurodytus darbų ir medžiagų kiekius. Rangovas turi įvertinti riziką dėl projekto galimų sąnaudų žiniaraščiuose pasikeitusių darbų kiekių.


Darbai atliekami pagal Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnę nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą.

Priedai:

1. Maps.lt schema.

Parengė Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė



Vietos paieška

sirvintos

leškoti

Širvintos
Širvintų r. sav.

Širvintos
Širvintų sen., Širvintų r. sav.

Tikėjotes kitokių rezultatų? Apie netiesiogius pareškos rezultatus galite pranešti čia.

Black Leaf - 1890

74


Maajid Kurti Zemelapj

Malathi Sparschott, Pramesh ajne Khande

Ortofoto 201

Matuotiti:	Atstumaq	Plotaq	Rellefaq
------------	----------	--------	----------

Ulgis: 0,133km = 133m

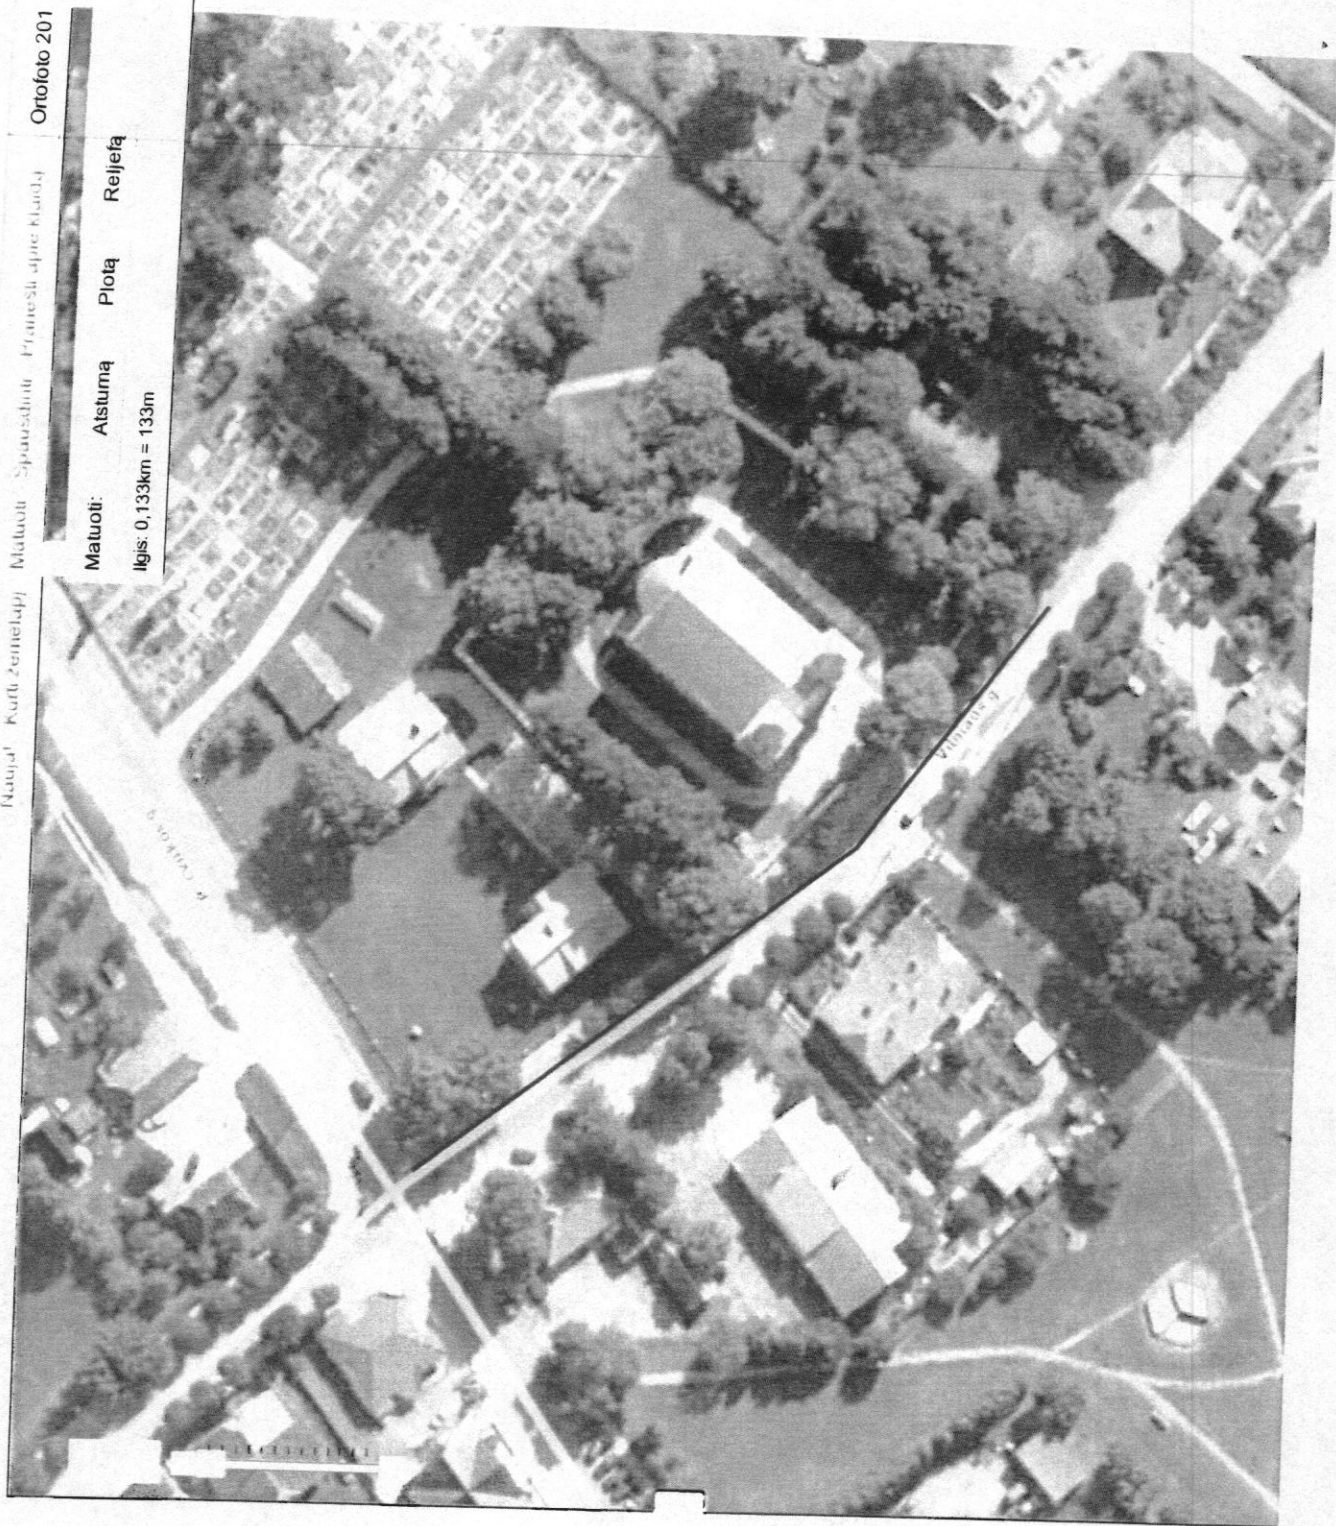

(UAB „Ukmergės keliai“ Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, tel./ faks. (8 340) 63 257 el. p. info@ukmergeskeliai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 182816983. PVM mokėtojo kodas LT828169811)

Širvintų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ŠIRVINTŲ M. VILNIAUS GATVĖS KAIRĖS PUSĖS ŠALIGATVIO ATKARPOS NUO VILNIAUS G. NR. 106 IKI NR. 110 KAPITALINIO REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMO PASLAUGA PIRKIMO

2016-07-19 Nr. _____

(Data)

Ukmergė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Ukmergės keliai“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ramūnas Pociūnas
Telefonų numeris	(8 340) 63257
Fakso numeris	(8 340) 63257
El. pašto adresas	info@ukmergeskeliai.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	-
Isipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Lil. Nr.	Širvintų m. Vilniaus gatvės kairės pusės šaligatvio atkarpos nuo Vilniaus g. Nr. 106 iki Nr. 110 kapitalinio remonto darbai su projektavimo paslauga	Eur		
		Bendra kaina be PVM	PVM	Bendra kaina su PVM
1	2	3	4	5

1.1.	Širvintų m. Vilniaus gatvės kairės pusės šaligatvio atkarpos nuo Vilniaus g. Nr. 106 iki Nr. 110 kapitalinio remonto darbų projektavimo paslauga	1 700,00	357,00	2 057,00
1.2.	Širvintų m. Vilniaus gatvės kairės pusės šaligatvio atkarpos nuo Vilniaus g. Nr. 106 iki Nr. 110 kapitalinio remonto darbai	19 409,85	4 076,07	23 485,92
Bendra pasiūlymo kaina:		21 109,85	4 433,07	25 542,92

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 25 542,92 Eur (*dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt du Eurai 92 ct*). tame tarpe PVM sudaro 4 433,07 Eur (*keturi tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys Eurai 07 ct*).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame sąraše nurodyti dokumentai yra konfidencialūs (kitus dokumentus perkančioji organizacija skelbs Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1S-199 „Dėl Laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
-	-
-	-

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

LIETUVOS
UŽDAROJI
AKCINĖ
BŪKLĖ
Gamybinio skyriaus viršininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

R. Pociūnas
(Parašas)

Ramūnas Pociūnas
(Vardas ir pavardė)

AK *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
