

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m. spalio d. Nr. ____
Vilnius

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 112021042, atstovaujama Projektų ir priežiūros departamento Projektų valdymo skyriaus veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2025 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. P1-280 "Dėl 2018 m. rugpjūčio 9 d. generalinio direktoriaus įsakymo Nr. P1-204 „Dėl VĮ Turto banko darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti VĮ Turto banko dokumentus, sąrašo ir VĮ Turto banko gaunamųjų dokumentų, perduodamų vykdyti nepateikiant jų generaliniam direktoriui, sąrašo patvirtinimo pakeitimo“, ir

UAB „Statyra“ (toliau – **Rangovas**), juridinio asmens kodas 304841021, atstovaujama , veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kiekviena atskirai vadinama šalimi, o abi kartu – šalimis, atsižvelgdamos į konkretaus pirkimo „**VP-3262 Paprastojo remonto darbai adresu Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio r.**“, (CVP IS Nr. 4696547), vykdyto „VP-2384 Įvairūs negyvenamųjų pastatų remonto darbai“ (CVP IS Nr. 173737) pagrindu, rezultatus, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti ir perduoti Užsakovui statybos rangos darbus (toliau – Darbai) bei ištaisyti Darbų defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šios Sutarties nustatyta tvarka.
- 1.2. Administracinės paskirties pastato, esančio **Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio r. sav.** (unikalus numeris 6697-0028-2023), paprastojo remonto darbai.
- 1.3. Darbai vykdomi pagal Techninės specifikacijos ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus.

2. DARBŲ KAINA

- 2.1. Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos** kainodara.
- 2.2. Pradinės sutarties vertė (Rangovo pasiūlyta Darbų kaina be PVM) – 116 569,00 Eur (šimtas šešiolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 00 ct). PVM suma – 24 479,49 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 49 ct, **Darbų kaina su PVM – 141 048,49 Eur (šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis keturiasdešimt aštuoni eurai, 49 ct).**
- 2.3. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą (Darbus) sumoka Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą. Į Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą yra įskaitytos visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais bei transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties įgyvendinimui. Į Darbų kainą turi būti įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. Rangovas turi atsižvelgti į tai, kad tam tikrų darbų ar medžiagų kiekiai (išskyrus perkamų įrenginių/įrangos kiekius), nurodyti techninėje specifikacijoje (darbų žiniaraščiuose) gali būti preliminarūs, todėl apskaičiuodamas Darbų kainą turi įvertinti visas galimas išlaidas, reikalingas Darbų rezultatui pasiekti.
- 2.4. Jeigu, siekiant laiku tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti būtinus darbus, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė, sudarant Sutartį ar rengiant Darbų lokalinę sąmatą, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Darbų kainos.
- 2.5. Jeigu dėl aplinkybių, kurių abi Šalys negalėjo numatyti paaiškėja, kad reikia papildomų darbų (Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusių), papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (brėžiniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir Užsakovo parašais. Neįtrauktų į Sutartį Darbų įsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

- 2.6. Rangovas patvirtina, kad prieš pasirašant Sutartį, jis būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius, susipažino su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 2.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis, tačiau tai Rangovui nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties.
- 2.8. Darbų kaina dėl mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) mokamas teisės aktų nustatyta tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Darbų atlikimo ir PVM sąskaitos faktūros surašymo dieną. Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nurodyti Darbų įkainiai nėra keičiami. Bendra už Darbus mokėtina suma su PVM negali būti didinama dėl PVM tarifo padidėjimo, jeigu prievolė mokėti PVM ar taikyti didesnę PVM tarifą atsirado dėl Rangovo veiklos pokyčių bei kitų nuo Rangovo priklausančių aplinkybių (pvz., Rangovas tapo PVM mokėtoju, pasikeičia jo veikla ir pan.).
- 2.9. **Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio (indeksavimas).**
- 2.9.1. Tuo atveju, kai Darbų vykdymo trukmė yra 6 mėnesiai ir ilgesnė, Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
- 2.9.2. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: **(a)** pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5 %) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba **(b)** statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5 %) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis šio punkto **(a)** dalyje. Indeksai, nurodyti šiame punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**.
- 2.9.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: $K = IPb / IPr$, kur K – Indekso pokyčio koeficientas, IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Atliekant pirmą peržiūrą (indeksavimą) laikotarpio pradžios diena laikytina pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena.
- 2.9.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos arba per 10 darbo dienų nuo IPb paskelbimo dienos, kai prašymo pateikimo dieną IPb dar nėra paskelbtas. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.
- 2.9.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per atskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba **(a)** pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba **(b)** sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
- 2.9.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius, skaičiuojant šį terminą nuo paskutinio patenkinto Šalies prašymo dėl kainos peržiūros pateikimo dienos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
- 2.9.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 3.1. Užsakovas darbus priima etapais kiekvieną mėnesį, pagal pasirašomą tarpinį Darbų perdavimo priėmimo aktą ir Rangovui atlikus visus darbus pagal Sutartį, pagal pasirašomą galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas tarpinius ir galutinį Darbų perdavimo priėmimo aktus (toliau kartu vadinami Darbų perdavimo-priėmimo aktas) teikia Užsakovui. Tarpinius Darbų atlikimo aktus Rangovas turi pateikti Užsakovui kas mėnesį, tačiau ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Galutini Darbų perdavimo priėmimo aktą Rangovas pateikia užbaigus visus Darbus pagal Sutartį. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytų darbų atitikimą faktiškai atliktiems Darbams ir, nenustačius neatitikimų, Darbų trūkumų ir/ar defektų, pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 3.2. Užsakovui nustačius Darbų perdavimo-priėmimo aktuose ir faktiškai atliktų Darbų neatitikimą ar Darbų kokybės trūkumų, Užsakovas perdavimo-priėmimo aktą nepasirašo ir apie nustatytus neatitikimus ar trūkumus informuoja Rangovą. Užsakovui motyvuotai atsisakius pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktus, surašomas dokumentas, kuriame įvardijami motyvai dėl aktų nepasirašymo ir nurodomas protingas, bet ne ilgesnis kaip 7 darbo dienų terminas, nurodytiems Darbų trūkumams ir / ar defektams pašalinti. Užsakovo nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo sąskaita.
- 3.3. Rangovas iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo dienos privalo pašalinti iš statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darbų galutinio perdavimo Užsakovui metu patalpos turi būti švarios ir sutvarkytos.
- 3.4. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo bei PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
- 3.5. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).
- 3.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atliktų Darbų trūkumai, kurių objektyviai nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo-priėmimo metu; (2) po Darbų perdavimo-priėmimo paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai; (3) Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami neįvykdys bet kurio Sutartyje nurodyto įsipareigojimo.
- 3.7. Rangovas pagal šią Sutartį teikiamą sąskaitą faktūrą privalo Užsakovui pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – „SABIS“) priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Visos elektroninės paslaugos „SABIS“ išlaidos tenka Rangovui.
- 3.8. Rangovo išrašytoje už atliktus Darbus sąskaitoje faktūroje turi būti aiškiai nurodyta (išskirta), kokie Darbai laikytini statybos darbais pagal LR statybos įstatymo 2 straipsnio 90 punktą ir kuriems taikomas atvirkštinis apmokestinimas pagal LR pridėtinės vertės įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
- 3.9. **Kartu su sąskaitomis faktūromis** Rangovas „SABIS“ sistemoje **privalo pateikti** ir Sutarties šalių pasirašytus **Atliktų darbų aktus** (ar Darbų perdavimo aktus) (jų elektronines versijas arba kopijas). Rangovui nepateikus visų nurodytų dokumentų per 2 darbo dienas po pirmojo Užsakovo pareikalavimo (pranešimo) dėl jų pateikimo, Rangovui gali būti taikoma **50 Eur baudą** už kiekvieną nepateikimo atvejį.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. **Darbų atlikimo terminas – 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir / ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

- 4.3. Dėl žemiau išvardytų aplinkybių, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:
 - 4.3.1. dėl neįprastai nepalankių klimato sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo tokių sąlygų);
 - 4.3.2. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims (Rangovo tiekėjų / partnerių netinkamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra pagrindas Darbų atlikimo termino pratęsimui);
 - 4.3.3. dėl naujų teisės aktų, turinčių įtakos Sutartyje numatytų Darbų atlikimui, priėmimo, pasikeitimo ar panaikinimo;
 - 4.3.4. dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties ar teisės aktų nuostatomis.
 - 4.3.5. dėl kitų aplinkybių, kurių Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo numatyti.
- 4.4. Nekokybiškai atlikti Darbai, jų trūkumų ar / ir defektų šalinimas negali būti priežastimi Darbų atlikimo termino pratęsimui.
- 4.5. Rangovas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti pratęsimas terminas, aplinkybes, kurios lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas priima sprendimą dėl Rangovo prašymo pratęsti terminą tenkinimo/netenkinimo per 4 (keturias) darbo dienas nuo tokio prašymo ir visų pagrindžiančių dokumentų (ar informacijos) gavimo dienos.
- 4.6. Darbų ar jų dalies vykdymas gali būti sustabdomas, jei atsiranda toliau nurodytos aplinkybės, dėl kurių visų Darbų ar jų dalies vykdymas nėra galimas: (1) sustabdytas finansavimas arba yra finansavimo trūkumas; (2) valstybės ar savivaldos institucijų neveikimas, nesant Šalių kaltės (pvz.: per nustatytą terminą nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, būtini Sutarčiai įgyvendinti); (3) būtinybė atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti Techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; (4) aplinkybės, susijusios su projektinės dokumentacijos įgyvendinimo sprendiniais ir kitos su Sutarties įgyvendinimu susijusios aplinkybės, kurių iš anksto nei viena iš Sutarties Šalių negalėjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris kitas viešojo pirkimo konkursą laimėjęs rangovas.
- 4.7. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu dėl Sutarties 4.6 punkte nurodytų priežasčių raštu nurodyti Rangovui stabdyti Darbus. Darbų vykdymas tokiu atveju gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams bendrai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jei pasibaigus šiam terminui, aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų vykdymas neišnyko ir nėra galimybės atnaujinti Darbų vykdymą, Sutartis vienos iš Šalių iniciatyva gali būti nutraukiama.
- 4.8. Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus apie tai nedelsdamas praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti stabdomi Darbai, aplinkybes, kurios lėmė poreikį stabdyti Darbus, laikotarpį, kuriam reikės stabdyti Darbus, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išnagrinėja Rangovo pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl Darbų stabdymo ir apie jį raštu praneša Rangovui. Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priežastis. Darbai stabdomi Šalims pasirašant susitarimą dėl Darbų stabdymo, kurio projektą parengia Rangovas.
- 4.9. Darbų sustabdymo terminas nėra įskaičiuojamas į Darbų atlikimo terminą.
- 4.10. Sutarties sustabdymo metu visus Darbus arba dalį jų Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei Darbų vykdymas buvo sustabdytas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Užsakovas neįsipareigoja atlyginti Rangovui jokių išlaidų ar nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių) susijusių su Darbų sustabdymu.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

- 5.1.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, Darbus atliekant profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, kokybiškai, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, savo rizika ir sąskaita, laikantis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jei tokie reikalavimai nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką, taip pat atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas pastabas, papildomą informaciją;

- 5.1.2. Tinkamai užbaigus Darbus, perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Darbų rezultatą, ištaisyti visus ir bet kokius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą;
- 5.1.3. Pateikti visus dokumentus, numatytus Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo reikalavimu, pateikti ir su Užsakovo darbuotoju, atsakingu už sutarties vykdymą, suderinti visą informaciją bei dokumentaciją, susijusią su Darbų atlikimu (jų rezultatais), Darbų eiga ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymąsi, konsultuoti Užsakovą visais su Darbų atlikimu susijusiais klausimais.
- 5.1.4. Sudarius Sutartį, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikia suderinimui Užsakovo atstovui galutinę, detalią (nurodant tikslius Darbų ir išlaidų aprašymus, jų kainų sąmatinius apskaičiavimus) Lokalinę sąmatą (nekeičiant Tiekėjo pasiūlyme nurodytos kainos) bei Darbų vykdymo grafiką darbams, aprašytiems techninėje specifikacijoje, įvykdyti per Sutarties 4.1. punkte nustatytą terminą. Lokalinė sąmata ir Darbų vykdymo grafikas turi būti pakankamai detalus, t. y. leidžiantis įvertinti ne tik Darbų trukmę, bet ir darbuotojų, technikos, medžiagų kiekius, kainas ir terminus. Lokalinėje sąmatoje bei Darbų vykdymo grafike negali būti nurodyti su Sutarties dalyku nesusiję darbai. Lokalinė sąmata turi būti parengta per „SISTELA“ arba „ASTERA“, arba lygiavertės statybos darbų kainų sąmatinių apskaičiavimų sistemą.
- 5.1.5. Užsakovas, gavęs Rangovo Darbų vykdymo grafiką ir/ar Lokalinę sąmatą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas juos išnagrinėja ir raštu ar elektroniniu paštu praneša Rangovui apie suderinimą arba atmetimą, nurodydamas atmetimo priežastis. Tuo atveju, jeigu Rangovas per 6 (šešias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo su Užsakovo atstovu raštu ar elektroniniu paštu nesuderina Lokalinės sąmatos ir/ar Darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui Sutarties 6.3. punkte nurodytas netesybas bei sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, išskyrus pareigą išnagrinėti ir teikti pastabas dėl Rangovo pateiktos Lokalinės sąmatos ir (ar) Darbų vykdymo grafiko. Netesybos Rangovui nėra taikomos, kai nurodytų dokumentų suderinimo vėlavimas įvyko dėl Užsakovo pavėluoto atsakymo pateikimo. Šiuo atveju Rangovui nustatytas terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek dienų vėlavo atsakyti Užsakovas.
- 5.1.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Jei Užsakovas nustato, kad statybvietėje darbus atlieka asmenys, kurie neturi atitinkamiems darbams vykdyti reikalingos kvalifikacijos arba neturi teisės vykdyti statybos darbų, Užsakovas turi teisę rašytiniu pranešimu Rangovui sustabdyti Sutarties vykdymą iki atitinkami Sutarties vykdymo pažeidimai bus pašalinti bei taikyti Rangovui Sutarties 6.3. punkte nurodytas netesybas;
- 5.1.7. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- 5.1.8. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Rangovui tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais;
- 5.1.9. vykdant Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu ir jo nurodytais specialistais ar kitais asmenimis;
- 5.1.10. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo nurodymus;
- 5.1.11. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas darbų vykdymui. Darbų vykdymo metu patalpose ir pastatų prieigose, kuriose rangos darbai nėra vykdomi, turi būti palaikoma švara ir tvarka (koridoriuose kurie bus naudojami patalpų naudotojų ir Rangovo, administracinės patalpos, aptvėrimai šalia pastatų ir pan.);
- 5.1.12. Rangovas iki Darbų pradžios privalo faktiškai susipažinti su Statybviete. Rangovas atsako už Statybvietės perėmimo procedūrų organizavimą. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus Statybvietėje ir privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas;
- 5.1.13. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į Statybvietę neteisėtai nepatektų asmenys;
- 5.1.14. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar

- aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
- 5.1.15. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
 - 5.1.16. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui;
 - 5.1.17. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba Darbų kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti įrangą, medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;
 - 5.1.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su: bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu, taip pat su bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo;
 - 5.1.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;
 - 5.1.20. Rangovo pateikiamos medžiagų ar įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai (jeigu tokia įranga įrengiama);
 - 5.1.21. skirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą;
 - 5.1.22. Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turi atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta statybų aikštelės ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos;
 - 5.1.23. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje (objekte) reikalavimų laikymąsi, taip pat atsako už visų asmenų, teisėtai esančių statybvietėje, saugumą;
 - 5.1.24. užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;
 - 5.1.25. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas;
 - 5.1.26. Susitikimai organizuojami esant poreikiui. Užsakovui apie susitikimo poreikį informuoja Rangovo atstovą vieną darbo dieną prieš numatomą susitikimą. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti ir susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su Darbais tiesiogiai susijusius klausimus;
 - 5.1.27. užbaigęs Darbus, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines atliekas, išvalyti teritoriją, langus bei patalpas, kuriose dirbo.
 - 5.1.28. Atliekų tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas pagal LR aplinkos ministro patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: a) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkančiai organizacijai leidus, galima panaudoti statybos metu; b) atliekas, tinkamas perdirbti (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos, metalas), pristatomas į perdirbimo gamyklas; c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas.

Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;

5.1.29. Užsakovui, garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir raštu informavus apie tai Rangovą, Rangovas įsipareigoja juos savo sąskaita pašalinti per 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo apie defektus gavimo dienos;

5.1.30. visas su skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodu susijusias prievoles įgyvendina Rangovas. Šių prievolių netinkamo įgyvendinimo pasekmės prisiima Rangovas (taikoma jei Sutarties galiojimo metu aktualu);

5.1.31. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Sutarties dokumentuose, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. reikalauti priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus;

5.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

5.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subrangovus šios Sutarties nustatyta tvarka;

5.2.5. Rangovas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.3. Užsakovo įsipareigoja:

5.3.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdamas Sutartį, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją;

5.3.2. sudaryti visas būtinas sąlygas Rangovui vykdyti Sutartyje numatytus Darbus;

5.3.3. atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

5.3.4. skirti už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį;

5.3.5. perduoti Rangovui statybvietę Darbų vykdymo grafike nurodytu laiku. Jeigu Darbų vykdymo grafike nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę arba pagal Sutarties sąlygas Darbų vykdymo grafikas nėra rengiamas, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo. Laikoma, kad statybvietė perduota Rangovui nuo to momento, kai Rangovui sudaromos sąlygos patekti ir vykdyti Darbus Sutarties 1.2. punkte nurodytame objekte, išskyrus atvejus, kai darbai atliekami pagal Techninį darbo projektą (pastaruoju atveju turi būti pasirašomas statybvietės perdavimo/priėmimo aktas) arba statybvietės perdavimo akto pasirašymas yra numatytas Techninėje specifikacijoje. Tokiu atveju, kai atskiras Statybvietės perdavimo aktas nėra pasirašomas, statybvietės ribos nustatomas pagal Sutarties Techninės specifikacijos Darbų aprašymą.

5.3.6. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

5.4.2. Raštu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus ar yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi

5.4.3. organizuoti Užsakovo ir Rangovo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

5.4.4. atsisakyti priimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų;

5.4.5. Fotofiksacijos būdu užfiksuoti patalpas ar teritoriją kur bus vykdomi Darbai ir sudaryti laisvos formos rašytinį aplinkybių fiksavimo aktą kurį pasirašo Rangovo ir Užsakovo atstovai. Prie aplinkybių fiksavimo akto pridedama fotofiksacijos medžiaga. Aplinkybių fiksavimo akto surašymą ir fotofiksacijos atlikimą Užsakovas gali pavesti atlikti Rangovui.

5.4.6. Užsakovas turi visas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.5. Užsakovas neatsako už medžiagų ir įrangos apsaugą statybvietėje.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

- 6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 6.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas netesybomis.
- 6.3. Rangovui vėluojant tinkamai atlikti Darbus ir įvykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą galutinį Darbų atlikimo terminą arba, jeigu tai atskirai nurodoma Sutarties dokumentuose, Darbų dalies (ar etapo) terminą, arba vėluojant įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Užsakovas įgyja teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų **50,00 (penkiasdešimt) Eur** delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Maksimali tokių vėlavimo netesybų suma negali viršyti 15 proc. Pradinės sutarties vertės (be PVM). Sutarties nutraukimo atveju Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais, Užsakovas įgyja teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 10 proc. baudą nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM), kuri laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir neginčijamais Užsakovo nuostoliais.
- 6.4. Užsakovui laiku neatsiskaičius su Rangovu, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.
- 6.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
- 6.6. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą arba Sutarties 6.3 p. ir 6.8 p. nurodytą baudą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos arba reikalauti Rangovo sumokėti netesybas į Užsakovo reikalavime nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos.
- 6.7. Esminiu Rangovo Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo netinkamas Darbų vykdymas arba Darbų neįvykdymas Sutartyje nustatytu terminu, sąlygomis ir tvarka.
- 6.8. Rangovas, padaręs esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 10 proc. baudą nuo pradinės sutarties vertės ir atlygina kitas Užsakovo išlaidas ar nuostolius, kurie viršija nurodytos baudos dydį.
- 6.9. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, sąžiningomis, protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 6.10. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu to priežastimi buvo nenugalima jėga (*force majeure*). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atveju. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau negu 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ar visiško jos nutraukimo.
- 6.11. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas sąlygas, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę, arba tinkamumą įprastam naudojimui.
- 6.12. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 6.13. Rangovas prisiima atsakomybę padengti visus nuostolius patirtus dėl jo veiksmų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

7. SUBRANGOVŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

- 7.1. Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį. Rangovo pasitelkiamais subrangovais laikomi:
 - 7.1.1. Asmenys nurodyti pirkimui teiktame pasiūlyme;
 - 7.1.2. Iki Sutarties 7.3. p. nurodyto termino pasitelkti asmenys;
 - 7.1.3. Sutarties vykdymo metu pasitelkti asmenys, kurių pasitelkimo būtinumas atsirado Sutarties vykdymo metu, subrangovo pasitelkimas pagrindžiamas Rangovo Užsakovui pateiktu pagrįstu raštu, o pasitelkimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu.
- 7.2. Sutarties sudarymo momentu, jos vykdymui Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus (jeigu Sutarties sudarymo metu jie yra žinomi): _____.
- 7.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Rangovas privalo Užsakovui raštu pranešti subrangovų pavadinimus, darbų dalį, kuriems jie yra pasitelkiami, subrangovų kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti vėliau.
- 7.4. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto raštu nepranešus Užsakovui.
- 7.5. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės Sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Rangovas atsako už savo subrangovų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Užsakovo sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma pagal subrangos sutartį, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
- 7.6. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitimą arba naujo subrangovo pasitelkimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.
- 7.7. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) specialistas, privalo pateikti visus atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kurių atitiktį įrodančius dokumentus Rangovas privalo pateikti Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 7.8. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Rangovas, norėdamas pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą, privalo pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius tokio asmens atitiktį jam taikomiems reikalavimams (t. y. turi būti pateikti dokumentai, kurie patvirtintų, kad subrangovas turi teisę vykdyti atitinkamus darbus, kuriems jis yra pasitelkiamas) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 7.9. Sutikimas duodamas tik dėl konkretaus subrangovo pakeitimo apibrėžta subrangos apimtimi ir tik įvardijus numatomą subrangovą. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie numatomą sudaryti subrangovo pakeitimą iš Rangovo gavimo dienos turi pranešti Rangovui savo sprendimą.
- 7.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas licencijas, leidimus, saugos darbe pažymėjimus taip pat visą reikiamą kompetenciją įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti.
- 7.11. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta pagal Sutartį, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės, o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui

300 Eur baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 9 skyriuje nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 8.1. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamas į būtinybę, pagal šią Sutartį turi teisę įsigyti papildomų darbų arba neatlikti (atsisakyti) kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau su Sutarties dalyku (arba su Sutarties 1.2. p. nurodyto objekto statyba ar remontu) tiesiogiai susiję darbai, ar Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Neatliekami (atsisakomi) darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas. Kai teisės aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra papildomi darbai. Susitarimai dėl kiekių (apimtys) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir yra laikomi sudėtine Sutarties dalimi.
- 8.2. Darbų kiekių (apimtys) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
 - 8.2.1. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų projektinės (techninėje) dokumentacijos korekcijų tampa nebereikalingi;
 - 8.2.2. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl šios dokumentacijos klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
 - 8.2.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
 - 8.2.4. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
 - 8.2.5. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;
 - 8.2.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekiama komunikacijų valdytojų ir pan.);
 - 8.2.7. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
 - 8.2.8. kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagrįstas Užsakovo ar statinio naudotojo poreikis įsigyti papildomus Darbus, jų atsisakyti ar pakeisti (keičiant arba nekeičiant projektinių sprendinių), jeigu papildoma tokio poreikio įgyvendinimo vertė neviršija 30 procentų Pradinės Sutarties vertės sumos.
- 8.3. Atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės (išskyrus 8.2.8 punkte nurodyto pakeitimo atveju). Pakeitimo vertė laikoma papildomai įsigyjamų darbų suma, nustatyta atlikus atsisakomų darbų įskaitymą.
- 8.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita;
- 8.5. Papildomų ir (ar) neatliekamų (atsisakomų) darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas.
- 8.6. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis aktualios Viešųjų pirkimų tarnybos įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos redakcijos nuostatomis.
- 8.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti iki 10 procentų Pradinės sutarties vertės Darbų dėl bet kokių priežasčių. Darbų atsisakymas įforminamas rašytiniu susitarimu.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 9.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
- 9.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Rangovui, jeigu:
 - 9.3.1. Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurią savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba vykdo Sutartyje numatytas Darbus taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku;
 - 9.3.2. Darbų vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atliekami ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Rangovas laiku nepašalina trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;
 - 9.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Rangovas nepateikia ar nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinės atsakomybės draudimo galiojimo (jeigu taikoma);
 - 9.3.4. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
 - 9.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką;
 - 9.3.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
 - 9.3.7. paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2¹ dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.
 - 9.3.8. Rangovas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis ir per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina nurodyto(-ų) Sutarties vykdymo pažeidimo(-ų).
- 9.4. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Rangovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas Užsakovui, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).
- 9.5. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.
- 9.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo

10. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

- 10.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisėsaugos, kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.
- 10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.
- 10.3. Rangovas įsipareigoja vykdamas Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- 10.4. Rangovas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų valdytojo pareigą atsakyti į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima informacija bei prašyti asmens duomenis ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.
- 10.5. Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teises asmens duomenų apsaugos priemones (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugumą. Priemonės turi būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką atitinkantis saugumo lygis. Užsakovui paprašius, Rangovas turi pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius dokumentus.
- 10.6. Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečioje situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.
- 10.7. Rangovas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo incidentą (duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui, pateikdamas visą su pažeidimu susijusią informaciją.
- 10.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to yra gautas išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Rangovas išlieka visiškai atsakingas Užsakovui, jeigu naujai pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų apsaugos prievoles.
- 10.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones, susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamą ir (arba) galimą asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų tvarkymo auditą.
- 10.10. Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomenų yra būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis konfidencialumo, ir tik tiek, kiek to reikia Rangovo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant jos priedus bei visus kitus ją detalizuojančius susitarimus, vykdymui.
- 10.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Rangovo prašo informacijos apie tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie tokį prašymą ir laukia Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar bet kuriuo kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo (leidimo).
- 10.12. Rangovas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios Sutarties nuostatos ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
- 10.13. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo Rangovui pateiktų asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.
- 10.14. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 11.2. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.
- 11.3. Sutarčiai gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 11.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi joje nurodytais Šalių pavadinimais, adresais bei kitais įmonės rekvizitais. Jei keičiasi šioje Sutarčioje nurodyti Šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų rekvizitai, apie tai Šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atskirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8. Sutartis, sutarties pakeitimai, siunčiami raštai ir kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasirašomi kvalifikuotais Šalių elektroniniais parašais, atitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos 23 d. reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

Sutarties priedai:

1. Techninė specifikacija su priedais.
2. Rangovo pasiūlymas.
3. Detalūs sąmatiniai skaičiavimai (pateikiami po sutarties pasirašymo, jei tai numatyta Sutarties Techninėje specifikacijoje).
4. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (pateikiamas po sutarties pasirašymo, jei tai numatyta Sutarties Techninėje specifikacijoje).

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė Turto bankas

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
Juridinio asmens kodas 112021042
PVM mokėtojo kodas LT120210411
Tel. +370 5278 09 00
El. paštas info@turtas.lt
A.s.: LT51 7044 0600 0044 3925
AB SEB bankas

RANGOVAS

UAB „Statyra“

Ruokio g. 21, Dotnuva, Kėdainių r.
Juridinio asmens kodas 304841021
PVM mo 4613
Tel: +37
El. pašta
A. s. LT56 5015 9000 1400 1083
Kėdainių krašto kredito unija, 50159

**VETERINARIJOS G. 2, PAŽAGIENIŲ K., PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ,
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

I. Reikalavimai atliekant darbus:



- 1.1 Rangovas, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, privalo **per 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų** nuo su juo pasirašytos Statybos rangos sutarties (toliau – sutartis) įsigaliojimo atlikti patalpų, esančių **Veterinarijos g. 2, Pažagių k., Panevėžio r. sav.** (unikalus numeris 6697-0028-2023, bendras plotas 959,23 m²), paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai). Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
- 1.2 Pirkimas priklauso 4 kategorijai: negyvenamieji pastatai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (neypatingi statiniai).
- 1.3 Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.
- 1.4 Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
- 1.5 Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
- 1.6 Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.
- 1.7 Rangovas privalo į kainą įsivertinti grindų, langų, durų uždengimą, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų išėmimo, patalpų išvalymą po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu.
- 1.8 Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų, ir patalpų valymą.
- 1.9 Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslus darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. **Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su NT remonto skyriaus projektu vadovu**
- 1.10 Jeigu statybos darbų vykdymo metu Rangovui reikalinga naudotis esamomis inžinerinėmis komunikacijomis / tinklais (resursais) – Rangovas turi įsirengti laikinus inžinerinius tinklus / įvaduus prieš tai susiderinęs su Užsakovu ir pastatų naudotoju ir / arba tokių komunikacijų savininku dėl komunikacijų prisijungimo vietų ir sąlygų.
- 1.11 Užsakovo ir / arba pastato naudotojo rašytiniu sutikimu, Rangovas gali prisijungti prie Užsakovo esamų inžinerinių komunikacijų. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui už faktiškai suvartoto resurso (elektros energijos, vandens tiekimo, nuotekų išleidimo arba kt.) kiekį per 15 (penkiolika) dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos pagal Užsakovo pateiktą mokėjimo dokumentą.
- 1.12 Rangovas, teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau –

Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- 1.13 Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.
- 1.14 Rangovas turi Užsakovui parengti ir perduoti darbų metu įrengtos inžinierinės įrangos išpildomąją dokumentaciją, įrenginių pasus, varžų matavimus, priežiūros instrukcijos, vartotojo vadovus ir kt. skaitmeniniame formate: .pdf, .jpg (arba lygiaverčiame).
- 1.15 Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.
- 1.16 Rangovas atlikęs statybos darbus atlieka po statybinį valymą ir generalinį patalpų valymą.

II. Darbų aprašymas:


1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	<p>Patalpų, kurių indeksai R-4, R-7, R-12, R-14, R-15, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-14, 2-15, 2-16, seni santechnikos prietaisai, klozetas (1 vnt.), kriauklės (2 vnt.), dušo kabina ir dušo galva su maišytuvu, dušo padas (1 vnt.), kranai (grindyse ir sienose 36 vnt.), elektros rozetės ir kiti patalpose esantys įrenginiai turi būti demontuoti ir utilizuoti. Po prietaisų demontavimo sutvarkomi V/N ir elektros įvadai. Nereikalingi elektros laidai turi būti tinkamai izoliuoti ar pašalinti, ant vamzdžių sudėtos aklės. Prieš ardymo darbus reikalinga atjungti elektros ir kitas komunikacijas</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	Kompl.	1

2.	Patalpų, kurių indeksai R-10, R-11 ir 2-16, 2-17, skiriančių pertvarų, demontavimas ir utilizavimas. Prieš ardymo darbus reikalinga atjungti elektros ir kitas komunikacijas trukdančias atlikti šiuos darbus.	m ²	~26
3.	Patalpose, kurių indeksai R-11, 2-11, senų durų demontavimas ir utilizavimas.	Vnt.	2
4.	Patalpoje, kurios indeksas R-11, vietoj demontuotų durų, gipso kartono pertvaros įrengimas, kai profilis 100 mm, pertvaros užpildomos 100 mm mineraline vata bei sukama po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Pirmojo gipso kartono sluoksnio siūlės glaistomos. Ant pertvarų profilio, kuris remiasi į grindis, sienas, lubas, dedama amortizacinė juosta.	m ²	~2
5.	Patalpos, kurios indeksas 2-17, vidaus durų demontavimas ir sumontavimas 2-11 patalpoje. Sumontavus duris, turi būti atstatyta ir /ar atlikta angokraščių pilna apdaila. Neturi matytis sumontavimo medžiagų (t. y. išsiplėtimo putų, tvirtinimo elementų ir pan.).	Vnt.	1
6.	Patalpų, kurių indeksai R-6, R-7, R-11, R-14, R-15, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, esamų grindų ir sienų plytelių nuardymas ir utilizavimas. Prieš ardymo darbus reikalinga atjungti šildymo radiatoriai (9 vnt.), nuimti palanges (12 vnt.), elektros ir kitas komunikacijas trukdančias atlikti šiuos darbus.	m ²	~370
7.	Patalpų, kurių indeksai R-14, R-15, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-16, 2-17, esamų lubų nuardymas ir utilizavimas.	m ²	~104
8.	Patalpose, kurių indeksai R-6, R-7, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, montuojamos naujos palangės kurios turi būti analogiškos arba labai panašios į buvusias.	Vnt.	12
9.	Patalpų, kurių indeksai R-6, R-7, R-14, R-15, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, naujų lubų įrengimas. Nurodytoje patalpoje įrengiamos Armstrong tipo (arba lygiavertės) surenkamos lubos. Plokštės matmenys 60 x 60 cm, storis ≥ 15 mm, paviršius baltas, lygus, laminuotas, atsparus įbrėžimams. Lubų profilio spalva – balta. Lubų aukštį derinti vietoje. Pastaba: įrengiant naujas pakabinamas lubas, Rangovas turi įsivertinti priešgaisrinių ir apsaugos daviklių perkėlimą / permontavimą ant naujai įrengtų lubų.	m ²	~165
10.	Pertvaros iš patalpos 2-6 į patalpą 2-15 demontavimas. Prieš ardymo darbus reikalinga nusiardyti dalį pakabinamų lubų, atjungti elektros ir kitas komunikacijas trukdančias atlikti šiuos darbus.	m ²	~9
11.	Patalpose, kurių indeksai 2-6, 2-15, gipso kartono pertvarų įrengimas, kai profilis 100 mm, pertvaros užpildomos 100 mm mineraline vata bei sukama po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Pirmojo gipso kartono sluoksnio siūlės glaistomos. Ant pertvarų profilio, kuris remiasi į grindis, sienas, lubas, dedama amortizacinė juosta.	m ²	~9
12.	Patalpoje, kurios indeksas 2-6, naujai įrengtoje gipso kartono pertvaroje įrengiamos naujos vidaus durys. Tipas: skydinės varstomos vidaus durys su sustiprintais, vidiniais vyriais ir medžio drožlių plokštės užpildymu, rankena nerūdijančio plieno. Spalvą derinti su Užsakovu. Komplektuoti su užraktu ir atmušėju. Sumontavus duris, turi būti atstatyta ir / ar atlikta angokraščių pilna apdaila. Neturi matytis sumontavimo medžiagų (t. y. išsiplėtimo putų, tvirtinimo elementų ir pan.).	Vnt.	1
13.	Vandens įvadinio skaitliuko permontavimas iš patalpos R-8 į patalpą R-9. Į darbų kainą turi būti įskaičiuota projektinės dokumentacijos parengimas, suderinimas su Užsakovu bei leidimų, jei tokie reikalingi, iš	Kompl.	1

	atitinkamų institucijų gavimas įrenginių montavimui. Visi darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir techninius reglamentus.		
14.	Patalpos, kurios indeksas R-8, sienoje esantis vamzdynas, komunikacijas reikia paslėpti įrengiant lengvą konstrukcijų karkasą ir prie jo prisukti gipso kartono plokštėmis, atspariomis drėgmei, siūlės glaistomos ir nudažomas.	m ²	~9
15.	Patalpų, kurių indeksai R-14, R-15, grindų dangos pagrindo paruošimas plytelių klijavimui, nuolydžių suformavimas ir kiti darbai reikalingi tokios paskirties patalpų grindų dangos įrengimui. Akmens masės grindų plytelių įrengimas. Plytelės matmenys 60 x 30 cm storis ne mažesnis kaip 10 mm, slidumo klasė R9, siūlės tarpas tarp plytelių ne mažesnis kaip 2 mm. Plytelių spalvą derinti vietoje su užsakovu.	m ²	~4
16.	Patalpų, kurių indeksai R-14, R-15, sienų dangos pagrindo paruošimas plytelių klijavimui ir kiti darbai reikalingi tokios paskirties patalpų sienų dangos įrengimui. Akmens masės grindų plytelių įrengimas. Plytelės matmenys 60 x 30 cm storis ne mažesnis kaip 10 mm, slidumo klasė R9, siūlės tarpas tarp plytelių ne mažesnis kaip 2 mm. Plytelių spalvą derinti vietoje su užsakovu.	m ²	~20
17.	Patalpos, kurios indeksas R-14, įrengiama dušo kabina ir dušo galva su maišytuvu pajungiant prie V/N tinklų, išbandomas ir pritaikomas pilnam veikimui.	Vnt.	1
18.	Patalpos, kurios indeksas R-15, montuojamas naujas unitazas. Unitazas pastatomas su lėtai nusileidžiančiu dangčiu, pajungiant prie V/N tinklų, išbandomas ir pritaikomas pilnam veikimui.	Vnt.	1
19.	Patalpose, kurių indeksai R-15, 2-2, įrengiami nauji praustuvai, kurie prijungiami prie veikiančių tinklų, išbandomi ir pritaikomi pilnam veikimui. Praustuvai aukštesnės klasės, komplektuojami su maišytuvais, chromuotais sifonais, vandentiekio žarnelėmis.	Kompl.	2
20.	Patalpoje, kurios indeksas 2-12, įrengiamas naujas maišytuvas su chromuotu sifonu, vandentiekio žarnelėmis kurie prijungiami prie veikiančių tinklų, išbandomi ir pritaikomi pilnam veikimui.	Vnt.	1
21.	Patalpų, kurių indeksai R-14, R-15, 2-12, įrengiami oro ištraukimo ventiliatoriai. Ventiliatorius pajungti laiko relės. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti elektros kabelių atvedimą ir pajungimą nuo paskirstymo skydelio.	Vnt.	3
22.	Patalpų, kurių indeksai R-15, 2-12, virš praustuvo ar šalia montuojami veidrodžiai. Preliminarus matmuo 60 x 40 cm. Matmenis tikslinti su Užsakovu vietoje.	Vnt.	2
23.	Patalpose, kurių indeksai 2-2, 2-18, 2-19, esamų pakabinamų lubų plokščių keitimas naujomis. Montuojamos Armstrong tipo (arba lygiavertės) surenkamos lubos. Plokštės matmenys 60 x 60 cm, storis ≥ 15 mm, paviršius baltas, lygus. Lubų profilio spalva – balta. Pastaba: keičiant lubų plokštes, Rangovas turi įsivertinti priešgaisrinių ir apsaugos daviklių perkėlimą / permontavimą ant naujai įrengtų lubų.	m ²	~35
24.	Patalpose, kurių indeksai R-1, R-2, R-5, R-15, R-14, I-III aukštų laiptinės ir rūsyje, esami šviestuvai keičiami į LED tipo šviestuvus su judesio davikliais ir 2-4, 2-5, 2-6, 2-12 (be judesio daviklio). Spalvinė temperatūra 4 000 k, bendras šviesos srautas ne mažiau 2000 lm, galia ne mažiau 12 W ir ne daugiau 42 W. Šviestuvai montuojami ant sienų. Šviestuvų keitimo vietas derinti su Užsakovu. Šviestuvams suteikiama garantija 5	Vnt.	38

	metai. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Seni šviestuvai utilizuojami.		
25.	Patalpose, kurių indeksai R-4, R-6, R-7, R-8, R-10, R-11, R-12, R-13, R-16, 2-1, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, esami šviestuvai keičiami į LED tipo šviestuvus: Matmenys 60 x 60 cm, spalvinė temperatūra 4 000 k, bendras šviesos srautas ne mažiau 2800 lm, galia ne mažiau 25 W ir ne daugiau 42 W. Šviestuvai įleidžiami į Armstrong tipo (arba lygiavėčio) surenkamas lubas. Atskirais atvejais įrengiami pakabinami šviestuvai. Šviestuvams suteikiama garantija 5 metai. Šviestuvų keitimo vietas derinti su Užsakovu. Apšvietimas turi būti prijungtas prie pastato elektros srovės, išbandytas ir pritaikytas pilnam veikimui. Seni šviestuvai utilizuojami.	Vnt.	72
26.	Vykdamas elektros rozečių, jungiklių, šviestuvų keitimą bei naujų įrengimų elektros paskirstymo skydeliuose esanti įstaliacinę įrangą privalo būti pakeisti nauja atitinkančia elektros instaliacijai keliamus reikalavimus. Baigus elektros įrenginių montavimo darbus privaloma atstatyti pažeistą apdailą. Užsakovui pateikti principines el. Schemas, varžų matavimus	Kompl.	1
27.	Patalpose, kurių indeksai R-4, R-6, R-7, R-8, R-10, R-11, R-12, 2-1, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, kuriose 4 ir daugiau šviestuvų, privaloma įrengti dvipolį jungiklį. Visi jungikliai privalo būti prijungti prie pastato elektros tinklų ir pilnai funkcionuoti.	Vnt.	22
28.	Patalpose, kurių indeksai R-10, R-11, 2-3 lubų dažymas. Prieš dažymo darbus, lubos remontuojamos, pašalinami įdaužimai, gruntuojama, glaistoma, pagal poreikį tinkuojami ir dažomi du kartus matiniais emulsiniais, ne žemesnės nei pirmos atsparumo klasės dažais (1 klasė EN 13 300). Spalvą derinti vietoje.	m ²	~37
29.	Patalpose, kurių indeksai R-6, R-7, R-10, R-11, 2-1, 2-2, 2-3, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, laiptinės (3 aukštai), laiptų maršai iš apačios, sienų ir angokraščių dažymas. Prieš dažymo darbus, nuimami signalizacijos davikliai, kiti ant sienų esantys įrengimai ir po dažymo darbų, atstatomi. Sienos ir angokraščiai remontuojami, pašalinami įdaužimai, gruntuojami, glaistomi, pagal poreikį tinkuojami ir dažomi du kartus matiniais emulsiniais, ne žemesnės nei pirmos atsparumo klasės dažais (1 klasė EN 13 300). Spalvą derinti vietoje. Kiekiai yra preliminarūs, būtina tikslinti vietoje.	m ²	~1190
30.	Patalpose, kurių indeksai R-6, R-7, R-10, R-11, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, grindų dangos keitimas. Sena danga nuardoma ir utilizuojama. Betono pagrindo paruošimas PVC grindų dangos įrengimui: remontas, betonavimas, šlifavimas, išlyginimas savaime išlyginamuoju mišiniu ir / ar kiti reikalingi darbai. Homogeninės PVC grindų dangos įrengimas sulydant sujungimus. Atsparumo klasė trinčiai 34, slidumo klasė R9, storis ≥2,0 mm., degumo klasė ne žemesnė kaip B fl-sl, spalva ir raštas derinami su Užsakovu vietoje. Grindjuostė įrengiama iš tos pačios dangos, lenkiant ant sienos, aukštis - 100 mm. Tarpduriuose ties skirtingomis grindų dangomis įrengiami minimalūs slenksteliai. Prieš užsakant dangą ir spalvą būtina susiderinti su Užsakovu.	m ²	~270
31	Patalpose, kurių indeksai R-6, R-7, 2-2, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, sienų apsaugų įrengimas iš homogeninės	m ²	~50

	PVC dangos tvirtinant prie sienos. Tiksliai montavimo vietas spalvą, tekstūrą derinti su užsakovu. Matmenis tikslinti vietoje.		
32.	<p>Patalpose, kurių indeksai R-10, R-11, ant PVC grindų dangos, įrengiama guminė grindų danga (Puzzle), skirta sporto salėms. Dangos storis ≥ 20 mm. Prieš užsakant dangą ir spalvą būtina susiderinti su Užsakovu.</p> 	m ²	~28
33.	<p>Patalpose, esanti rekuperacinė sistema patikrinama, subalansuojama ir paleidžiama pilnam veikimui.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pamatuoti faktinius oro kiekius kiekviename oro skirstytuve (difuzoriuje) ir grotelėse, ataskaitoje pažymint vėdinimo sistemą, naudojant sertifikuotus oro kiekio matavimo įrankius. 2. Oro reguliavimo vožtuvus ir sklendes sureguliuoti taip, kad patalpai tenkančio oro kiekis tarp tiekiamo ir ištraukiamo oro nebūtų didesnis nei 10% ribose. 3. Pakeisti oro filtrus (pagal poreikį) ir patikrinti vėdinimo įrenginio sandarumą. 4. Nustatyti temperatūrinius ir darbo laiko režimus: darbo dienos, nakties, savaitgalio. 5. Vėdinimo įrenginio valdiklyje patikrinti esamus nustatymus, surašyti parametų protokolus ir atlikti korekcijas pagal užsakovo poreikį. 6. Paruošti oro kiekių ir parametų derinimo protokolus, kuriuose turi būti oro kiekių (srautų) matavimų lentelė su faktiniais skaičiais po atliktų korekcijų. 7. Atlikti kitus vėdinimo įrenginių aptarnavimo ir priežiūros darbus: <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Mechaninių, atbulinių ir priešgaisrinių oro sklendžių patikra, lauko ir vidaus grotelių apžiūra – valymas. 7.2. Šildymo/šaldymo šilumokaičių (kaloriferių) patikra ir esant reikalui valymas. 7.3. Šildymo šilumokaičių mazgo patikra (siurbliai, pavaros) ir grubaus valymo filtrų praplovimas. 	Kompl.	~1

7.4. Patikrinti kondensato nubėgimo sistemą, jos sandarumą ir pajungimą.





34.

Patalpose, kurių indeksai R-6, R-7, 2-2, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, darbo vietai skirtų elektros ir elektroninių ryšių instaliacijos pertvarkymo darbai. Vienai darbo vietai įrengti po 8 elektros ir 4 kompiuterinio tinklo rozetes 30 cm aukštyje nuo grindų, išskyrus atvejus, kai užsakovo pageidavimu reikia kito montavimo aukščio. Elektros ir kompiuterinio tinklo laidai neturi būti vedami kartu be fizinio atskyrimo. Laidai montuojami į sieninius laidų lovelius arba esant galimybei, tarpuose tarp gipso plokštės ir sienos. Elektros kabelis (varinis) turi būti ne plonesnis, kaip $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ - galioja iki 16A grandinėms. Patalpoje 2-2, elektrinio virdulio ir mikrobangų krosnelės rozetes turi būti atskiros 16A grandinės. Kompiuterinis kabelis ne prastesnis, kaip CAT6, S/FTP (Shielded Foiled Twisted Pair) – su apsauga nuo trukdžių. Turi būti laikomasi maksimalių kabelių ilgio standartų (pvz., neviršijant 100 metrų atstumo – skaičiuojant nuo paskirstymo dėžės iki galutinės rozetės) Visi kabeliai privalo būti prijungti prie pastato tinklų ir pilnai funkcionuoti, suvedami į vieną paskirstymo skydą, jeigu reikia perrenkamas elektros paskirstymo skydas, įrengiant naujus automatinius jungiklius, bei viršitampius ribotuvus. Būtina, kad naujai suformuotoms kompiuterinėms darbo vietoms (KDV), būtų atnaujinama patalpų elektros schema ir pakartotinai atliekami visų elektros įrenginių varžų matavimai. Kompiuterinių tinklų privedimo taškus darbuotojų KDV ir kompiuterinių rozečių išdėstymą derinti su Užsakovu. Baigus elektros įrenginių montavimo darbus privaloma atstatyti pažeistą apdailą. Visos rozetės turi būti sumarkiruotos.

Kompl.

27

35.	Patalpoje, kurios indeksas R-13 skalbimo mašinos ir rūbų džiovyklės pajungimas. Turi būti atskiros 16A grandinės skalbimo mašinos ir atskira džiovyklei. Vandens nuleidimas pajungiamas į artimiausiai esančius V/N tinklus (patalpa R-14), įrengiamos 8 elektros rozetės. Rozečių išdėstymą derinti su Užsakovu. Laidai montuojami į štrobuotus griovelius sienose laidų lovelius. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis, kaip 3 x 2,5 mm ² . Baigus elektros įrenginių montavimo darbus privaloma atstatyti pažeistą apdailą. Visos rozetės turi būti sumarkiruotos.	Kompl.	1
36.	Patalpose, kurių indeksai R-10, R-11, 2-2, įrengiamos po 8 elektros rozetės. Rozečių išdėstymą derinti su Užsakovu. Laidai montuojami į štrobuotus griovelius sienose, laidų lovelius. Elektros kabelis turi būti ne plonesnis, kaip 3 x 2,5 mm ² . Baigus elektros įrenginių montavimo darbus privaloma atstatyti pažeistą apdailą. Visos rozetės turi būti sumarkiruotos.	Vnt.	24
37.	Patalpoje, kurios indeksas R-4, įrengiamos naujos priešgaisrinės plieninės durys. Spalvą derinti su Užsakovu. Komplektuoti su užraktu ir atmušėju. Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius durų matavimus vietoje. Sumontavus duris, turi būti atstatyta ir / ar atlikta angokraščių pilna apdaila. Neturi matytis sumontavimo medžiagų (t. y. išsiplėtimo putų, tvirtinimo elementų ir pan.).	Vnt.	1
38.	Patalpoje, kurios indeksas R-4, iš vidaus įrengiamos metalinės grotos, skirtos angai 1100 x 700 mm, pagamintos iš plieninių strypų arba profilių. Suvirintos grotų paviršius gruntuojamas ir dažomos antikoroziniais dažais. Grotos tvirtinamos prie angokraščio iš vidinės pusės. Medžiagas, montavimo vietas derinti su Užsakovu.	Vnt.	4
39.	<p>Prie pagrindinio įėjimo durų (matmenys 2600 x 2200 mm), ir šviesduobėje (matmenys 1100 x 1400 mm) iš lauko pusės, montuojamos apsauginės ritinines aliuminio profilio žaliuzės valdomos elektrine pavara, jungikliu ir pulteliu. Montuojamos su viršutiniu dėžės gaubtu ir užrakinimo mechanizmu. Spalvą, medžiagas, montavimo vietas derinti su Užsakovu. Kiekiausiai yra preliminarus, būtina tikslinti vietoje. Ant įėjimo durų esantys užrašai, nuvalomi. Stiklinis stogelis esantis virš durų, nuplaunamas.</p> 	Vnt.	2

40.	Patalpose kurių indeksai 2-6, 2-8, 2-9, 2-10, 2-17, laiptinės įėjimo durų, (2 vnt.) visų rūšio langų, klijuojama matinė plėvelė prieš tai suderinus raštą su užsakovu. Kiekiai yra preliminarūs, būtina tikslinti vietoje.	m ²	~70	
41.	Patalpose, kurių indeksai R-4, R-6, R-7, R-8, R-10, R-11, R-12, R-13, R-16, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, mechaninių termostatinų vožtuvų ir galvų montavimas ant esamų radiatorių. Termostatinės galvos montuojamos su skale (6-28 °C), spalva balta. Sumontuota šildymo sistema turi atitikti LR Statybos techninius reglamentus ir įrengimo taisykles.	Vnt.	24	
42.	Patalpose, kurių indeksai R-1, R-2, R-4, R-5, R-8, R-12, R-13, R-16, 2-1, 2-5, 2-6, 2-12, 2-13, grindų, laiptų dangos atnaujinimas. Dangos chemiškai valomos ir vaškujamos. Kiekiai yra preliminarūs, būtina tikslinti vietoje.	m ²	~350	
43.	Patalpose, kurių indeksai 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, plisuotų kabinetinių žaliuzių įrengimas. Žaliuzės turi užtikrinti reikiamą šviesos reguliavimą, privatumą bei estetinę išvaizdą. Mechanizmas turi būti virvinis, grandinėliš tipo arba rankenėlės, su galimybe valdyti iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Tvirtinama prie lango rėmo, sienos ar lubų (tikslinti vietoje). Visos detalės turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Raštą ir spalvą derinti su užsakovu vietoje.		Vnt.	26
44.	Patalpose, kurių indeksai R-4, R-6, R-7, R-8, R-10, R-11, R-12, R-13, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, smulkus langų remontas: tarpinių keitimas, langų reguliavimas, sulūžusių rankenų keitimas, mechanizmų sutepimas.	Vnt.	44	
45.	Patalpose, kurių indeksai R-6, R-7, R-8, R-10, R-12, R-13, R-16, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, esamų durų smulkus remontas: durų reguliavimas, spynų cilindrus, keitimas. Patalpoje, kurios indeksas 2-1. Durų rankenos keitimas.	Vnt.	17	
46.	Apsauginės signalizacijos pertvarkymo darbai. Esama apsauginė signalizacija pritaikoma prie naujai perplanuotų patalpų. Montuojamos dvi atskiros klaviatūros (prie pagrindinių durų ir įėjimo į rūsi). Suprogramuojamos dvi atskiros zonos. Užtikrinti, kad kiekviena zona galėtų būti įjungiamas/išjungiamas nepriklausomai. Zonos turi būti nepriklausomos valdymo ir signalizavimo atžvilgiu. Dalies esamų daviklių perkėlimas ir naujų papildomų įrengimas. Signalizacija turi atitikti saugos reikalavimus ir įrengimo taisykles. Atlikus darbus	Kompl.	1	

	privaloma išbandyti, testuoti ir pritaikyti pilnam funkcionalumui, pateikti išpildomąją dokumentaciją. Kiekiai preliminarūs, būtina tikslinti vietoje.		
47.	Perplanavus patalpas, dalies esamų priešgaisrinių daviklių perkėlimas ir naujų papildomų įrengimas (jungiant prie esamos sistemos, plečiant daviklių kiekį zonoje/zonose). Priešgaisriniai montuojami visose remontuojamose patalpose. Baigus darbus priešgaisrinė signalizacijos turi pilnai funkcionuoti, prijungta prie sukonfigūruota ir išbandyta.	Kompl.	1
48.	Patalpoje kurios indeksas R-16 įrengiama komutacinė spinta su reikiamu kiekiu <i>patch</i> (kabelių tvarkymo) panelių. Numatytus darbus apima tinklo kabelių komutavimas, testavimas bei sužymėjimas. Atvedamas elektros maitinimas ne prastesnis, kaip 3x2,5 mm ² , nuo artimiausio paskirstymo skydelio, kuriame sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis. Šviesolaidinio interneto kabelio atvedimas nuo serverinės (patalpa 1-2) iki komutacinės spintos. Atnaujinama el. skydelio principinė schema.	Vnt.	1
49.	Statybinių atliekų ir kitų atliekų išnešimas, išvežimas ir utilizavimas.	Kompl.	1
50.	Patalpose, esančios revizinės durelės, keičiamos į naujas.	Vnt.	22
51.	Patalpoje, kurios indeksas 2-13 keičiamas durų apvadas	Kompl.	1
52.	Remontuojamose patalpose įrengiamas evakuacinis apšvietimas ir ženklavimo sistema atitinkanti STR 2.01.04:2014, LST EN 1838 ir LST EN 50172 reikalavimus. Evakuaciniai šviestuvai turi būti LED tipo, su autonominiu maitinimu (≥ 1 h) arba prijungti prie centrinės avarinės sistemos. Šviestuvai ir ženklai montuojami pagal gaisrinės saugos projektą, užtikrinant ≥ 1 lx evakuacijos keliuose. Visi išėjimai turi būti pažymėti piktograminiais šviestuvais, matomais iš ≥ 20 m atstumo. Visi šviestuvai privalo turėti CE ženklą ir atitikties deklaraciją pagal galiojančius ES standartus.	Kompl.	1
53.	Patalpose, kurių indeksai R-6, R- 7, R-10, R-16, 2-2, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-14, 2-15, 2-17, 2-18, 2-19, kondicionavimo sistemos įrengimas. Įrengti <i>Multi Split Inverter</i> oro kondicionavimo sistemą pajungiant komunikacijas, sumontuojant kondensato nuvedimo siurbliukus, pajungiant kondensato drenažą. Prie keturių išorinių blokų (išorinių blokų kiekį tikslinti pagal technines galimybes), montuojama 16 vidinių sieninių ir vienas lubinis blokas. Naujai įrengiamai kondicionavimo sistemai pajungti atvedama nauja elektros instaliacija, prijungiant prie pastato elektros tinklo. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuota projektinės dokumentacijos parengimas, suderinimas su Užsakovu bei leidimų, jei tokie reikalingi, iš atitinkamų institucijų gavimas įrenginių montavimui. Esami seni kondicionieriai demontuojami ir utilizuojami.	Kompl.	5

2.2. Kondicionierių reikalaujami techniniai parametrai:

Tipinė kondicionierių TS parametrų lentelė. 2 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametrai
1.	Tipas	Sieniniai oro kondicionieriai (su distanciniu valdymu)

2.	Technologija	Multi Split Inverter (16 vidiniai blokai jungiami prie 5 išorinių blokų) – 5 komplektai.
3.	Kondicionuojamų patalpų plotai	Patalpa Nr. R-6, plotas 13.89 m ² Patalpa Nr. R-7, plotas 13,48 m ² Patalpa Nr. R-10, plotas 27.28 m ² Patalpa Nr. R-16, plotas 7.81 m ² Patalpa Nr. 2-2, plotas 12.15 m ² Patalpa Nr. 2-7, plotas 14.77 m ² Patalpa Nr. 2-8, plotas 14.08 m ² Patalpa Nr. 2-9, plotas 14.93 m ² Patalpa Nr. 2-10, plotas 14.16 m ² Patalpa Nr. 2-11, plotas 10.59 m ² Patalpa Nr. 2-13, plotas 83.40 m ² Patalpa Nr. 2-14, plotas 14.39 m ² Patalpa Nr. 2-15, plotas 15.34 m ² Patalpa Nr. 2-17, plotas 28.56 m ² Patalpa Nr. 2-18, plotas 12.09 m ² Patalpa Nr. 2-19, plotas 10.17 m ²
4.	Kondicionuojamų patalpų aukštis	~ 3,0 m
5.	Komunikacija ir valdymas	Multi Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
6.	Bendri reikalavimai išoriniams blokams	
6.1	Vėsinimo galia, kW	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus; <u>Multi Split sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai</u>
6.2	Šildymo galia, kW	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus
6.3.	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA	Ne daugiau kaip 65 dB
6.4	Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max:	Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C
6.5	Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros:	Ne prasčiau kaip iki -15 °C
6.6	Šaltnešio (freono) tipas	R32 arba lygiavertis
6.7	Energijos klasė: šild.ir/arba šald. Split sistemai	Ne mažiau, kaip A+ klasė
7.	Bendri reikalavimai vidiniams blokams	
7.1	Vėsinimo galia, kW	Patalpa Nr. R-6, plotas 13.89 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. R-7, plotas 13.48 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. R-10, plotas 27.28 m ² (2,3 – 3,2 kW) Patalpa Nr. R-16, plotas 7.81 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-2, plotas 12.15 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-7, plotas 14.77 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-8, plotas 14.08 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-9, plotas 14.93 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-10, plotas 14.16 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-11, plotas 10.59 m ² (1,8 – 2,7 kW)

		Patalpa Nr. 2-13, plotas 83.40 m ² (7,9 – 9,2 kW) Patalpa Nr. 2-14, plotas 14.39 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-15, plotas 15.34 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-17, plotas 28.56 m ² (2,3 – 3,2 kW) Patalpa Nr. 2-18, plotas 12.09 m ² (1,8 – 2,7 kW) Patalpa Nr. 2-19, plotas 10.17 m ² (1,8 – 2,7 kW)
7.2	Šildymo galia, kW	Patalpa Nr. R-6, plotas 13.89 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. R-7, plotas 13.48 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. R-10, plotas 27.28 m ² (ne mažiau 2,3 kW) Patalpa Nr. R-16, plotas 7.81 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-2, plotas 12.15 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-7, plotas 14.77 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-8, plotas 14.08 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-9, plotas 14.93 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-10, plotas 14.16 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-11, plotas 10.59 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-13, plotas 83.40 m ² (ne mažiau 7,9 kW) Patalpa Nr. 2-14, plotas 14.39 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-15, plotas 15.34 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-17, plotas 28.56 m ² (ne mažiau 2,3 kW) Patalpa Nr. 2-18, plotas 12.09 m ² (ne mažiau 1,8 kW) Patalpa Nr. 2-19, plotas 10.17 m ² (ne mažiau 1,8 kW)
7.3	Darbo režimas	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)
7.4	Garantija įrangai (kompl.)	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija

PRIDEDAMA:

- 1) TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.
- 2) TS priedas Nr. 2. Remontuojamų patalpų planai, 2 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA: _____ Eurai

TVIRTINU: _____ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO _____

ATSAKINGAS

ATSTOVAS _____

20__ M. _____ MĖN. _____ D.

20__ M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 20__ - __ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui

Eur

Lapas 1

Sąmatos eilutė	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1


Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %


Iš viso žiniaraštyje

Sudarė: _____
(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Remontuojamos patalpos

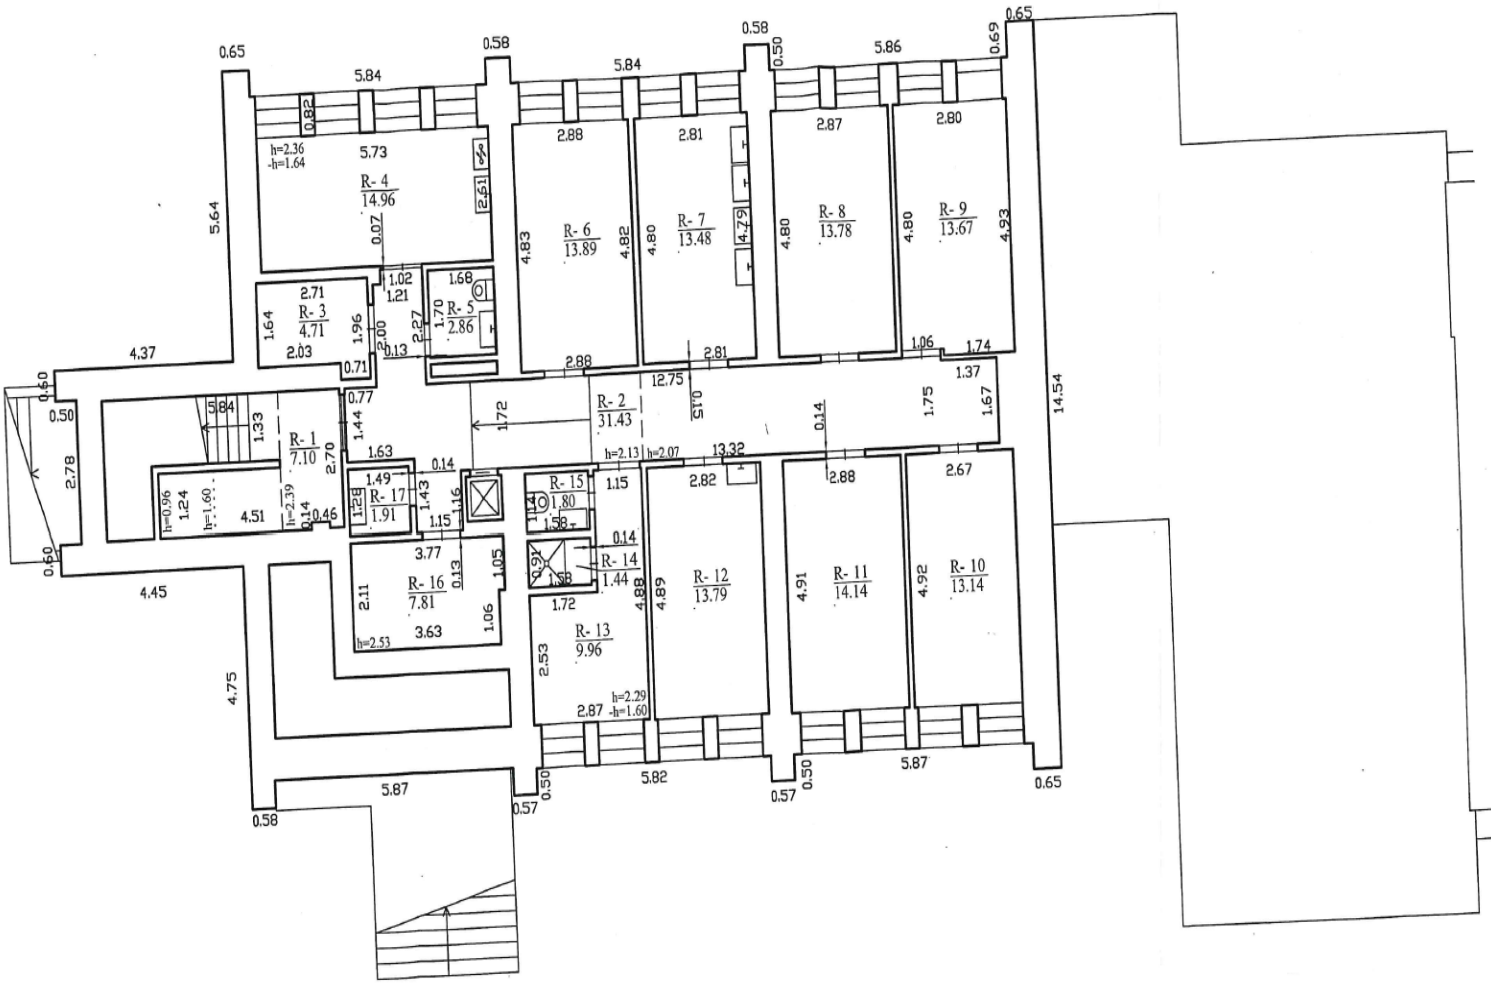

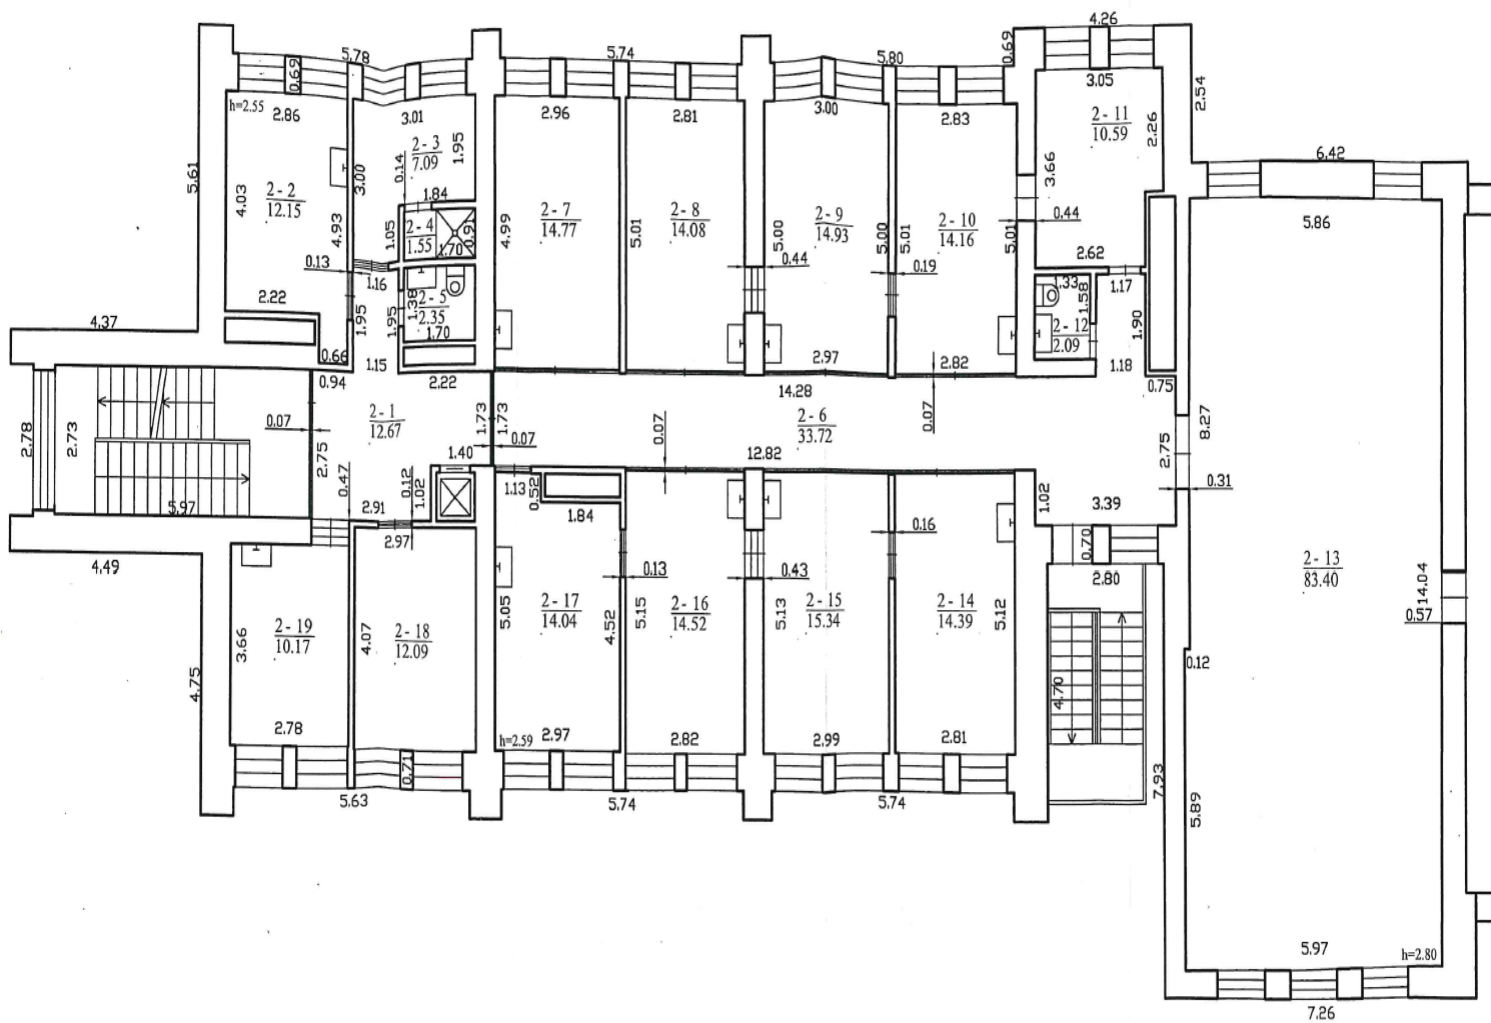

UAB „STATYRA“

Uždaroji akcinė bendrovė. Ruokio g. 21, Dotnuva, Kėdainių r.,
tel.: +
UAB „Statyra“, įm. kodas 304841021, PVM kodas LT100011664613

Valstybės įmonei Turto bankui

PASIŪLYMAS

**DĖL VP-3262 ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, ESANČIO VETERINARIJOS G. 2,
PAŽAGIENIŲ K., PANEVĖŽIO R., PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2025-10-08

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ*

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „STATYRA“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai)	Ruokio g. 21, Dotnuva, Kėdainių r.
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (<i>tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.</i>)	304841021
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT100011664613
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)	LT565015900014001083 Kėdainių krašto kredito unija, 50159
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas	
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	

**prašoma užpildyti visus laukus*

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS IR (AR) KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais	Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas	Pateikiamų įrodymų pavadinimas ¹

¹ Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, išteklių jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolai ir kt.).

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekejo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime, EBVPD ir įrodymai, kad vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

Informacija apie **subtiekejus**², kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas ³	Subtiekejui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekejo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.

Informacija apie **specialistus**⁴, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti įdarbintu laimėjimo atveju. Tiekėjas, pateikdamas savo užpildytą ir pasirašytą EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.

3. INFORMACIJOS ANKSČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra nepasikeitusi.

Anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujintą EBVPD teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu.

4. PASIŪLYMO KAINA

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šiuos darbus (kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (bendra statybos darbų kaina, Eur be PVM)
1.	Administracinės paskirties pastato, esančio Veterinarijos g. 2, Pažagienuų k., Panevėžio rajono sav., paprastojo remonto darbai (pagal techninę specifikaciją)	116569,00
PVM suma, EUR*:		24479,49
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:		141048,49

² Nurodomas konkretus subtiekejo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

³ Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

⁴ Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekejo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekejo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekejo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Į aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą Pasiūlymo formos 1 priedą „Lokalinė sąmata“ (toliau „Sąmata“). Lokalinėje sąmatoje privalo būti nurodyti „SISTELA“ arba „ASTERA“ arba lygiavertės statybos darbų kainų sąmatinių apskaičiavimų sistemos darbų kodai kiekvieno atskiro darbo kainai (detalizuota).

Pasiūlymo kaina turi sutapti su Pasiūlymo formos 1 priede nurodyta kaina. Tiekėjo pateikta darbų sąmata nėra laikoma galutine ir sudarius sutartį (nekeičiant Pasiūlyme nurodytos kainos) tikslinama ir derinama su Užsakovu Statybos rangos sutartyje nustatyta tvarka.

5. KITA INFORMACIJA

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nemurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- 1) sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.
- 2) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- 3) sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).
- 4) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- 6) pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame **sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą** bei į _____ ti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda

pareigų pavadinimas)

išas)

(Vardas ir pavardė)



Lokalinė sąmata Nr. S041

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis

Objektas: Patalpų, esančių Veterinarijos g. 2,
Pažagių k., Panevėžio r. sav., paprastojo
remonto darbai

Žiniaraštis: Paprastojo remonto darbai

Iš viso: **141048,49 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1	9,494	9,49
2	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2	8,956	17,91
3	N16P-1013	Uždarytų dušų kabinų su dugnais demontavimas	vnt	1	56,949	56,95
4	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1	10,465	10,47
5	R19-13	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt	36	6,852	246,67
6	CALC1-1	Elektros rozečių ir kitų patalpose esančių įrenginių demontavimas, sutvarkomi V/N ir elektros įvadai	kompl.	1	285,721	285,72
7	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	3,38	105,751	357,44
8	R7-3	Durų demontavimas	vnt	2	60,824	121,65
9	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,02	6514,494	130,29
10	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,04	304,524	12,18
11	R7-3	Durų demontavimas	vnt	1	60,824	60,82
12	CALC1-1	Vidinių durų blokų montavimas*demontuotos durys	vnt	1	71,830	71,83
13	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	1,2	71,816	86,18
14	R63P-3104	Radiatorių demontavimas	vnt.	9	16,357	147,21
15	R7-52	Palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	12	5,617	67,40
16	R13-5	Sienų ir grindų plytelių išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	370	6,448	2385,76
17	N46-151	Lubų išardymas	100 m2	1,04	1244,056	1293,82
18	CALC1-1	Palangių montavimas	vnt	12	34,846	418,15
19	F15-1-10	Amstrong' akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	165	27,515	4539,98
20	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	0,63	105,751	66,62
21	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,09	6514,494	586,30
22	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,18	304,524	54,81
23	N2P-0303	Vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas	m2	1,8	285,179	513,32
24	CALC1-1	Vandens įvadinio skaitliuko permontavimas iš patalpos R-8 į patalpą R-9. Projektinės dokumentacijos parengimas	vnt	1	136,817	136,82

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
25	F15-1-9	Esamų vamzdinių uždengimas įrengiant lengvų konstrukcijų karkasą su gipso kartono plokštėmis, siūlių glaistymas	100 m2	0,09	4550,364	409,53
26	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonic" arba aptaisyty gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,09	446,709	40,20
27	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonic" arba aptaisyty gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,09	339,234	30,53
28	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,09	254,242	22,88
29	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,09	1112,090	100,09
30	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,04	693,756	27,75
31	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	4	7,393	29,57
32	N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	4	60,642	242,57
33	N15-33-6	Sienų aptaisymas plytelėmis	m2	20	72,268	1445,36
34	N16P-1013	Dušu kabinų montavimas	vnt	1	566,613	566,61
35	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	70,525	70,53
36	N17-20-1	Stovo dušui tvirtinimas prie sienos	vnt	1	19,788	19,79
37	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir lėtai nusileidžiančiu dangčiu montavimas	vnt	1	249,291	249,29
38	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3	204,667	614,00
39	N46-88	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D iki 50 mm ir gylis 200 mm	100 vnt	0,03	5467,309	164,02
40	CALC1-1	Oro ištraukimo ventiliatoriai su laiko rele. Elektros kabelių atvedimas ir pajungimas nuo paskirstymo skydelio.	vnt	3	60,308	180,92
41	N15P-0315	Sienų vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais	m2	0,48	79,464	38,14
42	F15-1-10	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm keitimas naujomis Armstrong tipo	m2	35	20,885	730,98
43	R61P-2713	Šviestuvų keitimas į LED tipo su judesio davikliais	vnt	1	17,781	17,78
44	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	1,1	634,549	698,00
45	N21-235	Šviestuvų LED tipo su judesio davikliais montavimas	100 vnt	0,38	6228,202	2366,72
46	N21-241	LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,72	7445,952	5361,09
47	CALC1-1	Paskirstymo skydeliuose instaliacinės įrangos keitimas nauja	kompl.	1	327,046	327,05
48	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms mūro sienose žiediniais grąžtais	100vnt	0,22	113,320	24,93
49	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	0,22	196,405	43,21

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
50	N21P-0321	Jungiklių dviejų klavišų montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	0,22	982,192	216,08
51	R11-94	Lubų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas	m2	37	35,290	1305,73
52	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,37	607,920	224,93
53	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,37	446,709	165,28
54	N15P-0207	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,37	290,584	107,52
55	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,37	1385,887	512,78
56	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	50	51,816	2590,80
57	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas	m2	100	25,986	2598,60
58	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	11,9	446,709	5315,84
59	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	11,9	339,234	4036,88
60	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	11,9	254,242	3025,48
61	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	11,9	1500,292	17853,47
62	N46-168	Esamų grindų dangos išardymas	100 m2	2,7	671,040	1811,81
63	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	2,7	693,756	1873,14
64	N11-145-2	PVC danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100 m2	2,7	2762,642	7459,13
65	N15-227	Sienų apklijavimas PVC danga	m2	50	30,609	1530,45
66	N11-176	Guminė grindų danga (Puzzle)	m2	28	60,870	1704,36
67	CALC1-1	Esamos rekuperacinės sistemos patikrinimas, subalansuojama ir paleidžiama pilnam veikimui	kompl.	1	901,778	901,78
68	CALC1-1	Darbo vietai skirtų elektros ir elektroninių ryšių instaliacijos pertvarkymo darbai (vienai darbo vietai 8 elektros ir 4 kompiuterinio tinklo rozetes)	kompl.	27	268,485	7249,10
69	CALC1-1	Skalbimo mašinos ir rūbų džiovyklės pajungimas. Vandens nuleidimas pajungiamas į artimiausiai esančius V/N tinklus, įrengiamos 8 elektros rozetės	kompl.	1	320,118	320,12
70	CALC1-1	Rozečių įrengimas. Laidai montuojami į štrobuotus griovelius sienose, laidų lovelius.	vnt	24	25,325	607,80
71	N2P-0301	Plieninių priešgaisrinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2	m2	2	452,244	904,49
72	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	1,5	71,816	107,72
73	N9-214	Metalinųjų grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	3,08	50,703	156,17

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
74	N15-171	Metaliųjų grotelinių paviršių (langų grotelių ir kt. sanitarinių prietaisų) aliejinis dažymas du kartus	100 m2	0,0308	1533,758	47,24
75	CALC1-1	Jėjimo durų (matmenys 2600 x 2200 mm), ir šviesduobėje (matmenys 1100 x 1400 mm) iš lauko pusės, montuojamos apsauginės ritinines aliuminio profilio žaliuzės valdomos elektrine pavara, jungikliu ir pulteliu. Ant jėjimo durų esantys užrašai, nuvalomi. Stiklinis stogelis esantis virš durų, nuplaunamas.	vnt	2	685,897	1371,79
76	N13-139	Paviršių apklėjavimas matine plėvele	m2	70	15,075	1055,25
77	R63P-2602	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas	vnt.	24	34,586	830,06
78	N13-149	Paviršių cheminis valymas	m2	350	5,821	2037,35
79	N11-145-7	Dangų vaškavimas	100 m2	3,5	160,726	562,54
80	N2P-0114	Pliusuotų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiau 2,0 m2	vnt	26	205,556	5344,46
81	CALC1-1	Smulkus langų remontas: tarpinių keitimas, langų reguliavimas, sulūžusių rankenų keitimas, mechanizmų sutepimas.	vnt	44	36,856	1621,66
82	KP5.6-9	Smulkus durų remontas	vnt	17	40,674	691,46
83	CALC1-1	Apsauginės signalizacijos pertvarkymo darbai.	kompl.	1	873,317	873,32
84	CALC1-1	Esamų priešgaisrinių daviklių perkėlimas ir naujų papildomų įrengimas (jungiant prie esamos sistemos, plečiant daviklių kiekį zonoje/zonose)	vnt	1	742,785	742,79
85	CALC1-1	Įrengiama komutacinė spinta su reikiamu kiekiu patch (kabelių tvarkymo) panelių	vnt	1	862,220	862,22
86	N20-662	Revizinių durelių keitimas	vnt	22	59,031	1298,68
87	CALC1-1	Durų apvado keitimas	vnt	1	53,078	53,08
88	CALC1-1	Evakuacinio apšvietimo įrengimo darbai	kompl.	1	466,517	466,52
89	CALC1-1	Kondicionavimo sistemos įrengimas	kompl.	5	1635,853	8179,27
90	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	10	28,039	280,39
91	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	10	16,292	162,92
92	R23-72	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	10	48,875	488,75
93	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10	52,046	520,46
94	CALC1-1	Statybinių šiukšlių sąvartyno mokestis	t	10	100,000	1000,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						116569,00
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						116569,00
PVM						24479,49
Bendra vertė su PVM						141048,49

Sudarė:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Turto bankas, VĮ
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Statyra“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VP-3262 Paprastojo remonto darbai adresu Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio r.
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-22 Nr. 2025-S1-874
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-16 09:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-17 10:49 - 2027-07-17 10:49
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-21 16:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-18 18:00 - 2027-02-17 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-22 08:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-22 08:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-19 08:56 - 2029-03-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas Techninė specifikacija.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas Pasiūlymas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2.1 Lokalinė sąmata - Veterinarijos g. 2 Pažagieniai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251015.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-23)

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-23 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
